



REPUBLIKA E SHQIPËRISE
MINISTRIA E ZHVILLIMIT
EKONOMIK, TREGTISË
DHE SIPËRMARRJES

Monitorimi i Investimeve Publike për vitin 2014


Tabela Përmbledhëse Plan - Fakt : Janar - Dhjetor 2014

Ministritë / Institucionet	Financim i Brendshëm				Financim i Huaj			
	Buxheti i Rishikuar 2014	Buxheti / Min	Realizimi në vlerë	Realizimi në % [3/2]	Buxheti i Rishikuar 2014	Buxheti / Min	Realizimi në vlerë	Realizimi në % [3/2]
	1	2	3	4	1	2	3	4
MZHETS	34.868	169	150	89%	29.911	517	417	81%
MBZHRAU	34.868	807	725	90%	29.911	1.555	1.555	100%
MTI*	34.868	26.544	25.125	95%	29.911	16.168	12.835	79%
MF	34.868	694	523	75%	29.911	205	198	96%
MAS*	34.868	4.514	3.819	85%	29.911	125	113	90%
MK	34.868	372	361	97%	29.911	-	-	0%
MSH	34.868	1.920	1.834	96%	29.911	376	370	98%
MD	34.868	960	805	84%	29.911	1.017	1.423	140%
MPJ	34.868	68	66	97%	29.911	-	-	-
MPB	34.868	1.205	1.197	99%	29.910	193	183	96%
M.MBROJTJE	34.868	3.167	3.140	99%	29.910	-	-	-
MMSR	34.868	235	227	97%	29.910	156	154	99%
M.MJEDISIT	34.868	682	629	92%	29.910	321	263	81%
MIE	34.868	25	25	100%	29.910	220	198	90%
MEI	34.868	283	280	99%	29.910	191	174	91%
MZHUT	34.868	821	635	77%	29.910	720	894	124%
Inst.Buxhetore	34.868	3.052	2.427	80%	29.910	8.147	8.086	99%
Total		45.518	41.968	92%**		29.911	26.863	90%

*Për shkak të pagesave që janë bërë në lidhje me borxhin është rritur si plani ashtu dhe fakti për MTI dhe MAS. Ky fakt ndikon në rritjen e total buxhetit për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm. Buxheti fillestar I MTI ka qenë 13,333 milion lekë ndërsa i MAS 3,030 milion lekë dhe për shkak të pagesave që janë bërë për borxhin tavani i këtyre ministrie është rritur respektivisht po aq sa janë rritur pagesat. Ky tavan do të ndryshojë sa herë do të kryhen pagesa në kuadër të borxhit.

** Përqindja e realizimit të Investimeve publike me financim të brendshëm është 95.6 %, por plani i shtuar i detyrimeve të prapambetura për MTI dhe MAS e ul artificialisht realizimin në %.

Realizim Faktik Janar-Dhjetor 2014 (Financim i Brendshëm dhe i Huaj)

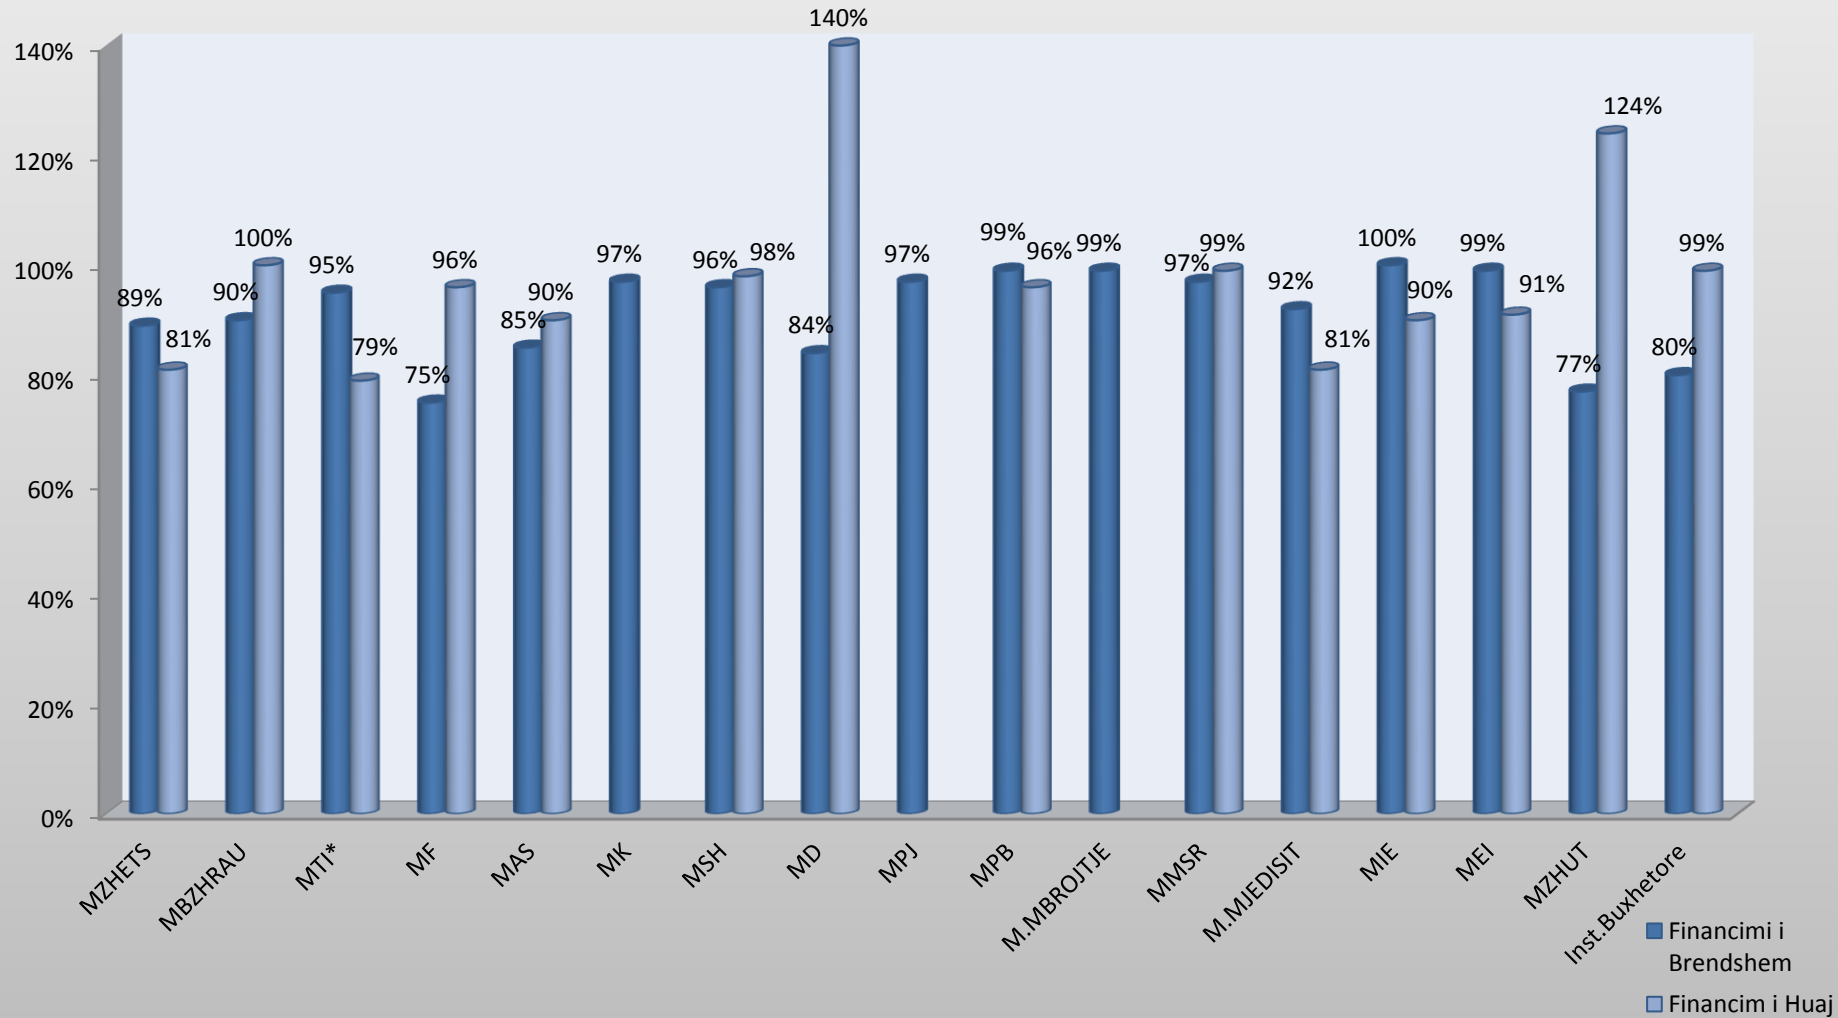

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES


Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Brendshëm për Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe realizimin faktik të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK TREGTISE DHE SIPERMARRJES						
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Projekt zbatimi dhe preventivi i projekt zbatimit të punimeve në objektin rikonstruksion i godinës së MZHETS	680	680	100%	Realizuar	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Rikonstruksioni i ambienteve të MZHETS	6.320	6.320	100%	Realizuar	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Implementimi I Platformës Government Gateëay (GG)	2.000	2.000	100%	Realizuar	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Blerje paisje zyre	10.970	10.076	92%	Realizuar (diferencat nga prokurimet)	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Blerje paisje kompjuterike	11.030	10.907	99%	Realizuar (diferencat nga prokurimet)	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Kosto Lokale për projektin BERIS	1.875	1.875	100%	Realizuar	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Funizim, vendosje ashensori	3.000	2.976	99%	Realizuar (diferencat nga prokurimet)	
Mbështetje për zhvillim ekonomik	Fondi i Konkureshmërisë	24.080	22.687	94%	Subjektet që përfituan nga ky fond duke marrë miratimin e Komisionit të aprovimit të Grantit nuk mundën të mbyllnin në kohe, sipas procedurës projektin e propozuar.	
Mbështetje për zhvillim ekonomik	Fondi i Inovacionit	8.755	8.755	100%	Realizuar	

Mbështetje për zhvillim ekonomik	TVSH për Projektin Start Ë	770	314	41%	Planifikimi është bërë duke llogaritur zërat e buxhetit për të cilët kërkohet TVSH por në disa raste faturat tatimore kanë qenë të thjeshta dhe jo me TVSH.
Mbështetje për zhvillim ekonomik	Blerje Paisje Kompjuterike	322	322	100%	Realizuar
Mbështetje për zhvillim ekonomik	Blerje dhe instalimi i sistemit të kamerave	66	66	100%	Realizuar
Mbështetje për zhvillim ekonomik	Expo Milano 2015	21.600	17.318	80%	VKM Nr. 813 ka hyrë në fuqi në datë 11.12.2014, informojmë se ky fond nuk mund të përdoret nga AIDA pasi koha për të kryer procedurën e prokurimit si dhe realizimin e shërbimit të kërkuar është e pamjaftueshme.
Mbështetje për zhvillim ekonomik	Mbështetje biznesit kreativ	5.920	5.566	94%	Realizuar
Mbështetje për zhvillim ekonomik	Istalime teknike dhe blerje paisje	715	715	100%	Realizuar
Mbështetje për zhvillim ekonomik	Ndërtimi i sistemit të aplikimeve online për shërbimet e QKR-së	22.680	22.680	100%	Realizuar
Mbështetje për zhvillim ekonomik	Ndërtimi i Sistemeve të Vazhdueshmërisë së Punës dhe Pajisjeve Kompjuterike "Business Continuity dhe Backup"	5.735	5.735	100%	Realizuar
Mbështetje për zhvillim ekonomik	Blerje e sistemeve të numërimit për sportelet e QKR-së	6.585	0	0%	Kontrata është lidhur me firmen " Soft & Solution" është sjellë një pjesë e mallit dhe pritet që të mbyllet brenda muajit janar dhe të likujdohet me letër kredie të miratuar nga Ministria e Financave.
Mbështetje për zhvillim ekonomik	Paisje kompjuterike (QKR Qendër dhe Njësive të Qeverisjes Vendore)	1.500	1.075	72%	Realizuar (diferencat nga prokurimet)

Mbështetje për zhvillim ekonomik	Paisje zyre	2.020	1.798	89%	Realizuar (diferencat nga prokurimet)
Mbështetje për zhvillim ekonomik	Projekti arredues i paisje zyre	480	470	98%	Realizuar (diferencat nga prokurimet)
Mbështetje për mbikqyrjen e tregut, infrastrukturën cilësisë,pronesi industriale	Rikonstruksioni ambjenteve	1.520	1.520	100%	Realizuar (Likuiduar 1470 leke+garanci 50 leke)
Mbështetje për mbikqyrjen e tregut, infrastrukturën cilësisë,pronesi industriale	Blerje paisje kompjuterike	480	401	84%	Realizuar (diferencat nga prokurimet)
Mbështetje për mbikqyrjen e tregut, infrastrukturën cilësisë,pronesi industriale	Blerje paisje zyre	760	746	98%	Realizuar (diferencat nga prokurimet)
Mbështetje për mbikqyrjen e tregut, infrastrukturën cilësisë,pronesi industriale	Blerje paisje kompjuterike	240	240	100%	Realizuar
Mbështetje për mbikqyrjen e tregut, infrastrukturën cilësisë,pronesi industriale	Blerje paisje kompjuterike	150	133	89%	Realizuar në masën 89%, diferenca deklaruar fond i lirë.
Mbështetje për mbikqyrjen e tregut, infrastrukturën cilësisë,pronesi industriale	Kompletimi me instrumenta matës dhe autolaboratore i DML-së dhe DIM-së	20.800	19.620	94%	Realizuar (diferencat nga prokurimet në vlerën 1.180 mijë lekë). Si dhe penalitete në vlerën 142 mijë lekë. (likuiduar në vlerën 19.478 mijë lekë)
Mbështetje për mbikqyrjen e tregut, infrastrukturën cilësisë,pronesi industriale	Kompletimi i laboratorit të volumeve të mëdha	4.000	1.740	44%	Kontrata është realizuar pjesërisht për efekt të moslevimit të mallit në kohë, si dhe penalitete në vlerën 418 mijë lekë. (likuiduar në vlerën 1.322 mijë lekë)
Mbështetje për mbikqyrjen e tregut, infrastrukturën cilësisë,pronesi industriale	Regjistruar force në tërheqje dhe aksesore lidhës së regjistruarve të forcës	3.800	3.797	100%	Realizuar (diferencat nga prokurimet)
TOTAL		168.853	150.532	89%	

Paraqitja grafike si më poshtë :

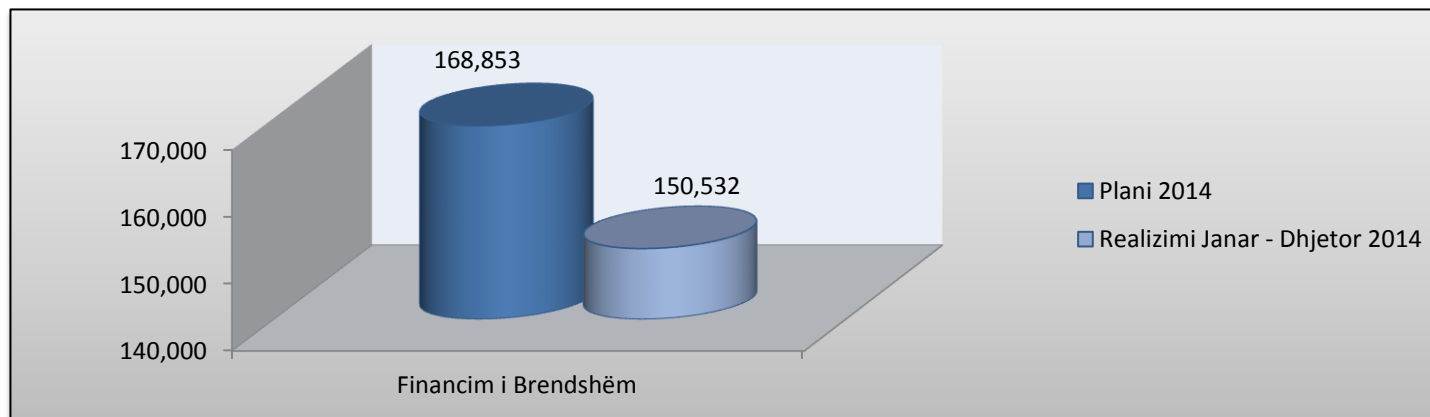


Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Huaj për Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe realizim faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK TREGTISË DHE SIPERMARRJES

PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZI MI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI
Mbështetje për zhvillim ekonomik	Mbështetje për SME-t (PMU)	510.000	414.260	81%	Realizuar, (Diferenca për arsye të vendimarrjes së Bankave Tregtare Private, të cilat bëjnë përzgjedhjen e SME-ve (Subjekteve), vlerësimin e riskut, kontrollin e dokumentacionit ligjor dhe ndër të tjera ato duhet të zbatojnë standartet e ekspozimit të vendosura me rregullore nga Banka e Shqipërisë. Që prej fillimit zyrtar të Programit në Janar 2009, Linja e kredisë për SME-të ka qenë mjaft e suksesshme dhe deri në 30 Nëntor 2014, nga Kredia e dhënë prej 25 milion Euro janë financuar 96 projekte të SME-ve Shqiptare, me një financim prej 21.390.837 Euro. Nga projektet e financuara 10 janë Biznese të reja “Start up”. Për periudhën 1 Janar 2014 – 30 Nëntor 2014, janë financuar 10 (dhjete) projekte të SME-ve shqiptare, me një financim prej 2,958,882Euro. Referuar këtyre shifrave Programi Mund të konsiderohet si një instrument i suksesshëm, i aftë të ofrojë, në momentin e një krize financiare, likuiditetet e nevojshme për SME-të Shqiptare, duke u dhënë mundësinë të realizojnë planet e tyre të investimeve. Kompanitë e financuara operojnë në sektorët e prodhimit, agropërpunimit, ndërtimit, përpunimit të drurit, këpucëve, teknologjisë së informacionit. etj. Nuk ka patur asnjë problematik deri tani në zbatimin e programit.

Mbështetje për mbikqyrjen e tregut, infrastrukturën cilësisë,pronësi industriale	Mbrojtja e markave për produktet ndërkufitare.	6.630	3.624	54,66%	Realizuar, (nuk kemi marrë akoma përgjigje për disa oferta të nisura për material promocial)
Mbështetje për mbikqyrjen e tregut, infrastrukturën cilësisë,pronësi industriale	IPA "Per forcimin e strukturës së Metrologjisë "	370	-	0%	Nuk ka filluar zbatimin. Me rishikimin e buxhetit kemi kërkuar rialokim të fondit në Projektin Mbështetje për SME.
TOTAL		517.000	417.884	81%	

Paraqitja grafike si më poshtë :

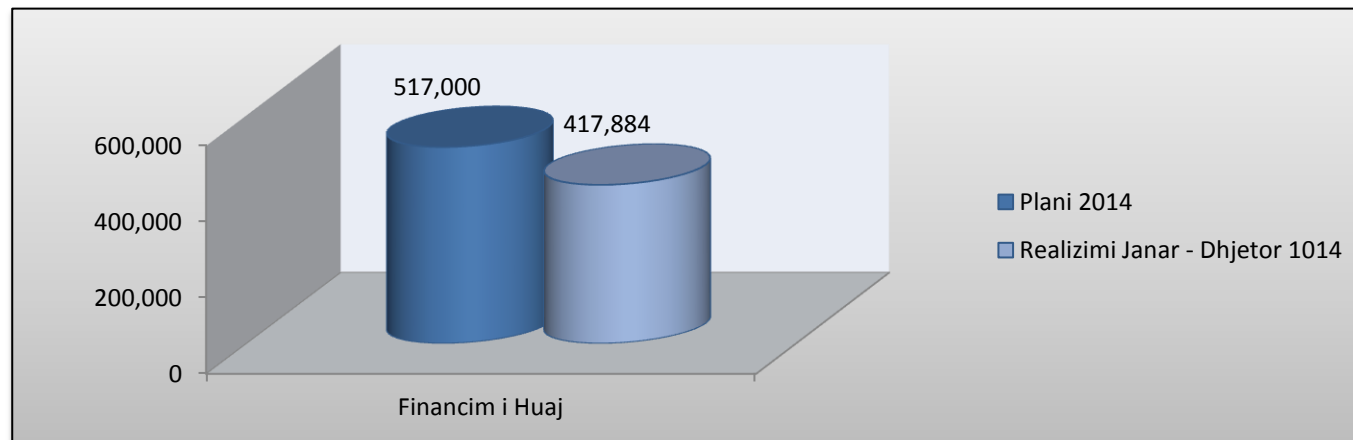

MINISTRIA E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE

Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Brendshëm për Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E BUJQËSISË ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE						
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI	
Planifikim, menaxhim dhe administrimi	Furnizim vendosje cillera për sitemin ftohës qëndror	4.100	4.020	98,05%	Realizuar si investim.	
Planifikim, menaxhim dhe administrimi	Blerje pajisje kompjuterike për zyrat	2.400	2.091	87,13%	Realizuar si investim.	
Siguria Ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit	Kosto lokale bashkëfinancim IPA 2010	16.000	15.513	96,96%	Është rishikuar plani fillestar	
Siguria Ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit	TVSH e IPA 2010 " Ndërtimi i laboratorit Veterinar"	20.000	17.693	88,47%	Kanë përfunduar tërësisht punimet.	
Siguria Ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit	TVSH e IPA 2010" Mbështetje për Infrastrukturen e AKU"	57.400	55.977	97,52%	Rimbursimi I TVSH ecen në mënyrë propocionale me disbursimin e financimit të huaj.	
Siguria Ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit	TVSH e IPA 2012 " Përmirësimi i mbrojtjes së konsumatorit"	12.400	12.000	96,77%	Realizuar	
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Fondi I Zhvillimit të rajoneve vazhdim objekte nga 2013-ta	72	0	0,00%	Rialokuar me VKZHR nr.15.dt10.10.2014	
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Mbrojtje nga lumi Osum, krahu I majtë I zonës Çorovodë-Munushtir	6.987	6.955	99,54%	Realizuar	
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Rehabilitimi i sistemit kryesor ujitës, i rezervuarit të Bazit nr.2 (rehabilitimi I kanalit U1)	21.379	7.411	34,66%	Është realizuar 75% e investimit fizikisht.	


Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Kanali ujitës i rezervuarit të Bezhanit dhe veprat ujitëse të komunës Xarrë	3.936	3.936	100,00%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Rehabilitimi I kanaleve ujitëse sekondare në komunën Mollas	9.752	9.729	99,76%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Rikonstruksion I kanalit ujitës të ujëmbledhësit Gjonç	14.087	13.785	97,86%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Mbrojtja nga lumi Osum në Munushtir	4.980	4.490	90,16%	Është realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Rehabilitimi I kanalit ujitesU303/1Drenovice, të lagjia e Hakejve dhe dega nga Vrapajt	7.392	7.325	99,09%	Është realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	KUL Spitallë	7.489	7.489	100,00%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Argjinatura mbrojtëse nga lumi Shkumbin në Cërrik	14.080	13.333	94,69%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Supervizion për Argjinatura mbrojtëse nga lumi Shkumbin në Cërrik	240	86	35,83%	Në zbatim
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Rehabilitimi prites e perroit te Zaranikes ne Elbasan	30.000	29.967	99,89%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit	Sistemi ujitës me rezervuarin e Trubullit	18.287	17.268	94,43%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Mbrojtje nga lumi Vjosë e bregut të krahut të djathtë në zonën Varibob, Fier	43.400	43.025	99,14%	Realizuar

Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Mbrojtja nga gërryerja Fushës Karjan	3.790	3.458	91,24%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Rehabilitimi i kanalit ujitës rezervuarit Pepel Gjirokastrë	3.550	3.147	88,65%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Rehabilitimi i kanaleve ujitës V-3-4	7.140	6.660	93,28%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Mbrojtje nga gërryerja nga lumi Kseras zona Qendër, Vrisera Gjirokastrë	13.167	12.818	97,35%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Rehabilitimi I elektropompës KKV-1400,të hidrovorit të Drojes, Lezhë	4.000	3.960	99,00%	Realizuar si investim
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Rehabilitimi i Kanalit Ujitës të Uzinës, Kukës	4.760	4.434	93,15%	Realizuar fizikisht dhe situacionet likujduar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Mbrojtje nga lumi Droje	3.800	3.455	90,92%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Mbrojtje Brigjesh nga lumi Drin i Zi Potgorce Dibër	21.800	20.216	92,73%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Mbrojtje Brigjesh nga lumi Drin i Zi Gjoricë Bulqizë	6.830	6.527	95,56%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Mbrojtje nga gërryerjet e lumit Kir fshati Kuç Komuna Guri i Zi Shkodër	40.000	26.114	65,29%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Reabilitimi i sistemit ujitës Okshtun 1	8.000	7.702	96,28%	Realizuar

Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Sifoni i ujëlëshuesit dhe riparimi i shkarkuesit të rezervuarit Rinë, Tiranë	7.510	7.456	99,28%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Riparim kaskada Vane dhe çarje e Pularisë (lumi i Kalasës)	7.481	7.357	98,34%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Kanali Ujites Borsh-Qeparo	4.950	4.888	98,75%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Mbrojtje nga lumi Shkumbin zona Kular Divjakë	7.000	5.942	84,89%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Rehabilitimi I elektropompe KKV-1400,te hidrovorit te Karavastase ne Lushnje	5.000	4.970	99,40%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	T.V.SH për projektin e Menaxhimit të Brimeve Ujore dhe Ujitjes	44.448	23.136	52,05%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Studim, projektim I objekteve te ujitjes kullimit dhe mbrojtjes nga permbytja	13.000	10.812	83,17%	Realizuar
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Rehabilitimi I kanalit ujites Begaj (Gash), Tropoje	3.500	3.460	98,86%	Realizuar
Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodh. Bujq,bleg, agroindustrinë e marketingun	Bashkëfinancim me kosto lokale e IPA Adriatika	560	0	0,00%	Nuk ka disbursim të financimit të huaj
Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodh. Bujq,bleg, agroindustrinë e marketingun	Mbështetje me kosto lokale për Projekti Adriatik-Jon-Valorizimi I produkteve agro-bujqësore IPA II	500	0	0,00%	Nuk është realizimi

Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodh. Bujq,bleg, agroindustrinë e marketingun	Rimbursim i shpenzimeve për Projektin SEE "NOBLE-Ida" , projekt pas vlerësimit të performancës	9.851	9.835	99,84%	Realizuar
Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodh. Bujq,bleg, agroindustrinë e marketingun	TVSH per projektin "Noble-Ida", projekt pas vlerësimit të performancës	449	449	100,00%	Realizuar
Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodh. Bujq,bleg, agroindustrinë e marketingun	TVSH për IPA 2011	3.600	0	0,00%	Nuk është realizuar, në funksion të dizbursimit të financimit të huaj
Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodh. Bujq,bleg, agroindustrinë e marketingun	Kosto lokale	33.900	26.500	78,17%	Nuk ka problematika ecuria normale.
Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodh. Bujq,bleg, agroindustrinë e marketingun	TVSH për MADA	35.100	34.084	97,11%	Realizuar
Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodh. Bujq,bleg, agroindustrinë e marketingun	TVSH për grantin francez	1.100	2	0,18%	Nuk është realizuar
Mbështetje për peshkimin	K.Lokale PIU	73.800	71.224	96,51%	Ka pritshmëri realizimi
Mbështetje për peshkimin	TVSH PIU	143.800	143.800	100,00%	Realizuar
TOTAL		806.797	724.499	90%	

Paraqitja grafike si më poshtë :

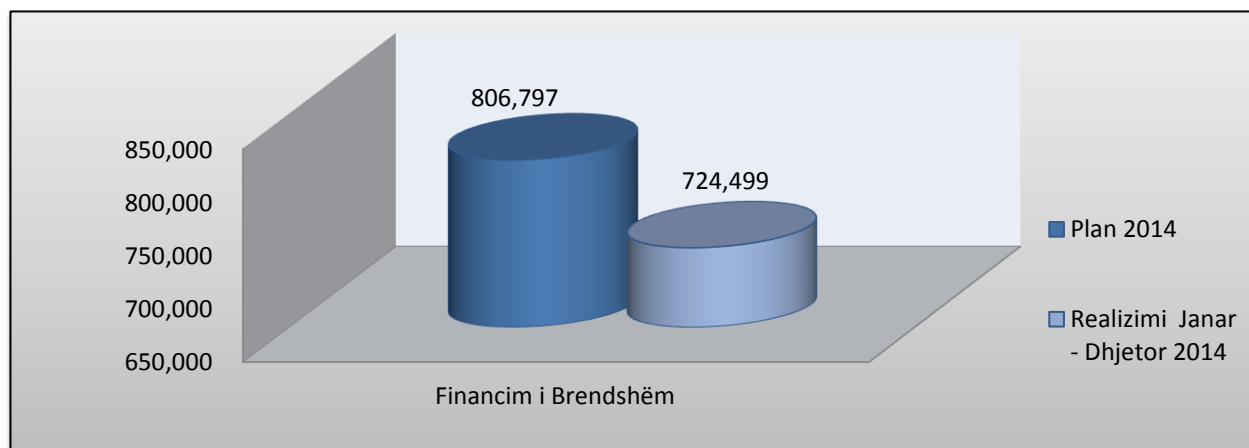


Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmblodhur të investimeve me financim të Huaj për Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E BUJQËSISË ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE						
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI	
Siguria Ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit	IPA 2008 Komisioni Evropian Projekti PAZA	27.060	26.940	99,56%	Është rishikuar plani fillestar	
Siguria Ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit	IPA 2012 " Kontrolli dhe çrrenjosja e sëmundjes së terbimit"	0	91.728	100%	Është dorezuar ngarkesa e dytë e vaksinës së terbimit.	
Siguria Ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit	IPA 2010 " Ndërtimi i laboratorit Veterinar"	30.285	70.986	100%	Janë përfunduar tërësisht punimet.	
Siguria Ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit	IPA 2009" Konsolidimi i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit"	69.502	22.548	32,44%	Realizuar, eshte rishikuar plani I buxhetit	
Siguria Ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit	IPA 2010" Mbështetje për Infrastrukturën e AKU"	170.000	269.522	100%	Realizuar	
Siguria Ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit	IPA 2012 " Përmirësimi i mbrojtjes së konsumatorit"	89.655	65.637	73,21%	Realizuar	
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	Financimi i Huaj, Projekti i Burimeve Ujore dhe Ujitjes"	269.000	136.653	50,80%	Kontraktori ka paraqitur programet e punës dhe	

					topografinë për miratim tek supervizori, ky i fundit ka lëshuar urdhërat për fillim punimesh në të gjitha digat pritet që në janar të dorëzohet statusi i parë i punimeve i cili nuk u dorëzua dot për 31.12.14
Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodh. Bujq,bleg, agroindustrinë e marketingun	Mbështetje për përgatitjen e strategjisë ndërsektoriale për bujqësinë dhe zhvillimin rural 2014-2020" IPA 2013	6.300	0	0,00%	Është duke u punuar për planin e veprimit dhe përafrimin e legjislacionit. Disbursimi mbas dorëzimit të strategjisë në vazhdimësi të vitit 2015
Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodh. Bujq,bleg, agroindustrinë e marketingun	IPA Adriatika	1.128	1.014	89,89%	Projekti po shkon drejt mbylljes nuk ka pritshmeri disbursimi
Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodh. Bujq,bleg, agroindustrinë e marketingun	Protokolli Italian-Programi-Fuqizimi i Agjensisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural për disbursimin e granteve në bujqësi IPA 2010-2012	700	0	0,00%	Nuk është bërë asnjë disbursim fondesh nga donatori
Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodh. Bujq,bleg, agroindustrinë e marketingun	Protokolli Italian-Programi për Zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të ullinjve IPA 2010-2012	700	0	0,00%	Nuk është bërë asnjë disbursim fondesh nga donatori
Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodh. Bujq,bleg, agroindustrinë e marketingun	Protokolli Italian-Projekti pilot për krijimin e eksperimentimin e një sistemi të sigurimeve të lehtësuara për mbulimin e rreziqeve në bujqësi IPA 2010-2012	700	0	0,00%	Nuk është bërë asnjë disbursim fondesh nga donatori
Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodh. Bujq,bleg, agroindustrinë e marketingun	Projekti Adriatik-Jon-Valorizimi i produkteve agro-bujqësore IPA II	1.750	0	0,00%	Janë çelur llogaritë për grantin,por nuk ka disbursim nga donatori.
Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodh.	MMP-ja (IFAD Programi zonat malore drejt tregut)	205.000	218.232	100%	Nuk ka problematika ecuria normale.

Bujq,bleg, agroindustrinë e marketingun					
Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodh. Bujq,bleg, agroindustrinë e marketingun	Granti Francez "Projekti për biodiversitetin"	11.000	1.400	12,73%	Është rishikuar plani i buxhetit 2014
Mbështetje për peshkimin	Projekti për Portin e ri të peshkimit në Durrës	672.325	672.325	100,00%	Deri në fund të vitit 2014 është kryer pjesa më e madhe e punimeve civile.
TOTAL		1.555.105	1.555.105	100%	

Paraqitja grafike si më poshtë:

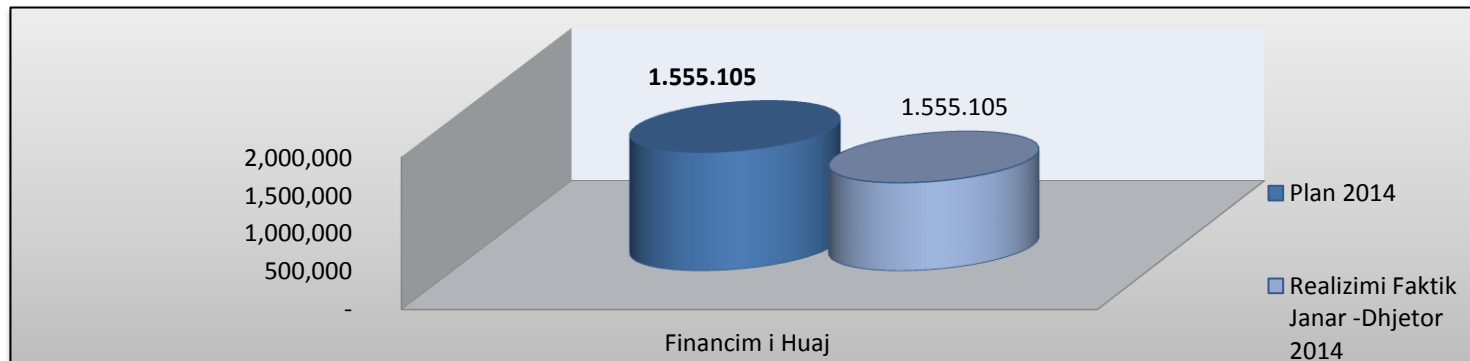

MINISTRIA E FINANCAVE

Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Brendshëm për Ministrinë e Financave dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.


MINISTRIA E FINANCAVE				
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Rikonstruksion i godinës së MF	1.354	1.354	100%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Krijim i mjedisit të ri dhomë serverash për MoF	41.160	0	0%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Blerje pajisje kompjuterike	5.000	1.879	38%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Përmirësim i Infrastrukturës Qëndrore të Sistemit të Thesarit	90.000	0	0%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Blerje pajisje zyrash	19.027	9.486	50%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Blerje prog. elektronik Alpha Net	473	473	100%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	TVSH për projektin SETS	500	490	98%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Blerje pajisje zyrash	71	71	100%
Menaxhimi i Shpenzimeve Publike	Blerje pajisje zyrash	10	10	100%
Menaxhimi i Shpenzimeve Publike	Blerje pajisje kompjuterike për deget e thesarit	10.000	0	0%
Menaxhimi i Shpenzimeve Publike	Rikonstruksion zyre	265	261	98%
Menaxhimi i Shpenzimeve Publike	Fotokopje	143	143	100%
Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore	Bl.rafte metalike	100	100	100%
Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore	Blerje pajisje për sistemin informatik	900	890	99%
Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore	Blerje pajisje zyre dhe elektronike	19.891	19.891	100%
Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore	TVSH per sistemin e Taksave(detyrim)	62.050	62.050	100%
Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore	Bl.infrastruk.mbështetëse per sistemin e ri tatimor e-	121.512	110.521	91%

	taxation			
Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore	Zhvilimi dhe Implementimi i business intelligence(BI)	26.665	24.891	93%
Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore	Blerje e desktop PC	36.686	36.685	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Blerje automjete per Drejtorine e Hetimit Tatimor	116.733	116.733	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Pajisje kompjuterike	3.800	3.046	80%
Menaxhimi i te ardhurave Doganore	Servera Blade dhe pajisje Blade	10.722	10.722	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Licensa CheckPoint për Fireëallin-in në qendër dhe degë doganore	5.121	5.121	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	License për upgrade të versionit aktual të Oracle Enterprise Edition dhe suport	11.646	11.646	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Pajisje për certifikim elektronik	419	419	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Backup incremental dhe sistem për monitorimin dhe mbrojtjen e databasë-s së AW	576	576	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Bashkëfinancim për përmiresimn e sistemit ASYCUDA	8.463	8.463	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Blerje automjete dhe fourgon	10.200	10.200	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Rikonstruksion tarracë dhe zyrave	2.180	2.172	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Rikonstruksion i ambjenteve të punës së A.K Detare në Durrës	455	455	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Rikonstruksion i tarracës laboratorit	358	358	100%

Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Asistencë Teknike për Administratën Doganore në Ngritje Kapacitetesh	405	405	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	K. Lokale Makineri pajisje për laboratorin kimik doganor	3.941	3.941	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	TVSH Makineri pajisje për laboratorin kimik doganor	25.000	24.900	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	TVSH për projekt vendosje në sistem kontrolli dhe instalim pilot i pajisjeve detektuese për të siguruar mbikqyrjen e materialeve radioaktive	4.336	4.336	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	TVSH për rehabilitimin e PKK Morinë Kukës	1.092	1.092	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Blerje trare elektronik	7.776	7.776	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Blerje fotokopje	342	342	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Ndërtim lavazhi për larje makinash	455	455	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Blerje karrige salle dhe korridori	473	472	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Blerje kondicioner	386	385	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Blerje podium për mbledhje	476	476	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Blerje stola të jashtëm	461	461	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Blerje bicikleta	2.310	2.310	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Peshore për matjen e floririt	200	0	0%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Blerje garderobe	4.999	4.906	98%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Rikonstruksion i pjesëshëm tarrace	432	432	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Blerje pajisje për mobilimin e hollit të godinës	480	334	70%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Blerje e 10 dyerve të brendshme	387	386	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Blerje pajisje zyre	933	903	97%

Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Rrethimi i territorit të Doganës Morinë	393	393	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Riparim tualetesh	380	379	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Blerje prozhektorë për ndriçimin e parkimit Morinë	300	264	88%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Rikonstruksion i ambjenteve në Qafë Prush Has	438	438	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Rikonstruksion i ambjenteve në Qafë Morinë Tropojë	436	436	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Kolaudim i objekteve të PKK Qafë Morinë, Qafë Prush, Orgjost, Shishtavec, Morinë	90	90	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Projekt për mbilartimin dhe rikonstruksionin e godinës së DPD	7.572	7.572	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Projekt për rikonstruksionin e Terminalit të Brendshëm Shkodër	7.728	7.728	100%
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Projekt për rikonceptimin e hapësirave në PKK Muriqan	5.940	3.000	51%
Lufta kundër transaksioneve financiare jo-ligj	Rikonstruksion godine - Degës së Doganës Fier	7.735	7.734	100%
Lufta kundër transaksioneve financiare jo-ligj	Rikonstruksion godine për DPPPP	483	443	92%
Lufta kundër transaksioneve financiare jo-ligj	Blerje pajisje për DPPPP	480	373	78%
	Blerje pajisje për AAPSK	1.000	830	83%
TOTAL		694.339	523.097	75%

Paraqitja grafike si më poshtë:

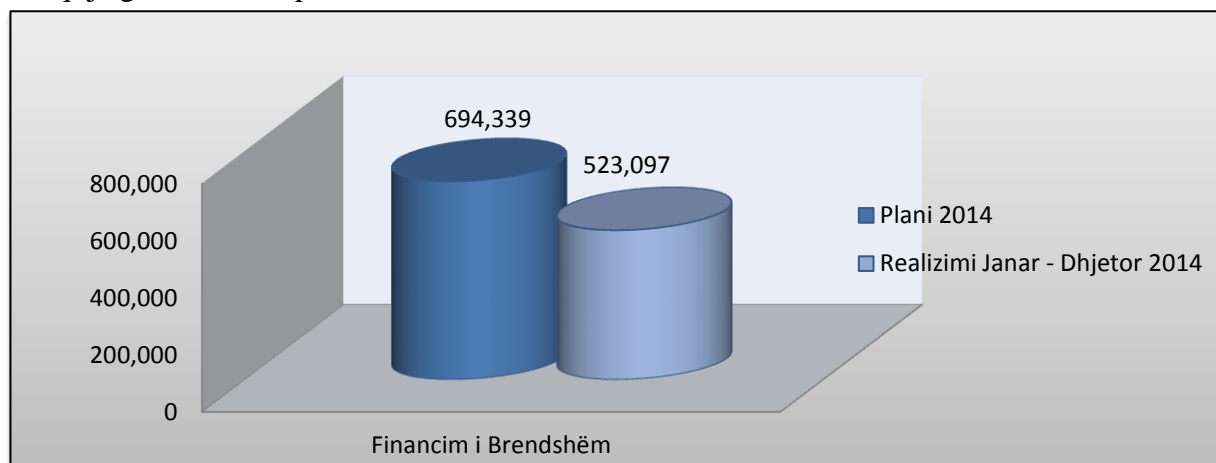


Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmblodhur të investimeve me financim të Huaj për Ministrinë e Financave dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E FINANCAVE					
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Projekti support and Expansion of the Albanian Treasury	40.000	32.000	80%	
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Asistence Teknike për Administratën Doganore në Ngritje Kapacitetesh per Drejtorine e Inteligjencës në fushën e Analizës dhe Menaxhimit të Riskut, Drejtorinë e Kontrollit të pas Zhdoganimit, Drejtorinë e Mbrojtjes së Pronësisë Intelektuale dhe Drejtorinë e Laboratorit Kimik Doganor.	80.334	80.334	100%	
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Kontratë Blerje Makinerish dhe pajisjesh për Laboratorin Kimik Doganor IPA -2011	57.279	57.279	100%	
Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Pjesëmarrje në Programin "Doganat 2013"	1.540	1.540	100%	

Menaxhimi i të ardhurave Doganore	Projekt vendosja e një sistem kontrolli dhe instalimi pilot i pajisjeve detektuese për të siguruar mbikqyrjen e materialeve radiaktive	26.534	26.534	100%
TOTAL		205.687	197.687	96%

Paraqitja grafike si më poshtë:

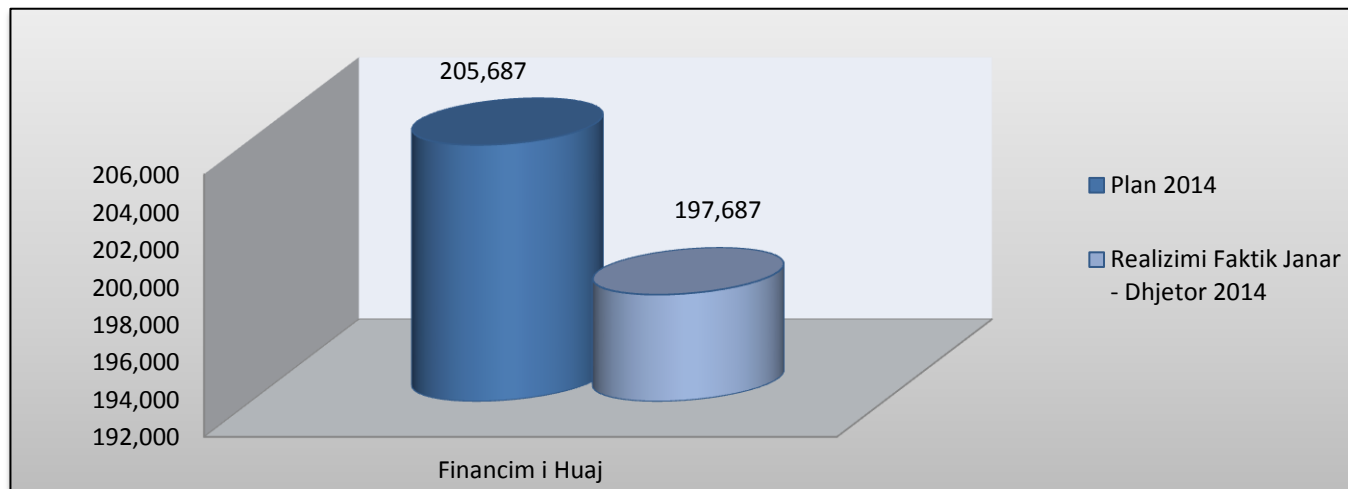

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Brendshëm për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT				
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Rikonstruksion Aparati MASH	34.100	0	0%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh rikonstruksionit të Godinës Aparati MAS	500	0	0%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Studim-projektim i rikonstruksionit te godinës së aparatit të MAS	1.000	0	0%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Blerje pajisje kompjuterike MAS, DAR/ ZA,	4.000	0	0%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Pajisje të ndryshme - Aparati MAS	5.000	49	1%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Pajisje kompjuterike	387	0	0%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Materiale informatike kompjuterike	478	0	0%
Arsimi Baze (përfshirë parashkollorin)	Pajisje mobilerie për shkollat e arsimit parauniversitar	100.000	0	0%
Arsimi Bazë (përfshirë parashkollorin)	Kosto lokale per projektet me Bashkine e Tiranes, detyrime	22.483	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	TVSH per projektet me Bashkine e Tiranes, detyrime	18.058	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Shkolla 9-vjecare Nonda Bulka, Bashkia Permet (FZHR)	53.964	34.973	65%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion + Shtese Kati, Kopeshti Nr.2, Bashkia Peshkopi (FZHR)	25.784	12.892	50%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Perfundim i ndertimit te shk. 9-vjec Trebisht, Komuna Trebisht (FZHR)	15.617	15.617	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim shkolle 9-vjeçare dhe kopsht Kurdari, Komuna Suc (FZHR)	21.734	12.013	55%

Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shk 9-vjeç Pobreg, Komuna Terthore (FZHR)	4.540	4.537	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim shk 9-vjeç Fshati Qinamak, Komuna Surroj (FZHR)	20.148	15.751	78%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shk 9-vjeç fshati Kalis, Komuna Kalis (FZHR)	13.438	10.040	75%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstr.+shtese shkolle	38.861	38.861	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim shk 9-vjeç Fshati Helshan, Komuna Golaj (FZHR)	20.596	19.551	95%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim kopshti dhe sist,amb.jashtme te shk.mes.bashk"Gjon Ndoci",Komuna Bushat (FZHR)	12.541	11.765	94%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rik.shkolla 9-vjecare Vrith	4.802	4.801	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shkolla e mesme 8-dhjetori Qelez	16.348	16.347	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim shk 9-vjeçare ne Koder Nikaj Shllak,Komuna Shllak ('09120)	4.892	4.892	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion i god.te shk mes.bashkuar dhe amb.sportive Gjegan, Puke (FZHR)	2.680	2.680	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion I shkolles se bashkuar Shales, Komuna Shales (FZHR)	9.659	9.659	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim Palestre	22.333	22.332	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rik.Shkolla 9-vjeçare Genc Leka	13.485		0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksioni i shkolles 9-vjeçare Polis Gurshpate FZHR)	1.627	1.627	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstr shk 9-vjec Sinanaj, Komuna Lopez, Tepelene (FZHR)	12.270	4.470	36%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim shkolla 9-vjecare Verdove,Komuna Buçimas,Pogradec (FZHR)	5.656	5.656	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shkolla mesme e bashkuar Trebinje	4.637	4.637	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion kopshti "Mustafa Qemal Atatürk" Orikum, Bashkia Orikum (FZHR)	4.766	0	0%

Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim i shkolles 9-vjeçare Bestrove, Komuna Qender Vlore (FZHR)	9.046	9.046	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare Ahmet Gashi (FZHR)	107.633	89.182	83%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertimi i shkolles 9- vjeçare ne zonen ish-kombinatin tekstil (FZHR)	25.489	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim Shkolle 9 vjecare dhe e mesme 11 shkurti komuna Synej	25.037	25.037	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim kopshti Zall Mner	28.931	28.931	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertimi I shkolles 9- vjeçare Lagje nr 4 Kamez, Bashkia Kamez (FZHR)	124.598	124.598	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstr shkolla 9-vjeçare Gose, Komuna Gose (FZHR)	21.877	21.876	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion i shkolles nr 2 Mamuras (FZHR)	22.715	11.533	51%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim kopesht femijesh Milot, Komuna Milot (FZHR)	13.688	13.688	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion dhe shtesë anesore shk 9-vjeç "Alush Grepcka", Bashkia Roskovec (FZHR)	21.380	21.380	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstr shkolla 9 vjecare	8.441	8.441	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertimi shkolles 9-vjecare fshati Ngjeqar, Komuna Kurjan (FZHR)	16.819	11.482	68%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rik shkolles 9-vjeçare Merinez, Komuna Kuman Fier (FZHR)	27.934	27.934	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shk 9-vjeç fshati Visoke, Komuna Qender Mallakaster (FZHR)	11.112	11.112	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	RIKONST.SHKOLLA BEJAR	7.789	7.789	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstr shk. E mesme e bashkuar "DH.Mino", Komuna Bubullime (FZHR)	10.880	10.880	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion dhe shtese e shkolles se mesme te bashkuar Cerme Sektor, Terbuf, Komuna Terbuf (FZHR)	14.734	14.734	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim I shkolles 9-vjeçare ne fshatin Rromanat, Komuna Rrashbull (FZHR)	23.756	23.754	100%

Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim I shkolles 9-vjeçare ne fshatin Rreth,Komuna Xhafzotaj (FZHR)	37.795	37.474	99%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim shkolla 9-vjecare Stacioni Zootek Xhafzotaj, Komuna Rrashbull (FZHR) 20.950.250	20.950	20.950	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion i shkollës fillore fshati Bardhaj	5.487	5.487	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Shkolla Fillore Frasher	3.449	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion Kopshti nr.2 Poliçan (FZHR)	4.667	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Shkolla 9- vjecare Topojan (FZHR)	4.294	3.416	80%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndërtim i shkollës 9-vjeçare Lejcan (FZHR)	10.496	7.704	73%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shkolla fillore 2kt Kull, (FZHR)	3.213	3.213	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Shkolla 9-vjecare Paper Sollak (obj i ri) (FZHR)	10.056	10.056	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Shkolla 9-vjecare vartëse Gjerë (FZHR)	3.860	3.860	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shkolla 9-vjecare Sotire (FZHR)	9.740	7.017	72%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shkolla Saver (FZHR)	7.683	7.683	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Ravonik, Komuna Drenove (FZHR)	4.577	4.575	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim shkolle CU Drithas	8.266	8.266	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim shkolla 9-vjecare fshati Vidohove, Komuna Miras (FZHR)	20.029	20.029	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertimi i shkollës së CU fshati kodër-gështenjë (FZHR)	3.035	2.247	74%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksioni i shkollës 9- vjeçare Gegaj (FZHR)	8.050	7.848	97%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shkolla CU Paçram (FZHR)	7.649	7.061	92%

Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndërtim shkolla 9 vjeçare Bastar-Murriz (FZHR)	12.007	9.528	79%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shkollë 9-vjeçare Mushnike	3.368	3.367	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Shkolla 9-vjeçare Zikxhafaj (FZHR)	6.669	3.292	49%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksioni i shk 9-vjeçare Gurre e Vogel (FZHR0	5.710	5.710	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Lekas, Komuna Lekas (FZHR)	3.941	2.295	58%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare Kryezi, komuna Qafe Mali	4.491	4.491	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Perfundimi I punimeve ne shkollen nr. 1 Kruje, CBA (detyrim)	3.502	3.502	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndert shk 9-vjeç Fshati Sukth, Komuna Katund i Ri	20.000	18.809	94%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Krijim fond bibliotekash per shkollat e arsimit baze	15.000	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Detyrim kontrate per shkollen Beslidhja Lezhe, CBA (detyrim)	35.816	34.234	96%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Pajisje mobilerie CBA shkolla Bashkia Krume	36	36	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Shkolla 9-vjeçare Nr.2 Rreshen .rikonstruksion tarrace, Bashkia Rreshen (FZHR)	6.460	6.460	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Blinisht	8.320	8.320	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim i shkollës 9-vjeçare +kopsht, Karkanjoz, Komuna Roshnik	19.929	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Projekti "Shkolla, qender komunitare": Ndërtimi 3 fushave sportive polifunkionale në ambientet e shkollave, me lote (Shkolla "Ajet Xhindoli", lagjia Muzakaj prej 2,796,300L; Shkolla "28 Nëntori", prej 2,976,300L; shkolla "Xhemal Cekini" prej 3,653,076L)	5.590	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare dhe palestër Gjorice, Komuna Gjoricë	19.059	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rik shk.9 - Vjeçare I. Qiqi	10.363	10.363	100%

parashkollorin)				
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Shkolla e bashkuar Xibër, Komuna Xibër	36.188	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Projekti "Shkolla, qender komunitare": Ndërtimi i 4 terreneve sportive në shkolla të qytetit Peshkopi (shkolla "Nazmi Rrushti; shkolla "Demir Gashi"; shkolla "Seit Najdeni"; shkolla "Selim Alliu")	19.320	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion dhe shtesë anësore në shkollën 9-vjeçare Nr.4, Kruje, Bashkia Kruje	29.673	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Projekti "Shkolla, qender komunitare": Rikualifikimi i hapësirave sportive të 4 shkollave të qytetit Durrës (shkolla "14 Nentori" prej 8,274,040L; shkolla "Jusuf Puka" prej 6,908,148L; Shkolla "Marie Kaculini" prej 8,777,622; shkolla e mesme profesionale "Jan Kukuzeli" prej 8,450,672L)	21.067	5.290	25%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Halit Uruci" Belsh, Bashkia Belsh	35.857	17.166	48%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndërtim shkollë 1 katëshe, Shkolla Fushë-Studenti, Komuna Stëblevë, Librazhd	8.451	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Projekti "Shkolla, qender komunitare": Ndërtimi i 4 mjediseve sportive në shkolla të qytetit Elbasan (shkolla "Naim Frashëri" prej 8,352,548L; shkolla "Sul Harri" prej 8,143,603L; shkolla "Abdyl Paralloi" 8,233,578L; shkolla "Adem Krasniqi" prej 9,772,643L)	22.427	12.580	56%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare "Hiqmet Buzi", fshati Kallm, Komuna Mbrostar	25.656	7.466	29%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndërtim kopshti, Komuna Portëz	5.550	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Thanasaj, Komuna Dushk	15.658	7.630	49%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare "Riza Iberliy" Zhame-Sektor, Komuna Dushk	28.433	5.981	21%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndërtim kopshti i ri, Komuna Fratar	8.594	2.557	30%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndërtim kopshti, Fshati 3 Urat, Komuna Grabian	4.431	0	0%

Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Projekti "Shkolla, qender komunitare": Ndërtimi i 4 mjediseve sportive në shkolla të qytetit Fier, me lote (Shkolla "Jani Bakalli" prej 4,477,452L; Shkolla "Liri Gero" prej 5,323,962L; Shkolla "Kristaq Gero" prej 5,323,962L; Shkolla "Pinellopi Pirro" prej 5,323,962L)	13.292	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Terrene sportive në 4 shkolla (Shkolla "Pandeli Sotiri"; Shkolla "Thoma Papapano"; Shkolla "Cajupi"; Shkolla "Siri Shaplo", lagje Granicë)	18.233	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare "Mësonjëtorja e parë"	50.000	3.244	6%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Kolanec, Bashkia Maliq	2.902	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Terrene sportive në 4 shkolla të qytetit Korçë (Shkolla "Demokracia"; Shkolla "Naum Veqilharxhi"; Shkolla "Sotir Gurra"; kompleksi shkollor Rruga "Ajet Xhindoli")	35.000	5.074	14%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare, Arren.	12.095	7.257	60%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndërtim i shtesës së shkollës 9-vjeçare "Bajram Curri", Kukës	81.211	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Projekti "Shkolla, qender komunitare": Mjedise sportive në 4 shkolla 9-vjeçare (Ndërtim palestre sportive e shkollës "Lidhja e Prizrenit" prej 13,838,141L; Shkolla " Bajram Curri" prej 5,092,789L; Shkolla " Riza Spahiu" prej 7,074,444L; Shkolla " Ahmet Voka",Gostil, prej 4,868,624L)	20.068	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndërtim kopshti në qytetin e Lezhës, Bashkia Lezhë	13.680	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	RIK SHKOLLE	15.977	15.977	100%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Sistemi i ngrohjes shkolla 9-vjeçare Rubik, Bashkia Rubik	7.965	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Kaçinar, Mirditë	8.000	4.800	60%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndërtimi i qendrës sportive tip, tek kompleksi i shkollave (2 qendra)	13.337	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Aleksandër Paloci"	3.650	0	0%

parashkollorin)	Shelqet, Bashkia Vau i Dejës (shkollë e djegur)			
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare "Bërdicë e Madhe", Komuna Bërdicë	9.994	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Projekti "Shkolla, qender komunitare": Mjedise sportive në 4 shkolla (Shkolla "Dëshmoret e Prishtinës" prej 2,442,622L; Shkolla "Ndoc Mazi" prej 8,751,168L; Shkolla "Ismail Qemali" prej 8.751.168L; Shkolla "Branko Kadia" prej 9,751,168L)	19.302	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndërtimi i kopshtit në lagjen nr.4 tek rruga "Sufajve" komuniteti i romëve Kavajë	14.180	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Shtesë kati i shkollës 9-vjeçare Qesarakë, Komuna Dajt	23.350	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Projekti "Shkolla, qender komunitare": Terrene sportive në 4 shkolla 9-vjeçare të qytetit Tiranë (shkolla "7 Marsi" prej 6,800,987L; shkolla "Shkolla e Kuqe" prej 3,515,111L; shkolla "Servete Maci" prej 3,515,111L; shkolla "Skënder Luarasi" prej 3,515,111)	11.275	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndërtim shkolla 9-vjeçare "Pilo Prifti", fshati Novoselë, Komuna Novoselë	28.498	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion kopshti nr.10, Vlorë, Bashkia Vlorë	10.200	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Projekti "Shkolla, qender komunitare": Terrene sportive për 4 shkolla 9-vjeçare (Shkolla "Teli Ndini"; Shkolla "4 Heronjte"; Shkolla "Marigo Posio"; Shkolla Ibrahim Kushta"; Shkolla "Zigur Lelo"; Shkolla " Rilindja")	17.100	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Thimi Tani" Bashkia Berat	15.883	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Sistemim, rrethim oborri, ndertim palestre shkolla e bashkuar, lagjia "4 Shtatori" Ura Vajgurore, Bashkia Ura Vajgurore	8.790	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion pjesor shkolla 9-vjecare fshati Zaloshnje, Komuna Gjerbes, Skrapar	5.385	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim shkolla CU Urake, Komuna Rrajce	5.803	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim shkolla vartese Fshati Zdrajsh Verri, Komuna Orenje	4.164	0	0%

Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shkolla 9-vjecare Babje, Komuna Qender Librazhd	6.448	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shkolla 9-vjecare "Naim Frasheri" Pishkash, Komuna Qukes	9.591	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Perfundim i punimeve ne shkollen "Xhafer Hakani", Elbasan	6.000	5.538	92%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shkolla e bashkuar "Muharrem Zela" Komuna Kukur	10.603	5.205	49%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion i shkolles 9 vjecare Zahrisht, Faza II, Bashkia Krume	14.270	7.163	50%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksioni i shkolles 9-vjecare dhe ndertim palester Radomire, Komuna Kala e Dodes	38.043	10.318	27%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Andon Xoxa" Fier	17.318	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Jani Bakalli" Fier	11.054	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shkolla CU fshati Ane-Vjose, Komuna Qesarat, Tepelene	5.144	1.255	24%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim i shkolles cikli i ulet, fshati Poceste, komuna Libonik	7.617	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksioni i shkolles 9-vjeçare fshati Gimaj, Komuna Shale	15.250	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Ndertim i shkolles 9-vjecare, fshati Mezi, Puke	14.513	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksioni i shkolles "Pjeter Zahrishi", Komuna Blinisht, Lezhe	10.736	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shkolla e bashkuar Hore Vranisht, Komuna Vranisht	23.036	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Zigur Lelo" Vlore, Bashkia Vlorë	20.749	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)		25.614	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Rikonstruksion shkolla 9-vjecare "kuvendi I Dukagjinit", Fshati Dukagjin, Komuna Derjan	10.359	0	0%
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Detyrim, ndertim palestre te re dhe shtese nje sanitare Shkolla "A.Moisiu, Kavaje	8.171	0	0%

Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Detyrim, rikonstruksion shkolla Rrapez	645	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Ministria e Arsimit dhe Sportit, Fondi per Zhvillimin e Rajoneve	8.840	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion shk mesme "28 Nentori", Bashkia Shkoder (FZHR) 5301266_10390555	15.692	4.486	29%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksioni dhe ndertim palestre I shkolles se mesme Gostime (FZHR)	3.076	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Ndertim shk mesme "Osman Gjini", Komuna Mollas Elbasan (FZHR)	63.659	54.621	86%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Palest+ngroh+sistemim shk mes Katund Ri, Kom Kashar, (FZHR)	6.466	6.240	96%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion shkolla e mesme Skenderbej, Kruje (FZHR)	20.408	20.403	100%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion dhe shtese anesore shkolla Zvezde	8.438	8.438	100%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion i shkollës Papa Gjon Pali II (FZHR)	17.959	17.959	100%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Shkolla e mesme e bashkuar "Xhile Lici" Skënderbegas (FZHR)	7.485	5.774	77%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Ndertim shkolle e mesme Bradashesh (FZHR)	80.000	80.000	100%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion I shkolles se mesme te bashkuar "Sotir CAPO" fshati Zharres (fzhr)	14.138	14.095	100%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Ndërtim i ri shkolla e mesme e bashkuar Radokal	34.688	34.688	100%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion çatie Shkolla e mesme "Skenderbeu" (fzhr)	3.159	3.128	99%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar, Surrel	7.432	7.432	100%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion dhe shtese shkolla e mesme "Gjon ndoci", Komuna Bushat	35.155	35.155	100%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Shkolla e mesme e bashkuar e Kuçit, Komuna Vranisht	10.127	10.127	100%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion I shkolles se pergjithshme "Shefqet Shuaipi" Lumas"	19.292	0	0%


Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rik.shk.Xh.Doda	5.512	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Sit 1 Rikonstruksion i plote i Shkolles se Mesme "Eqerem Cabej", Faza I, Njesia 4	27.549	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Sit 2 Rikonstruksion i plote i Shkolles se Mesme "Eqerem Cabej", Faza I, Njesia 4	10.977	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion i shkollës së mesme "Kristaq Capo" Bashkia Berat	16.707	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksioni i shkollës së mesme te bashkuar "Abdyrrahman Përmeti", Komuna Lis	23.170	6.671	29%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion i shkollës së mesme "Ramazan Karaj", Nikel, Komuna Nikel	14.812	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Ndërtim i shkollës së mesme "Shote Galica" Fushë-Kruje	81.902	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion i shkollës së mesme "Zhani Ciko", Patos	20.712	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksioni i shkollës së mesme "Miti Zaka", Bashkia Divjakë	17.657	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion I shkollës së mesme "Siri Shapllo", Bashkia Gjirokastrë	18.164	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion nyje sanitare të shkollës së mesme Maliq	1.424	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion i shkollës së mesme Voskop sistem ngrohje , Komuna Voskop	31.836	9.952	31%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion shkolla e mesme e bashkuar Gruemirë, Komuna Gruemirë	10.602	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion , shtesë anësore 2 kate dhe palestër për shkollën e mesme të pergjithshme, Komuna Vaqarr	7.588	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksioni i shkollës së mesme "Sadi Nuri", Komuna Ndroq	12.249	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Rikonstruksion i plotë dhe shtesë ambientesh në shkollën e mesme "Qemal Stafa", Njësia 10	5.000	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Shkolla e mesme e bashkuar "Hamdi Rrap Lazaj" Gjorm, Komuna Brataj	9.995	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Blerja pajisje tableta dhe platforme e-learning per shkollat e mesme te Pergjithshme	172.129	172.000	100%

Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Pajisje mobileri arsimi i mesem i pergjithshem	52.000	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Pajisje kompjuterike arsimi i mesem i pergjithshem	22.869	0	0%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Pajisje elektronike per ambientet e provimeve te shtetit dhe stafin e DPSH Faza e dyte (Projekti CBA)	131	131	100%
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Blerje pajisje tableta per platformen e-learning per shkollat e mesme te pergjithshme	400.000	400.000	100%
Arsimi i Mesem (profesional)	Ministria e Arsimit dhe Sportit, Fondi per Zhvillimin e Rajoneve	0	0	0%
Arsimi i Mesem (profesional)	Pajisje instalime (elektrike) ne shkollat profesionale IPA 2011, Beqir Cela Durres	0	0	0%
Arsimi i Mesem (profesional)	Pajisje instalime (elektrike) ne shkollat profesionale, Elbasan financuar nga IPA 2008	2.100	0	0%
Arsimi i Mesem (profesional)	Pajisje teknologjike shk. Profesionale detyrim	93.287	0	0%
Arsimi i Mesem (profesional)	TVSH Projekti IPA Komisioni Europian	42.900	19.161	45%
Arsimi i Mesem (profesional)	TVSH Projekte te vogla te huaja ne ndihme te shkollave profesionale TVSH	7.000	0	0%
Arsimi i Mesem (profesional)	Pajisje mobilerie per tre shkollat profesionale IPA 2011	16.927	0	0%
Arsimi i Mesem (profesional)	Pajisje konvikti per shkollen profesionale IPA 2008, Bushat shkodër.	10.000	9.828	98%
Arsimi i Mesem (profesional)	Rikonstuksioni I shkolles Loro Borici, -shkolla teknike-elektrike, Tirane (detyrim)	3.639	3.499	96%
Arsimi i Mesem (profesional)	Detyrim pajisje kompjuterike	10.777	10.777	100%
Arsimi i Mesem (profesional)	Detyrim pajisje kompjuterike	2.097	0	0%
Arsimi i Mesem (profesional)	Krijimi i laboratoreve te Informatikes per shkollat profesionale	15.000	0	0%
Arsimi i Mesem (profesional)	Ndërtimi i murit rrethues i shkollës "Beqir Çela", Shkozë	2.196	0	0%
Arsimi i Mesem (profesional)	Rikonstrukcion dhe rrethim shkolla e mesme "Halit Berzeshta" Prenjas, Bashkia Prenjas	8.131	0	0%

Arsimi i Mesem (profesional)	Rikonstruksion i njeve sanitare, Shkolla Ekonomike Tirane	900	0	0%
Arsimi i Mesem (profesional)	Pajisje laborator , softëer, hardëer dhe elektronike	9.294	0	0%
Arsimi i Mesem (profesional)	Pajisje instalim rrjeti	3.453	0	0%
Arsimi i Mesem (profesional)	Pajisje mobilerie	1.886	0	0%
Arsimi Universitar	Rikonstruksion i korpusit kryesor Qendra Albanologjike (detyrim)	15.500	13.237	85%
Arsimi Universitar	Ndertimi I godines se pare ne truallin e kampusit te ri universitar	35.491	35.491	100%
Arsimi Universitar	Ndertimi i nje godine te re universitare per Universitetin "Aleksander Moisiu" Durres (detyrim)	60.000	60.000	100%
Arsimi Universitar	Shtesa e godines se Universitetit Politeknik Tirane (detyrim)	88.933	62.760	71%
Arsimi Universitar	Pajisje per Data Center QNSRT	20.000	0	0%
Arsimi Universitar	TVSH per projektin e rrjetit telematik	21.809	31	0%
Arsimi Universitar	TVSH per projektet e huaja	1.885	0	0%
Arsimi Universitar	Blerje mallrash për projektin me titull ' Drejt një cilësie të re të mësimdhënies me standarte teknike dhe aftësim praktik të studentëve në disiplinat e kimisë, UT (CBA)	833	833	100%
Arsimi Universitar	Blerje mallrash për projektin me titull " Paisje laborator për të gjitha laboratorët nr. kontratë ut/g/sh/006/2010	8.046	8.046	100%
Arsimi Universitar	Shtese godine Fakulteti i Ekonomise dhe AGB, UBT	20.607	20.607	100%
Arsimi Universitar	Rikonstruksion i rrjetit hidrik të godinave në UBT (FZHR)	2.458	2.458	100%
Arsimi Universitar	Pajisje lab_krijon, UBT	2.716	2.517	93%
Arsimi Universitar	Pajisje_BNT Electronics, UBT	350	0	0%
Arsimi Universitar	Rikonstruksion Dif.e pa lik.kontr.baze "Rik.Q.Exp.Verës	239	239	100%
Arsimi Universitar	Mbikq. punime "Rik.Garazhdeve"	469	469	100%
Arsimi Universitar	Rikonstruksioni i pjesshem i objekteve UBT"	1.656	1.656	100%
Arsimi Universitar	KOLAUDIM "RIK I PJES I OBJET. NDER. UBT"	12	12	100%
Arsimi Universitar	Projekt shkencor	3.101	3.101	100%
Arsimi Universitar	TVSH per projekte te huaja ne IFZB	4.030	4.030	100%
Arsimi Universitar	TVSH per pajisje per sherbimin e hidrometeorologjise	1.786	1.786	100%
Arsimi Universitar	Blerje KONDICIONER	44	0	0%

Arsimi Universitar	Rikonstruksion i mjediseve të jashtme të Korpusit kryesor, Rektoratit, fakultetit ekonomik, Fakultetit shkencave të edukimit.	12.531	12.531	100%
Arsimi Universitar	TVSH per projektin IPA	1.329	1.329	100%
Arsimi Universitar	Ndertim godine e re fakulteti ekonomik univ.Shkodres	53.915	53.915	100%
Arsimi Universitar	Fond I ngrire	817	0	0%
Arsimi Universitar	Blerje pajisje mobilerie	928	0	0%
Arsimi Universitar	Blerje pajisje per laboratorin e aplikimeve dixhitale	1.325	0	0%
Arsimi Universitar	Blerje pajisje per laboratorin e qeramikes	1.092	0	0%
Kerkimi shkencor	Detyrim pajisje elektronike	783	0	0%
Kerkimi shkencor	Detyrim pajisje laboratorike	2.350	0	0%
Zhvillimi i Sportit	Fondi per Zhvillimin e Rajoneve (per Sportin)	11.482	0	0%
Zhvillimi i Sportit	Ndertim i Parkut Olimpik Tirane_ vlera e plote 685 milion	200.000	0	0%
Zhvillimi i Sportit	Rikonstruksion ambj sportive	1.335	1.159	87%
Zhvillimi i Sportit	M112533	6.518	0	0%
Zhvillimi i Sportit	Detyrim Rikonstruksion pista e stadiumit	978	0	0%
Zhvillimi i Sportit	Detyrim Ndertim ambiente shtese Aneksi Sportiv	2.828	0	0%
TOTAL		4.514.358	3.819.109	85%


Paraqitja grafike si më poshtë :

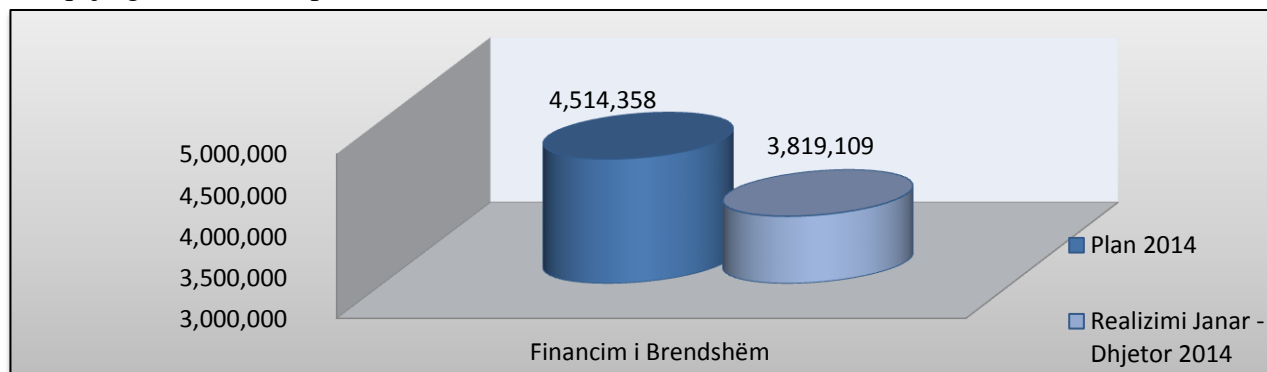

Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të huaj për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe realizim faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT				
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %
Arsimi i Mesëm (profesional)	Shkolla profesionale “Petro Sota” Fier Shkolla profesionale “Hysen Cela” Durrës Shkolla profesionale “Kolin GJOKA” Lezhë	125.000	112.618	90%
TOTAL		125.000	112.618	90%

Paraqitja grafike si më poshtë :

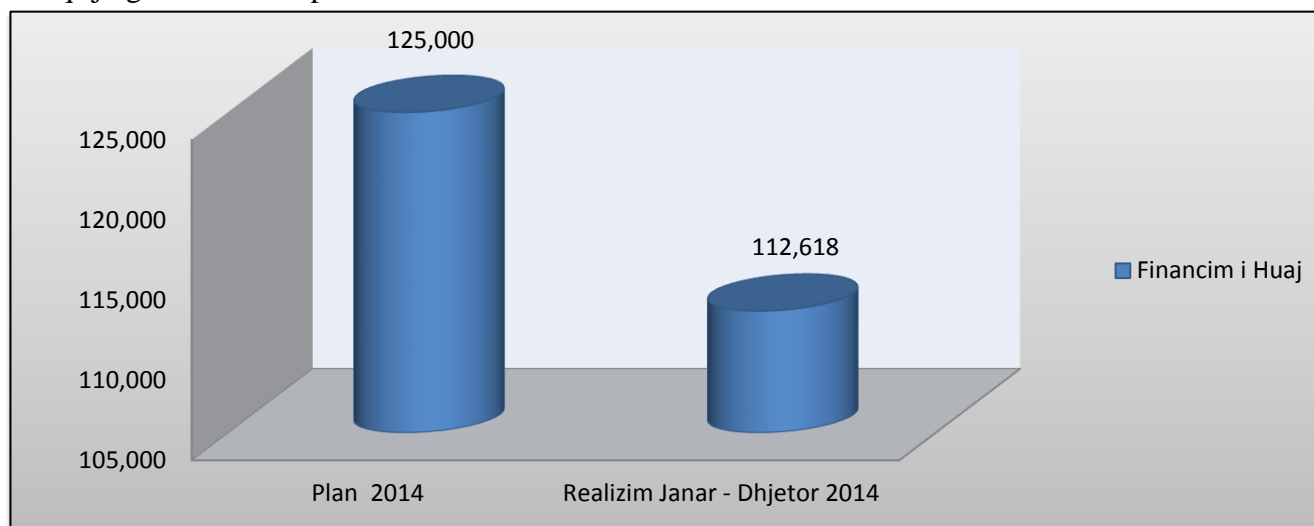

MINISTRIA E KULTURËS


Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Brendshëm për Ministrinë e Kulturës dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E KULTURËS

PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI
Arti dhe Kultura	Cirku Kombetar - Blerje Pajisje	2.000	1.907	95,35%	Diference Tenderi
Arti dhe Kultura	Rikonstruksioni i tualeteve të BK	737	737	100,00%	263 zbritur me aktin normativ
Arti dhe Kultura	Blerje paisje	1.000	997	99,70%	Likuiduar 100%
Arti dhe Kultura	Bibloteka Kombetare. Blerje paisje	22.881	22.049	96,36%	Diference Tenderi
Arti dhe Kultura	Galeria e Arteve - Blerje paisje	500	490	98,00%	Likuiduar 100%
Arti dhe Kultura	Rikonstruksion i ndërtesës	2.000	2.000	100,00%	Likuiduar 100%
Arti dhe Kultura	Paisje (kompjuteri dhe printera)	1.000	960	96,00%	Likuiduar 100%
Arti dhe Kultura	Teatri Kombetar I Komedise - Rikonstruksion	6.000	6.000	100,00%	1000, celur me Aktin Normativ nr.2 dt 29.12.2014
Arti dhe Kultura	Rikonstruksion ndertese	1.680	1.632	97,14%	Likuiduar 100%
Arti dhe Kultura	Teatri Kombetar - Blerje Pajisje	1.736	1.735	99,94%	Likuiduar 100%
Arti dhe Kultura	Qendra per mbrojtjen dhe promovimin e Kultures	23.819	23.819	100,00%	Likuiduar 100%
Arti dhe Kultura	Bashkia Kavaje	10.022	6.836	68,21%	Celur nga Detyrimet e prapambetura
Arti dhe Kultura	Komuna Markat Varrezat monumentale te shqi. Te camerise ne Killoqer	32.946	32.946	100,00%	Likuiduar 100%
Arti dhe Kultura	Rikonstruksion I Pallatit te Kultures Memaliaj	538	538	100,00%	Celur nga Detyrimet e prapambetura
Arti dhe Kultura	Bashkia Kamez- Blerje Pajisje	15.951	15.951	100,00%	Celur nga Detyrimet e prapambetura
Arti dhe Kultura	Ndertimi I Qendres Kulturore Kruje	33.533	33.533	100,00%	Celur nga Detyrimet e prapambetura
Arti dhe Kultura	Arti dhe Kultura	400	400	100,00%	Celur nga Detyrimet
Arti dhe Kultura	Arti dhe Kultura	27	0	0,00%	Celur nga Detyrimet e

					prapambetura
Arti dhe Kultura	Rikonstruksion ndertese	542	542	100,00%	Celur nga Detyrimet e prapambetura
Arti dhe Kultura	Likujdimi I Fatures Monum.Kongr.Lushnjes	2.059	0	0,00%	Celur me Aktin Normativ
Trashegimia Kulturore dhe Muzete	Trashegimia Kulturore dhe Muzete	912	912	100,00%	Likuiduar 100%
Trashegimia Kulturore dhe Muzete	Studim, Projektim Muzeu Arkeologjik Durres	312	312	100,00%	Likuiduar 100%
Trashegimia Kulturore dhe Muzete	Blerje pajisje Muzeu Arkeologjik Durres	3.122	3.119	99,90%	Likuiduar 100%
Trashegimia Kulturore dhe Muzete	Rikonstruksion Muzeu Arkeologjik Durres	14.015	13.985	99,79%	Likuiduar 100%
Trashegimia Kulturore dhe Muzete	Nderhyrje rehabilituese prane Universitetit Politeknik Tirane	8.443	8.401	99,50%	Likuiduar 100%
Trashegimia Kulturore dhe Muzete	Restaurimi I Kishes se Shen Spiridhonit Vlore	4.465	4.188	93,80%	zbritur 1010 me aktin normativ
Trashegimia Kulturore dhe Muzete	TVSH - IPA Qendra Historike II	15.218	15.083	99,11%	zbritur 3993 me aktin normativ
Trashegimia Kulturore dhe Muzete	TVSH- UNDP UNESCO	7.609	7.609	100,00%	Likuiduar 100%
Trashegimia Kulturore dhe Muzete	Restaurimi i Kishes Ristozit {Mborje}Korce	1.593	978	61,39%	Likuiduar 100%
Trashegimia Kulturore dhe Muzete	Pastrimi i Fasadave dhe godinave rreth shehsit Nene Tereza	57.947	57.946	100,00%	Likuiduar 100%
Trashegimia Kulturore dhe Muzete	Rikostruksion MHK	48.920	46.100	94,24%	Diference Tenderi
Trashegimia Kulturore dhe Muzete	Rehabilitimi I Pallatit te Kongreseve	38.436	38.371	99,83%	Likuiduar 100%
Trashegimia Kulturore dhe Muzete	Studim projektim "Rehabilitimi I Pallatit te Kongreseve"	522	522	100,00%	Likuiduar 100%
Trashegimia Kulturore dhe Muzete	Blerje Paisje	4.700	4.336	92,26%	Diference Tenderi
Planifikim, Menaxhim, Administrim	Blerje Paisje	6.315	5.555	87,97%	Diference Tenderi
TOTAL		371.900	360.489	97%	

Paraqitja grafike si më poshtë :

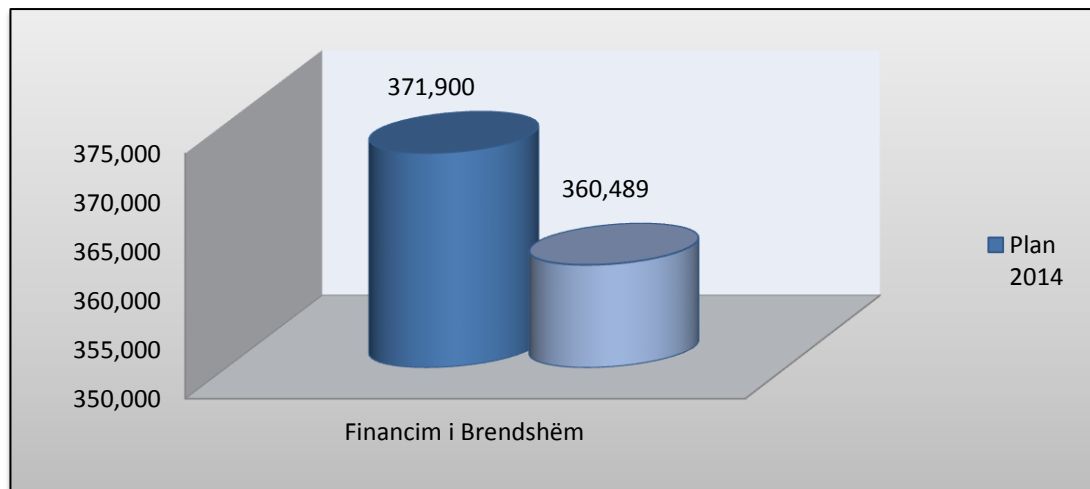

MINISTRIA E DREJTËSISË


Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Brendshëm për Ministrinë e Drejtësisë dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E DREJTËSISË					
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI
Planifikim, Menaxhim Administrim	Mirembajteje dhe zhvillim i sistemit ICMIS (kontrata ne vazhdim dhe shtrirja e sistemit ne gjykatat administrative)	16.895	16.895	100%	Realizuar
Planifikim, Menaxhim Administrim	Pajisje elektronike, kompjuterike per MD	1.566	1.565	100%	Realizuar
Planifikim, Menaxhim Administrim	Rikonstruksion i zyres se arkiv-protokollit per MD	2.285	1.440	63%	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Blerje pajisje zyre	1.000	977	98%	Realizuar
Planifikim, Menaxhim Administrim	Pershtatje dhe Rikonstruksion I ambjenteve te depos nr. 5 ne Lunder per Arkiven Gjyqesore	39.302	29.147	74%	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Mbikqyrja elektronike ne fushen penale	60.000	59.868	100%	Realizuar
Planifikim, Menaxhim Administrim	Dixhitalizimi I regjistrimit te noterise dhe lidhja online me Sherbimin e Regjistrimit te Pasurise	2.607	2.587	99%	Realizuar
Planifikim, Menaxhim Administrim	Kosto lokale per ndertimin e 3 burgjeve dhe p/burgimeve te reja	282.842	252.899	89%	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Kosto lokale per misionin euralius	4.000	394	10%	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Blerje Pajisje Zyre (Sherbimi Proves)	1.666	1.201	72%	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Blerje Pajisje kompjuterike (Sherbimi Proves)	5.347	512	10%	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Sistemi I kamerave ne godinen e MD	10.000	9.881	99%	Realizuar

Planifikim, Menaxhim Administrim	Dixhitalizimi I arkives se dosjeve te trajtimit te kerkesave per demshperblim te perndjekurve politike	10.000	0	0%	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Rikonstruksione te ambjenteve ne godinen e MD	8.250	6.758	82%	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Pajisje zyre e mobilimi per ambjentet e rikonstruktura	4.248	431	10%	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Blerje pajisje printimi dixhitale	14.000	13.860	99%	Realizuar
Planifikim, Menaxhim Administrim	Sistemi i monitorimit mediatik online	480	466	97%	
Planifikim, Menaxhim Administrim	T V SH, detyrim doganor per "Ndertimi i burgjeve dhe paraburgimeve te reja"	310.250	226.972	73%	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Rikonstruksion i godines se Burgut 313	70.000	69.934	100%	Realizuar
Planifikim, Menaxhim Administrim	Sistemi i ngrohjes qendrore te godines MD	3.353	240	7%	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Sistemi i ashensoreve te MD	480	450	94%	Realizuar
Planifikim, Menaxhim Administrim	Pajisje kompjuterike Avokatura e Shtetit	200	198	99%	Realizuar
Planifikim, Menaxhim Administrim	Pajisje A.M.Falimentit	200	161	81%	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Blerje pajisje zyre Avokatura e Shtetit	300	300	100%	Realizuar
Planifikim, Menaxhim Administrim	Pajisje A.M.Falimentit	300	234	78%	
Planifikim, Menaxhim Administrim	Blerje pajisje per policine e burgjeve	80.000	79.776	100%	Realizuar
Qendra e Botimeve Zyrtare	Blerje pajisje kompjuterike.	100	98	98%	Realizuar
Mjekesia Ligjore	Rikonstruksion i ndertesave te morgut ne Tirane e rrethe	3.679	3.667	100%	Realizuar
Mjekesia Ligjore	Shtrirja e menaxhimit te ceshtjeve ne rang kombetar	1.059	1.059	100%	Realizuar

Mjekesia Ligjore	Blerje pajisje	578	577	100%	Realizuar
Mjekesia Ligjore	Blerje kondicionere	300	294	98%	Realizuar
Mjekesia Ligjore	Ndertimi i dhomes se arkives	2.148	2.138	100%	Realizuar
Mjekesia Ligjore	Blerje pajisje autopsie	2.000	1.998	100%	Realizuar
Mjekesia Ligjore	Blerje pajisje per morgun dhe laboratorin	1.652	1.652	100%	Realizuar
'Sherbimi I Kthimit e kompens. pronave	Rikonstruksion i arkive dhe ambjenteve te AKKP	106	106	100%	Realizuar
'Sherbimi I Kthimit e kompens. pronave	Instalim rrjeti hidraulik	81	81	100%	Realizuar
'Sherbimi I Kthimit e kompens. pronave	Blerje pajisje elektronike	194	194	100%	Realizuar
'Sherbimi I Kthimit e kompens. pronave	Instalim i sistemit te alarmit ne ambjentet e AKKP	780	0	0%	
'Sherbimi per ceshtjet Biresimeve	Blerje pajisje elektronike	200	151	76%	
Sherbimi permbarimor	Blerje pajisje kompjuterike	480	437	91%	Realizuar
Sherbimi permbarimor	Blerje orendi zyre	480	443	92%	Realizuar
Sherbimi permbarimor	Blerje pajisje te tjera zyre	40	35	88%	
Sherbimi permbarimor	Blerje pajisje kompjuterike	6.500	356	5%	Blerje e perqendruar
Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve	Pajisje per sistemin e burgjeve	10.000	8.336	83%	ne proces kolaudimi
Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve	Përmiresimi i kushteve fizike të jetesës, nëpërmjet përmirësimit të përgjithshëm të infrastruktures	4.272	3.659	86%	ne proces lidhje kontrate
Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve	Studim Projektme	3.000	3.000	100%	Realizuar
TOTAL		967.220	805.427	83%	

Paraqitja grafike si më poshtë :

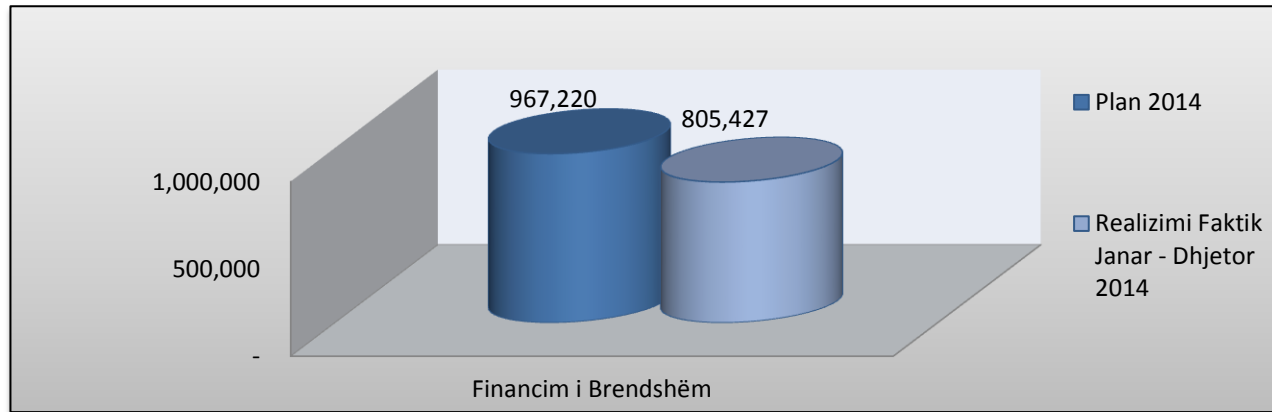


Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmblodhur të investimeve me financim të Huaj për Ministrinë e Drejtësisë dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014

MINISTRIA E DREJTËSISË					
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI
Planifikim, Menaxhim Administrim	Ndërtimi i Paraburgimit te burgut Shkodër	300.000	334,251	111%	Mendohet se deri në fund të vitit do të ketë disbursime të tjera dhe do të ndikojnë në rritjen e % së realizimit faktik. Nuk ka problematika që pengojnë ecurinë e projektit.
Planifikim, Menaxhim Administrim	Ndërtimi i Paraburgimit dhe burgut Fier	400.000	398,690	99.6%	Mendohet se deri në fund të vitit do të ketë disbursime të tjera që do të ndikojnë në rritjen % së realizimit faktik. Projekti është në perfundim të punimeve. Nuk ka problematika që pengojnë ecurinë e tij.
Planifikim, Menaxhim Administrim	Ndërtimi i Paraburgimit Berat	50.000	48,511	97%	Projekti ka përfunduar. Mendohet se deri në fund të vitit do të kete disbursime te tjera. Problematikat qe ka pasur gjatë ecurisë se tij janë zgjidhur plotësisht dhe pritjet që së shpejti të vihet në funksionim të plotë.

Planifikim, Menaxhim Administrim	Projekti I Administrimit dhe Menaxhimit të tokës komponenti A	267,000	642,157	240%	Realizuar
TOTAL		1,017,000	1,423,609	140%	

Paraqitja grafike si më poshtë :

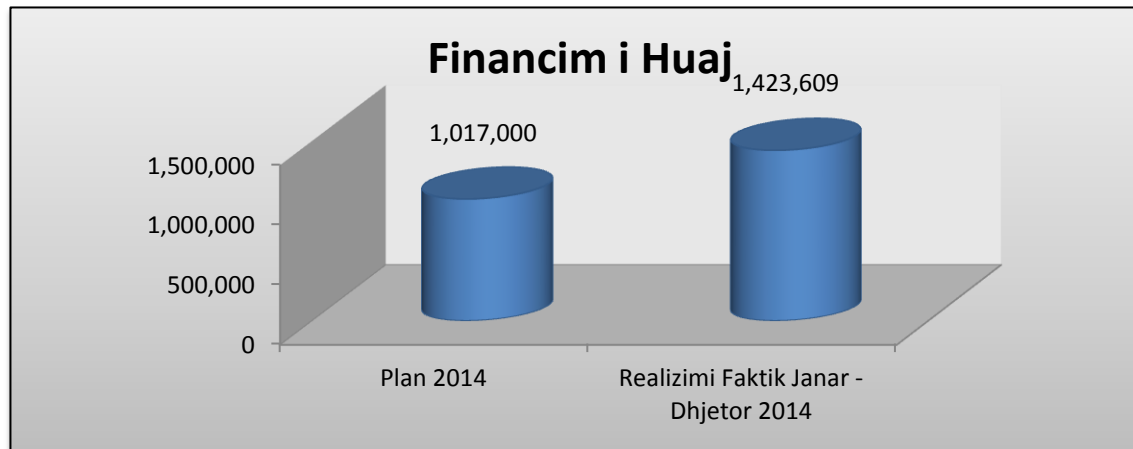


MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME

Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Brendshëm për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME					
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI
Planifikim, Menaxhim, Administrim	Blerje pajisje zyre	6.000	5.976	100%	Realizuar
Planifikim, Menaxhim, Administrim	Blerje pajisje kompjuterike	3.000	1.043	35%	
Mbështetje diplomatike jashtë shtetit	Blerje pajise zyre dhe apartamentesh për përfaqësitë diplomatike	5.000	5.000	100%	Realizuar
Mbështetje diplomatike jashtë shtetit	Blerje pajisje kompjuterike për përfaqësitë diplomatike	4.000	4.000	100%	Realizuar
Mbështetje diplomatike jashtë shtetit	Blerje automjete për përfaqësitë diplomatike	50.000	50.000	100%	Realizuar
TOTAL		68.000	66.019	97%	

Paraqitja grafike si më poshtë :

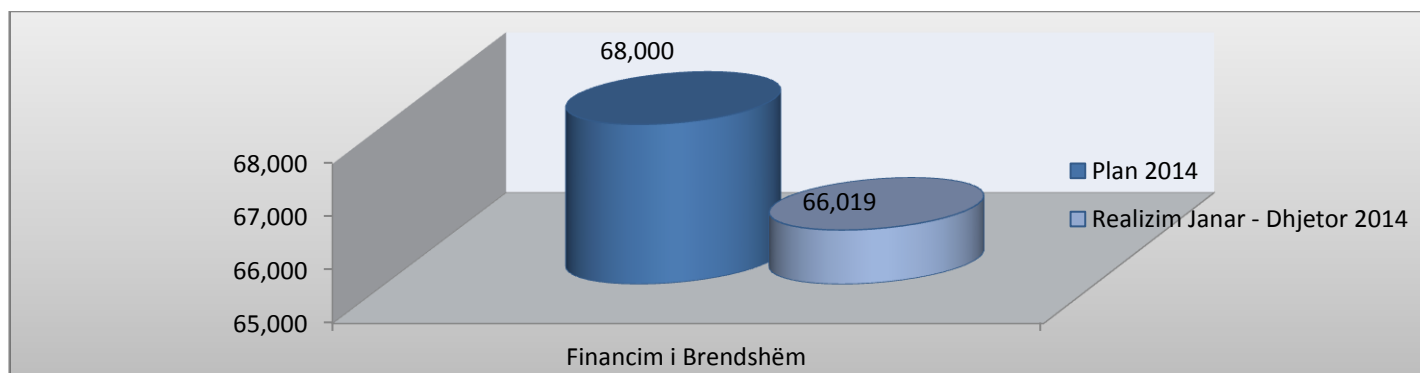

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME


Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Brendshëm për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe realizmin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME						
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI	
Planifikim Menaxhimi	Blerje paisje për Ministrinë e Punëve të Brendshme	3.231	3.231	100%	Realizuar	
Planifikim Menaxhimi	Rikonstruksion i tarraces se arkivit të Ministrisë se Punëve të Brendshme	1.332	0	0%	Eshte nenshkruar kontrata dhe eshte paraqitur si obligim ne fund te vitit 2014.	
Planifikim Menaxhimi	Rikonstr.çatise se mag.pjeseve kembimit QSHAMT	4.945	4.944	100%	Realizuar	
Planifikim Menaxhimi	Zhdoganim i dy automjeteve ne QSHAMT	100	100	100%	Realizuar	
Planifikim Menaxhimi	Rikonstr.çatise se ofiçinës nr.1 QSHAMT	5.986	5.980	100%	Realizuar	
Planifikim Menaxhimi	Rikonstr.çatise se ofiçinës nr.2 QSHAMT	3.516	3.516	100%	Realizuar	
Planifikim Menaxhimi	Blerje pajisje për SH.K.B	5.287	5.287	100%	Realizuar	
Planifikim Menaxhimi	Blerje mjete transporti për SH.K.B	382	382	100%	Realizuar	
Gjendja Civile	Blerje pajisje (printera, kompjutera, hardëare)	8.583	8.583	100%	Realizuar	
Gjendja Civile	Rinovim i licensave te RKGJC dhe RKA	27.600	22.080	80%	Eshte nenshkruar kontrata dhe eshte paraqitur si obligim ne fund te vitit 2014.	
Rezervat e Shtetit	Blerje mallra rezerve shteti	6.000	5.999	100%	Realizuar	
Prefekturat	Paisje zyresh per institucionet e Prefektit	9.448	8.692	92%	Realizuar	
Emergjencat Civile	Projekti "ADRIARadNet"	7.290	7.288	100%	Realizuar	
Emergjencat Civile	Projekti "ADRIARadNet"	4.270	4.270	100%	Realizuar	
Emergjencat Civile	Perballimi Zbutja e Rrezikut te	1.566	1.566	100%	Realizuar	

Fatkeqesive					
Policia e Shtetit	Rikonstruksion i godinave te ish Repartit NSH Dragot-Fier	4.625	4.617	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Pagese supervizori per Rikonstruksion i godinave te ish Rep. NSH Dragot	95	95	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Pagese kolaudatori per Rikonstruksion i godinave te ish Rep. NSH Dragot	15	15	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Blerje mjete transporti (QFMT)	354.282	354.282	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Rik.Repartit Renea (poligon, palestra, mence)	142.449	142.449	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Pagese supervizori per Rik.Repartit Renea (poligon, palestra, mence)	2.000	2.000	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Ndertim i Komisarariatit NSH Tirane	205.794	205.794	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Pagese leje ndertimi per Ndertimin e Komisarariatit NSH Tirane	18.015	18.015	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Pagese supevizori per projektin "Ndertim i Komisarariatit NSH Tirane"	2.130	2.130	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Ndertim-Rik.ambjenteve ne DPQ Fier (proj.vazhdim)	592	592	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Pajisje e Orendi zyresh	7.104	7.104	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Blerje paisje per Policine Shkenc	1.811	1.811	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Pajisje speciale per Pol Rrugore	4.268	4.268	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Blerje Armatime (Renea)	14.861	14.861	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Blerje pajisje per Policine e Rendit	7.734	7.734	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Paisje per kompletimin e PKK Hani i Hotitt (Bashkefinancim)	6.895	6.895	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Ndertim I Linjave TL PKK Shishtavec, Orgjost, Sopik, Rips	2.385	2.385	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Blerje paisje speciale per Pol. kufitare	9.900	9.900	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Mobilim i ambienteve te rikonstruktura ne QFP	48.455	48.440	100%	Realizuar

(Bashkefinancim)					
Policia e Shtetit	Sistemi i transmetimit te te dhenave DATACOM	83.016	83.016	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Blerje pajisje kompjuterike	10.752	10.752	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Blerje pajisje radio Komunikimi	41.776	41.776	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Ndërtim i godines se Mbrojtjes se Deshmitareve	251	251	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Pagese kolaudatori per Ndërtim i godines se Mbrojtjes se Deshmitareve	300	300	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	Blerje paisje per Policine Kriminale	20.536	20.536	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	TVSH Misioni i Asistences PAMECA IV	2.295	2.294	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	TVSH Programi Policimit ne Komunitet	2.313	2.313	100%	Realizuar
Policia e Shtetit	TVSH Rinovimi i QFP	37.499	37.499	100%	Realizuar
Garda e Republikes	Rikonstruksion i Komandës së Gardës	54.916	54.775	100%	Realizuar
Garda e Republikes	Kolaudim punimesh per Rikonstruksion Gardës	141	141	100%	Realizuar
Garda e Republikes	Modernizimi i Sherbimit te Nderlidhjes	8.795	8.795	100%	Realizuar
Garda e Republikes	Blerje e pistoletave per sherbimin e armatimit	6.995	6.995	100%	Realizuar
Garda e Republikes	Blerje orendi e pajisje	5.546	5.202	94%	Realizuar
Garda e Republikes	Modernizim i sherbimit xhenio kimi	7.389	7.389	100%	Realizuar
TOTAL		1.205.466	1.197.339	99%	


Paraqitja grafike si më poshtë :



Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmblodhur të investimeve me financim të Huaj për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014

MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME					
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI
Emergjencat Civile	Projekti "ADRIARadNet"	23.000	10.876	47,3%	Realizuar pjeserisht.
Policia e Shtetit	Misioni i Asistences së KE Pameca IV (IPA 2012)	168.388	168.388	100%	Realizuar.
	Prefekturat	0	4.295		
TOTAL		191.388	183.388	96%	

Paraqitja grafike si më poshtë :

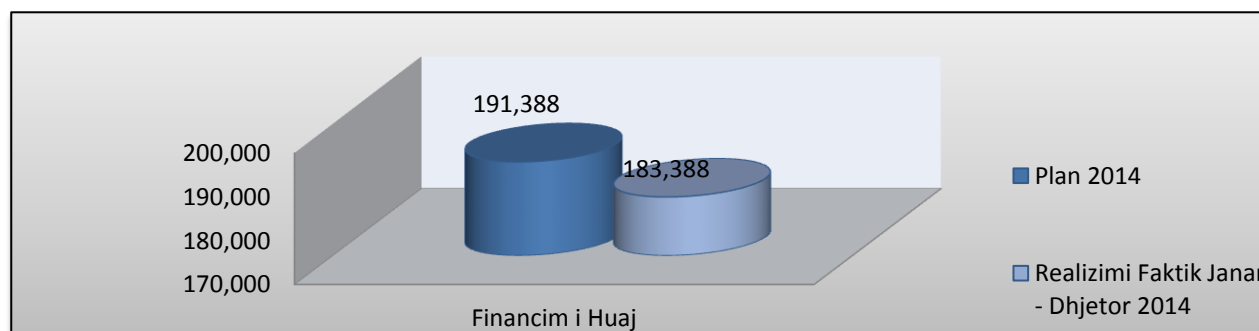


MINISTRIA E MBROJTJES

Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Brendshëm për Ministrinë e Mbrojtjes si dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E MROJTJES					
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI
Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi në MM	Sistemi Automatizimit të shpenzimeve në MM	2.500	2.450	98%	Projekti përfunduar per vitin 2014
F.Luftimit (Reparti Ushtarak 1001 Tiranë)	Blerje armatimi, municioni, pajisje dhe makineri per Forcat e Armatosura	700.000	700.000	100%	Projekti përfunduar per vitin 2014 sipas kontratave te meposhtme:
F.Luftimit (Reparti Ushtarak 3001 Tiranë)	Blerje Helikopteri Trasporti Shumërolësh	1.463.871	1.463.871	100%	Projekti përfunduar per vitin 2014
F.Luftimit (Reparti Ushtarak 3001 Tiranë)	TVSH dhe Taksa Doganore Helikopterit	918.668	918.668	100%	Paguar detyrimet e prapambetura, dhe TVSH-në e helikopterit TTH2 mberritur ne muajin tetor 2014.
M.Luftimit (Reparti Ushtarak 6004 Tiranë)	Rikonstruksion ESKU, Tiranë	49.800	49.257	100%	Projekti përfunduar per vitin 2014
Arsimimi Ushtarak 5001 Tiranë	Përshtatje të Ambjenteve të punës dhe kompletim me pajisje	240	240	100%	Projekti shlyer me fondet të akorduara si detyrime të prapambetura
Reparti Ushtarak 7001 Tiranë	Pajisje për Brigadën e Mbështetjes Rajonale	32.000	5.760	18%	Projekti nuk u mbyll per arsye te voneses ne dorëzimin e borepastruesit
TOTAL		3.167.079	3.140.246	99%	

Më poshtë paraqitja grafike e realizimit faktik për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm për periudhën Janar - Dhjetor 2014 :

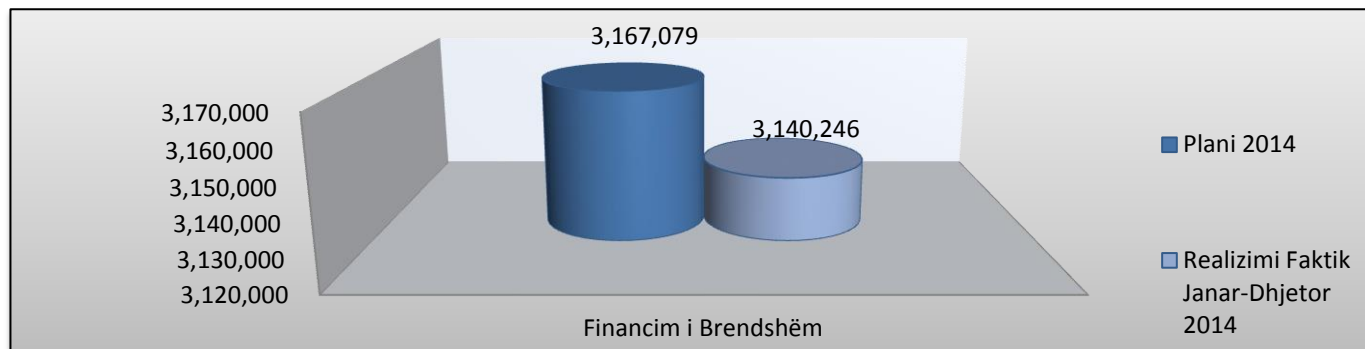


MINISTRIA E MIRËQËNIES SOCIALE DHE RINISË

Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Brendshëm për Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E MIRËQËNIES SOCIALE DHE RINISË					
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI
01110 "Planifikim, Menaxhim, Administrim"	Diference rikonstruksioni	929	928	99,90%	Realizuar
01110 "Planifikim, Menaxhim, Administrim"	Blerje paisje zyresh	8.500	0	0,00%	Kontrata eshte lidhur, per vleren 8.441.520 leke, por malli ka ardhur pjesor pasi perfundoi viti buxhetor. Malli vjen nga jashte vendit dhe per efekt te bllokimit te rrugeve do merret ne vitin 2015.
01110 "Planifikim, Menaxhim, Administrim"	Rinovim zyresh	3.100	3.043	98,18%	Diference tenderi
01110 "Planifikim, Menaxhim, Administrim"	Studime projektive	732	732	100,00%	Realizuar
10430 "Perkujdesi Social"	Rikonstruksion godine	6.496	6.450	99,30%	Realizuar
10430 "Perkujdesi Social"	Rikonstruksion godine	2.076	2.200	105,97%	Realizuar
10550 "Punesim, Arsim, Formim Profesional"	Blerje kabinete per Qendrat e Formimit Profesional	20.000	19.863	99,32%	Realizuar
10550 "Punesim, Arsim, Formim Profesional"	Rikonstruksion Zyrat e Punesimit	4.500	4.715	104,79%	Realizuar
10550 "Punesim, Arsim, Formim Profesional"	Investime nga te ardhurat e realizuara	4.500	4.782	106,27%	Realizuar
10460 "Perfshirja	Rikonstruksion Qendra	6.000	6.000	100,00%	Realizuar

Sociale"	Rinore, Tirane				
10460 "Perfshirja Sociale"	Kosto Lokale - Mbeshtetja e perfshirjes sociale te komuniteteve Rome dhe egjyptiane	362	362	100,00%	Realizuar
10460 "Perfshirja Sociale"	TVSH - Mbeshtetja e perfshirjes sociale te komuniteteve Rome dhe egjyptiane	5.938	5.938	100,00%	Realizuar
04170 "Inspektimi ne Pune"	Blerje softje informatike	519	519	99,90%	Realizuar
04170 "Inspektimi ne Pune"	Blerje automjetesh	1.480	1.462	0,00%	Diference tenderi
08480 "Mbeshtetje per Kultet Fetare"	Blerje paisje zyresh	830	751	98,18%	Diference tenderi
08480 "Mbeshtetje per Kultet Fetare"	Transferime kapitale "objekti "Odeon"	169.000	169.000	100,00%	Realizuar
01190 "Rehabilitimi I te Perndjekurve Poltike"	Blerje paisje elektronike	97	96	99,30%	
TOTAL		235.060	226.846	97%	


Paraqitja grafike si më poshtë:



Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Huaj për Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014

MINISTRIA E MIREQENIES SOCIALE DHE RINISE					
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI
Përkujdesi Social	Modernizimi i asistencës sociale	44.000	41.897	95%	Realizimi i disbursimeve është duke u bërë sipas afateve të përcaktuara në marrëveshje. Deri në fund të vitit realizimi parashikohet të jete 52.9%.
Përfshirja Sociale	Mbështetja e përfshirjes sociale të komuniteteve Rome dhe egjyptiane	112.350	112.350	100%	Realizimi i pritshëm sipas raportimit nga UNDP është 100%.
TOTALI		156.350	154.247	99%	

Paraqitja grafike si më poshtë :




MINISTRIA E MJEDISIT

Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Brendshëm për Ministrinë e Mjedisit si dhe realizmin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E MJEDISIT						
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI	
Planif, Menaxh. Admin	Orendi paisje	3.000	733	24%	Fondi ishte planifikuar per blerje pajisje per godinen e re ATSH, duke gene se nuk kaluam ne godinene re dhe blerjet nuk u kryen	
Planif, Menaxh. Admin	Rikonstruksioni i godines	2.563	0	0%	Nuk u arrit ne kohe te perfundonin punimet brenda vitit 2014	
Mbrojtja e Mjedisit	Rikonstruksioni i godines Inspektoriati	6.000	5.920	99%	Projekti ka perfunduar.	
Mbrojtja e Mjedisit	Ozoni					
Mbrojtja e Mjedisit	Menaxhimi i Zonave te Mbrojtura Bregdetare	8.250	8.250	100%		
Mbrojtja e Mjedisit	Transform i tregut per panelet diellore	7.835	7.835	100%		
Mbrojtja e Mjedisit	Parku biosferik i Prespes	6.750	6.750	100%		
Mbrojtja e Mjedisit	Ndertimi i kapaciteteve biosiguria	5.153	5.056	98%		
Mbrojtja e Mjedisit	Rishikimi i Strategjise se Biodiversitetit	1.200	1.177	98%		
Mbrojtja e Mjedisit	Forcimi i kapaciteteve MMPAU per hart. Zbat legjislacioni	14.000	14.000	100%		
Mbrojtja e Mjedisit	Kosto lokale IPA - 2013					
Mbrojtja e Mjedisit	Kosto lokale - Loc Sea South East Europe	4.216	3.749	89%		
Mbrojtja e Mjedisit	Kosto lokale ECOSEA	2.660	2.660	100%		
Mbrojtja e Mjedisit	Shkreteterizimi	525	525	100%		
Mbrojtja e Mjedisit	MIELSH	1.499	1.499	100%		
Mbrojtja e Mjedisit	T.V.Sh. Parku Biosferik i Prespes	7.274	7.274	100%		
Mbrojtja e Mjedisit	Forcimi i kapaciteteve MMPAU per hart. Zbat legjislacioni	4.575	4.575	100%		
Mbrojtja e Mjedisit	Adriatic IPA, Komuna Bushat	458	458	100%		
Mbrojtja e Mjedisit	Pagese TVSH per pajisjet monitoruese	550	454	83%		
Administrimi i Ujerve	Kosto lokale - Burimet ujore dhe ujitja	600	404	67%		

Administrimi i Ujerve	TVSH Burimet ujore dhe ujitja	12.000	11.671	97%	
Administrimi i Pyjeve	FZHR Pyllezim	80.000	80.000	100%	Fondi iu shpernda komuna perfituese
Administrimi i Pyjeve	Gjelberimi i rruges Rinas	60.000	52.581	88%	Fillon kete muaj likujdimi
Administrimi i Pyjeve	K.Lokale Projekti i permiresimit te administrimit te burimeve natyrore, SIDA TF 011576	4.896	4.691	96%	
Administrimi i Pyjeve	K. Lokale e prapambetur - projekti Zhvillimi i burimeve natyrore	14.701	14.701	100%	
Administrimi i Pyjeve	TVSH (e prapambetur) -Projekti zhvillimi i burimeve natyrore	12.822	4.418	34%	
Administrimi i Pyjeve	ZM Dajt, Kune - Vain, Karavasta, Lure, Velipoje,	51.600	50.538	98%	
Administrimi i Pyjeve	Gjelberimi i rruges Rinas	30.000	29.495	98%	
Administrimi i Pyjeve	Pyllezim DSHP Elbasan	43.000	31.269	73%	Po vazhdohet te te likujdohet.
Administrimi i Pyjeve	Pyllezim DSHP Berat	6.000	2.462	41%	Ne Berat ka patur probleme me komunitetin per investimin dhe loti I dyte nisi ne muajin Dhjetor dhe nuk pati kohe te perfundonte
Administrimi i Pyjeve	Pyllezim DSHP Diber	7.797	0	0%	kane filluar punimet dhe ne muajin Nentor dhe nuk arriti te asnje likujdim .
Administrimi i Pyjeve	Pyllezim dhe Reabilitim DSHP Lezhe	36.000	33.554	93%	.
Administrimi i Pyjeve	Reabilitim, pyllezim Kodra e Currilave	245.000	241.198	98%	
Administrimi i Pyjeve	Supervizim I punimeve Kodra e Currilave	982	982	100%	
TOTAL		681.906	628.897	92%	

Paraqitja grafike si më poshtë:

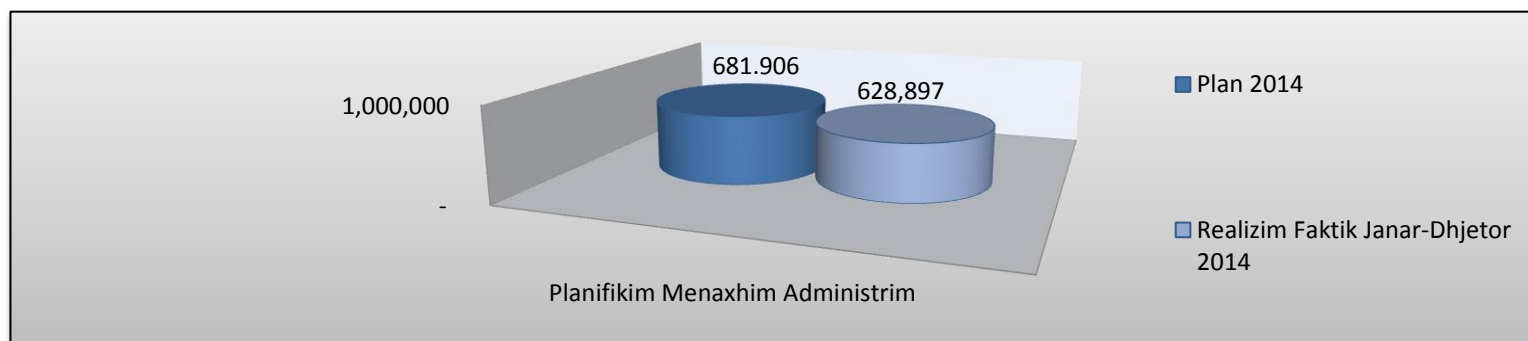


Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Huaj për Ministrinë e Mjedisit si dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E MJEDISIT					
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI
Mbrojtja e Mjedisit	Projekt ozoni forcim instituc	4,000	2.827	70.68%	Projekti ka perfunduar.
Mbrojtja e Mjedisit	Transform i tregut për panelet diellore	15,274	15.274	100.00%	Nuk ka problematika
Mbrojtja e Mjedisit	Rezervati ndërkufitar i Prespës	49,901	35.175	86%	Krijimi i administrates se pavarur te parkut kombetar te prespes sipas planit te menaxhimit te miratuar.
Mbrojtja e Mjedisit	Menaxhimi i zonave te mbrojtura detare & bregdetare	29,263	28,324	97%	Nuk ka patur probleme
Mbrojtja e Mjedisit	Forcimi i kapaciteteve MMPAU për hart. Zbat legjislacioni	28,000	28.000	100.00%	Projekti ka perfunduar.
Mbrojtja e Mjedisit	Rishikimi i strategjisë së biodiversitetit	7,000	7.000	100.00%	Nuk ka patur problematika
Mbrojtja e Mjedisit	Ndërtimi i kapaciteteve biosiguria	9,504	9.504	100.00%	Nuk ka patur problematika
Mbrojtja e Mjedisit	Komunikimi i tretë kombëtar	19,200	16,422	86%	Nuk ka patur problematika
Mbrojtja e Mjedisit	EKOSEA	14,900	7,481	50.21%	Problematika e hasur per kete projekt eshte se ka patur disbursim me vonese per arsye te procedurave te brendshme institucionale te ndryshimit te strukturave pergjegjese

Mbrojtja e Mjedisit	Sea South East Europe	21,000	7,280	35%	ne MM. Ne lidhje me disbursimin e fondeve nga donatori , si dhe ngritja dhe funksionimi i pcedurave te brendshem te ministrise per menaxhimin e projektit(per arsye te ristrukurimit eshte ribere nomini e grupit te punes)
Administrimi i Ujërave	Burimet ujore dhe ujitja Granti suedez	68,040	52,334	77%	Projekti nuk ka hasur problematika.
Administrimi i Ujërave	Burimet ujore dhe ujitja Kredi	5,000	3,440	69%	Projekti nuk ka hasur problematika.
Administrimi i Pyjeve	Projekti i përmiresimit të administrimit të burimeve natyrore, SIDA TF 011576	50,000	50.000	100.00%	Ka perfunduar.
TOTAL		321,082	263,061	81%	

Paraqitja grafike si më poshtë:

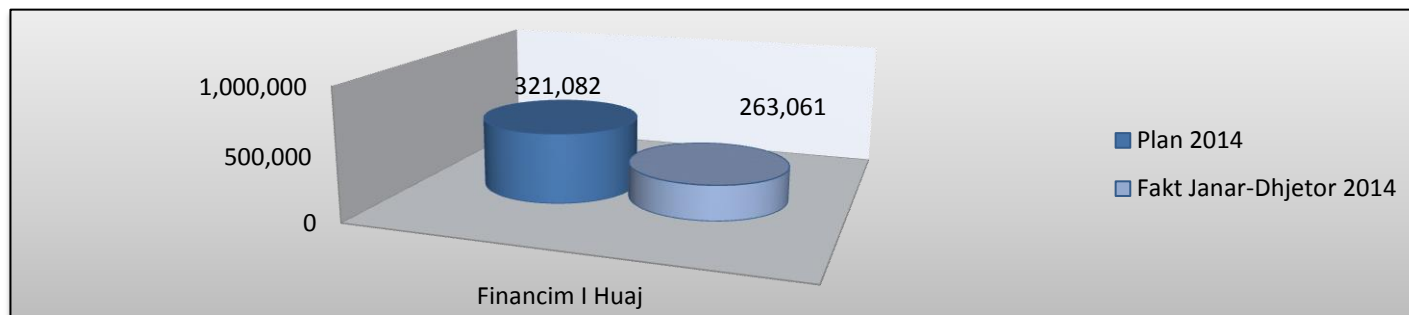


MINISTRIA E INTEGRIMIT EVROPIAN

Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmblëdhur të investimeve me financim të Brendshëm për Ministrinë e Integrimit Evropian dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E INTEGRIMIT EVROPIAN					
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Blerje pajisje zyre	2.000	1.998	100%	Realizuar
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Pajisje elektronike (pajisje kompjuterike)	2.180	2.175	100%	Realizuar
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Kondicioner	307	306	100%	Realizuar
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Programi alpha	63	63	100%	Realizuar
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Karta magnetike per hyrje -dalje ne institucion	480	468	98%	Realizuar
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Aparat fotografik	150	150	100%	Realizuar
Mbështetja Institucionale për Procesin e Integrimit	Kuota bashkefinancimi, kosto lokale	17.740	17.263	97%	Pagesat kryhen në varësi të dokumentave qe paraqiten nga punonjesit e projektve per paga, sigurime shoq. etj. Sistemi I thesarit nuk ka bere zbritjen per 840,000 leke qe kemi derguar me detajimin e pakesimit te planit me aktin normativ ne 30.12.2014
Mbështetja Institucionale për Procesin e Integrimit	TVSH	2.620	2.620	100%	Realizuar
TOTAL		25.540	25.043	98%	

Paraqitja grafike si më poshtë :

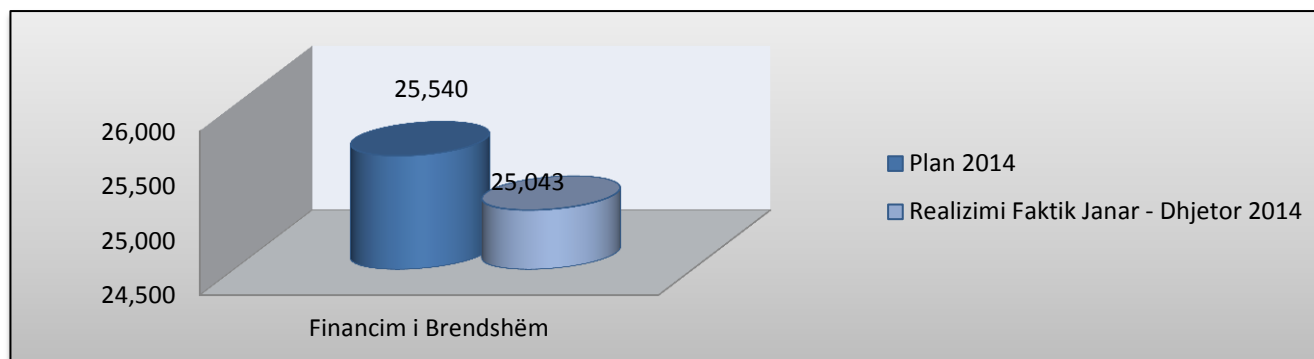


Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmblodhur të investimeve me financim të Huaj për Ministrinë e Integrimit Evropian dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014

MINISTRIA E INTEGRIMIT EVROPIAN						
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI	
Mbështetja Institucionale për Proçesin e Integrimit	Projekti PPF /Asistenca Teknike IPA 2008	55.200	56.560	102.46%	Autoriteti kontraktues është Delegacioni i BE. Pagesat në kuadrin e zbatimit të projektit kryhen nga DBE.	
Mbështetja Institucionale për Proçesin e Integrimit	SMEI -III/Mbeshtetje per Ministrine e Integrimit	42.600	80.492	188.95%	Autoriteti kontraktues për këtë projekt është Delegacioni i BE. Pagesat në kuadrin e zbatimit të projektit kryhen nga DBE. Nuk është marrë informacion nga DBE për statusin aktual të disbursimit/shpenzimeve.	
Mbështetja Institucionale për Proçesin e Integrimit	Asistenca Teknike IPA II CBC Shqiperi-Mali i Zi	14.000	0	0%	Kontrata e grantit për këtë program është mbyllur në Shtator; është lidhur kontrata e re nga e cila për muajt tetor-nëntor nuk është bërë ende asnjë disbursim	
Mbështetja Institucionale për Proçesin e Integrimit	Asistenca Teknike IPA II CBC Greqi-Shqiperi	25.480	16.438	64.51%		
Mbështetja Institucionale për Proçesin e Integrimit	Asistenca Teknike IPA II CBC Shqiperi-Maqedoni	14.000	8.909	63.64%		
Mbështetja Institucionale për Proçesin e Integrimit	Asistenca Teknike IPA II CBC Shqiperi-Kosove	9.800	5.173	52.79%		

Mbështetja Institucionale për Proçesin e Integritit	Asistencë për IPA Adriatic	Teknike	58.940	31.360	53.21%	Duke qënë që jemi zyër kontrolli për projektet IPA Adriatik shpenzimet tona konsistojnë vetëm në paga dhe shpenzime administrative
TOTAL			220.000	198.932	90.41%	

Paraqitja grafike si më poshtë :

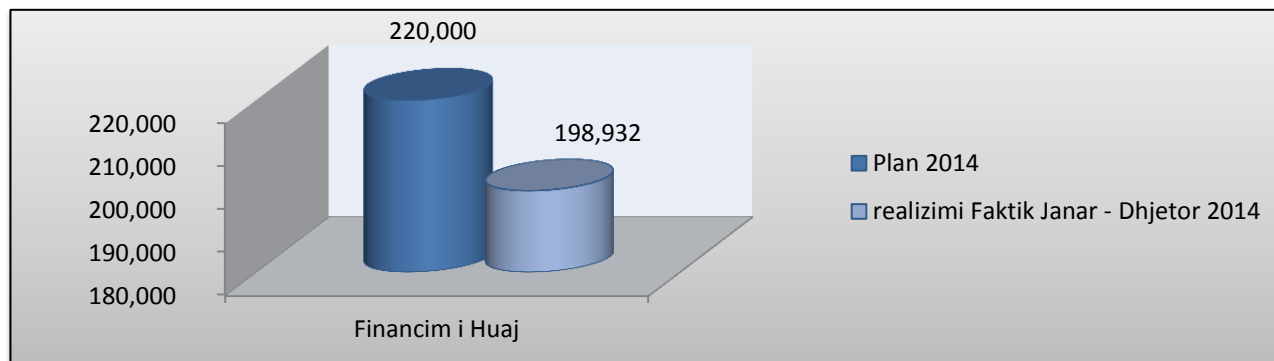

MINISTRIA E ENERGISË DHE INDUSTRIË


Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Brendshëm për Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Nëntor 2014

MINISTRIA E ENERGISË DHE INDUSTRIË				
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB) Mbikqyrja e shfrytëzimit të rezervave minerare	8.000	8.000	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB) Monitorimi I fenomeneve pas shfrytëzimit në minierat e mbyllura	6.500	6.500	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB) Menaxhimi bashkëkohori industrisë minerare nepermjet dixhitalizimit	1.500	1.500	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB) Promovimi I min të rinj (Promovimi dhe vlerësimi kaolinave në vendin tone)	2.000	2.000	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB) Prom min rinj (Zonimi minerar në zbatim të planifikimit dhe dhenjes së lejeve minerare)	2.500	2.500	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB) Monitorimi I kontratave koncensionare për HEC	9.000	9.000	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB) Oponenca teknike për HEC-et e vegjel	500	500	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB) Hartimi I bilancit energjistik vjetor	1.000	1.000	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB) Monitorimi I SKE	1.500	1.500	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB) Studim mbi situatën dhe mundësitë e zgjerimit të përdorimit të energjisë diellore në Shqipëri	500	500	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB) Studimi mbi problematiken e menaxhimit të energjisë në sektorin e ekonomisë shqiptare dhe përmirësimin e këtij treguesine përputhje me kërkesat e BE	500	500	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB) Studim mbi rishikimin e kushteve dhe normave teknike në aktivitetet dhe impiante të prodhimit, depozitimit, transportit dhe tregëtimit të naftës dhe gazit nënprodukt të tyre për arritjen e standarteve të sigurisë në mjedis dhe rehabilitim	1.000	1.000	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB) Monitorimi I parqeve me ertë	250	250	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB) Hartimi I kuadrit rregullator të teknik për tregun	250	250	100%

	e gazit			
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB)Studim mbi fuqizimin e infrastrukures se furnizimit me burime energjitike me baze hidrokarbure	500	500	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB)Rishikimi I kuadrit ligjior per rregjim e mbajtjesdhe menaxhimit te rezervave te sigurisese naftes,gazit dhe nenprodukteve	250	250	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB)Studim I ndikimit ne mjedis nga aktiviteti ne sektorin hidrokarbur	500	500	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB)Monitorimi I zbatimit te kodit energjistik te banesave	500	500	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB)Monitorim i planit te veprimeve te burimeve te rinovueshme dhe eficenses se energjise	250	250	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB)Studime gjeol gjeofizike per ripercak e rezervave te naftes ne perputhje me standartet e BE. Rekomandime konkrete per burime energjitike me baze hidrokarbure	1.000	1.000	100%
Mbeshtetje per Energjine	(FB) Orendi paisje zyre, paisje kompjuterike	763	751	98%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB)Rikonstruksion i godinave dhe ambjenteve të tjera ekzistuese të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar	1.919	1.919	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB)Per mbyllje dhe konservim ndermarrje	41.000	41.000	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB)MBYLLJE KONSERVIM	8.000	8.000	100%
Mbeshtetje per mbikeqyrjen e standarteve teknike te hidrokarbureve dhe minierave	(FB)Mbyllja e minierave dhe galerive te braktisura	22.522	22.321	99%
Mbeshtetje per mbikeqyrjen e standarteve teknike te hidrokarbureve dhe minierave	(FB) Blerja e pajisjeve shpetuese	2.000	1.990	100%
Mbeshtetje per mbikeqyrjen e standarteve teknike te hidrokarbureve dhe minierave	(FB) Rikonstruksion i ambjenteve te palestres	5.218	5.051	97%
Mbeshtetje per mbikeqyrjen e standarteve teknike te hidrokarbureve dhe minierave	(FB) Mbikqyrje (rikonstruksion palestere)	24	24	100%
Mbeshtetje per mbikeqyrjen e standarteve teknike te hidrokarbureve dhe minierave	(FB) Kolaudim (rikonstruksion palestere)	6	6	100%
Mbeshtetje per mbikeqyrjen e standarteve teknike te hidrokarbureve dhe minierave	(FB) Mbikqyrje (mbyllje minierash)	300	293	98%
Mbeshtetje per mbikeqyrjen e standarteve teknike te hidrokarbureve dhe minierave	(FB) Kolaudim (Mbyllje minierash)	42	-	0%

Mbeshtetje per mbikeqyrjen e standarteve teknike te hidrokarbureve dhe minierave	(FB) Automjete per emergjence	-	-	0%
Mbeshtetje per mbikeqyrjen e standarteve teknike te hidrokarbureve dhe minierave	(FB) Automjete per inspektim	-	-	0%
Mbeshtetje per mbikeqyrjen e standarteve teknike te hidrokarbureve dhe minierave	(FB) Paisje orendi	480	477	99%
Mbeshtetje per mbikeqyrjen e standarteve teknike te hidrokarbureve dhe minierave	(FB) Aparatura Laboratori	17.532	17.532	100%
Mbeshtetje per mbikeqyrjen e standarteve teknike te hidrokarbureve dhe minierave	(FB) Rikonstruksin godine	17.488	17.234	99%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	(FB) Ndjekja e procedurave te anetaresimit ne EITI	10.800	10.743	99%
Mbeshtetje per mbikeqyrjen e standarteve teknike te hidrokarbureve dhe minierave	(FB) Paisje zyre dhe kompjuterike	480	455	95%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB) Mbyllje konservim Albkrom	1.000	1.000	100%
Mbeshtetje per Burimet Natyrore	(FB) Mbyllje konservim Albaker	14.000	14.000	100%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	(FB) Rikonstruksion godine	5.300	5.181	98%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	(FB) Blerje pasije zyre dhe paisje informatike	4.300	4.226	98%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	(FB)Alterenergy	16.450	16.450	100%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Projekti TAP	11.200	11.167	100%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	(FB) Agronet	350	-	0%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	(FB) Programi Shqiptar per perdorimin e paneleve diellore PNUD/GEF	57.900	57.826	100%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Rimekembja e sektorit elektroenergjetik (PMU)	5.200	4.612	89%
TOTAL		282.274	280.258	99%

Paraqitja grafike si më poshtë :

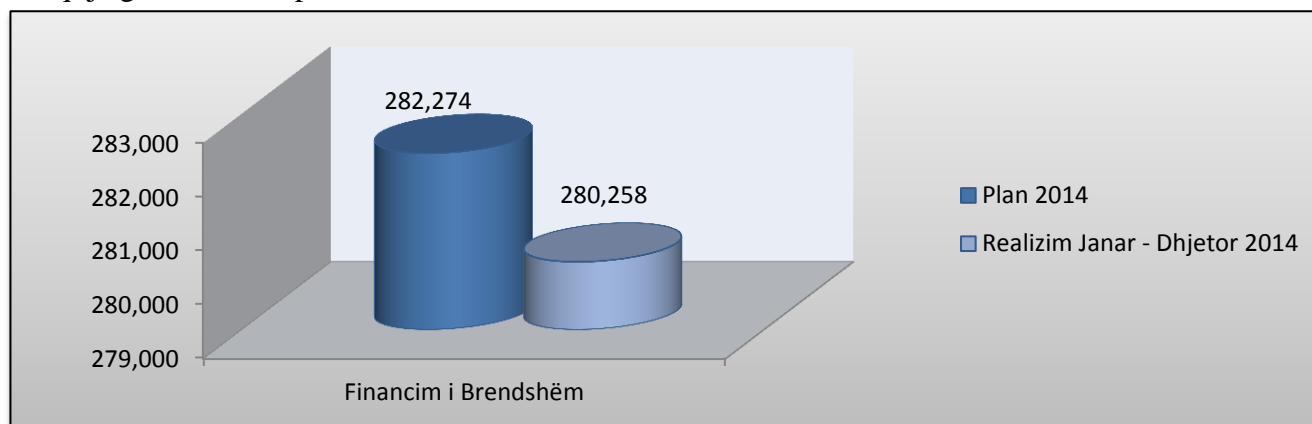


Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Huaj për Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014

MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRIË						
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI	
Planifikim, Menaxhim Administrim	(FH) Ndjeka e procedurave te anetarsimit ne strukturat e EITIT	75.000	9.918	13%	Vonesa ne disbursimet e shumave te projektit nga ana e Lead Partner ne Itali	
Planifikim, Menaxhim Administrim	(FH) Alterenergy	22.355	109.890	100%	Eshte kerkuar shtyrje e afatit te projektit per vitin 2015	
Planifikim, Menaxhim Administrim	(FH) Agronet	1.400	3.303	100%	Projekti eshte mbyllur ne Korrik 2014 nga ana e Lead Partner Itali Contracting Authority i IPA Crossborder eshte kerkuar shtyrja e tij . Mbetemi ne pritje te njoftimit nga ana e IPA	
Planifikim, Menaxhim Administrim	(FH) Sherbime konsulence per Implementimin e Qytetit Studenti No 2 per eficencen e energjise	9.800	0	0%	Disbursimet do te realizohen gjate 6 mujorit te pare te viti 2015 per shkak te vonesave ne amendimin e marrveshjes se financimit nga ana e donatorit KfË.	
Planifikim, Menaxhim Administrim	(FH) Projekti per ngritjen e kapaciteteteve per Zhvillimin e Infrastrukturave te mesha te	3.500	0	0%	Projekti eshte ne proces miratimi te raporteve tremujore	

gazit (TAP) faza I					
Planifikim, Menaxhim Administrim	(FH) Programi Shqiptar per perdorimin e paneleve diellore PNUD/GEF	16.000	19.404	100%	Projekti eshte mbyllur ne vitin 2013 eshte skryer pagesa e TVSH perj 11.167 mln. Leke
Planifikim, Menaxhim Administrim	(FH) Rehabilitim I Qytetit Studenti No 2 (Konsulence)	62.945	31.546	50%	Projekti eshte ne proces realizimi
TOTAL		191.000	174.061	91%	

Paraqitja grafike si më poshtë :

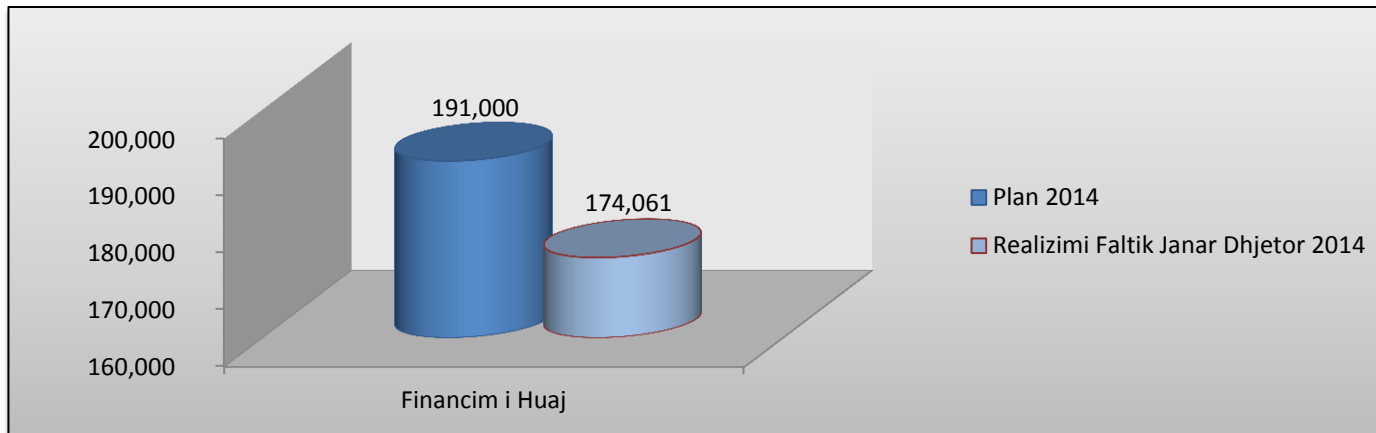

MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN DHE TURIZMIT


Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmblodhur të investimeve me financim të Brendshëm për Ministrinë e Zhvillimit Urban dhe Turizmit dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar –Dhjetor 2014.

MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN DHE TURIZMIT					
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI
Planifikim, menaxhim, administrim	Studimi,Projektimi, Hartimi dhe Miratimi i Planit te Pergjithshem Kombetar	2.694	2.694	100%	Ka perfunduar
Planifikim, menaxhim, administrim	Rikonstruksioni i godines te MZHUT	4.100	4.025	98%	Ka perfunduar
Planifikim, menaxhim, administrim	Blerje pajisje zyre	5.618	5.339	95%	Ka perfunduar
Planifikim, menaxhim, administrim	Blerje pajisje informatike	3.750	3.749	100%	Ka perfunduar
Planifikim, menaxhim, administrim	Studim mbi venddepozitimeve aktuale te mbetjeve te ngurta urbane per gjithe territorin e Shqiperise	384	384	100%	Ka perfunduar
Planifikim, menaxhim, administrim	Blerje Kondicionere	1.306	1.305	100%	Ka perfunduar
Planifikim, menaxhim, administrim	Te tjera pajisje zyre	1.060	1.013	96%	Ka perfunduar
Planifikim, menaxhim, administrim	Ndërhyrje emergjente në lagjen e Romëve në Bashkinë Lezhë	9.500	9.427	99%	Ka perfunduar
Planifikim, menaxhim, administrim	Shpronesime për interes publik, të pasurive të paluajtëshme, pronë private, që preken nga ndertimi I segmentit rrugor Skele- Uji i Ftohtë, Bashika Vlorë	40.000	39.701	99%	Ne shqyrtim
Planifikim, menaxhim, administrim	Shpronesimi I pasurive te paluajtshme prone private qe preken nga ndertimi I segmentit rrugor Lin-Pogradec	185.000	0	0%	Ne shqyrtim
Planifikim, menaxhim, administrim	Blerje pajisje zyre	480	444	93%	Ka perfunduar
Planifikim, menaxhim, administrim	Blerje pajisje elektronike	480	474	99%	Ka perfunduar

Planifikim, menaxhim, administrim	Blerje pajisje per ngrohje	440	430	98%	Ka perfunduar
Planifikim, menaxhim, administrim	Rikonstruksioni i godines te AKB	900	623	69%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Blerje pajisje elektronike	11.833	11.491	97%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Blerje pajisje zyre	1.000	984	98%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Blerje pajisje te tjera zyre	14.880	11.986	81%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Blerje program kompjuterik	480	455	95%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Rikonstruksion tarace	480	432	90%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Blerje e mjeteve te renda	161.760	144.000	89%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Blerje pajisje elektronike	240	227	95%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Rikostruksioni i rrjetit Elektrik dhe godines per Arkivin Qendror Teknik te Ndertimit	1.978	1.891	96%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Studim projektim per rikonstruksionin e godines se AQTN	222	222	100%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Blerje pajisje elektronike	1.825	1.825	100%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Pajisje per Skeleri dhe rafte arkivore per AQTN	925	925	100%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Blerje kondicionere	150	148	99%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Kosto Lokale "Ekspertize per Planifikimin e Territorit".	454	327	72%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	TVSH dhe Takse "Ekspertize per Planifikimin e Territorit".	1.000	998	100%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Blerje pajisje zyre	480	402	84%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Blerje pajisje elektronike	3.556	2.677	75%	Ka perfunduar

Planifikimi Urban dhe Strehimi	Rikonstruksion i rrjetit hidraulik	160	121	76%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Blerje kondicionere	150	128	85%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Blerje fikse zjarri	50	45	90%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Rehabilitimi i banesave ne bashkepronesi	11.000	10.808	98%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Projekti i banesave sociale me qera -TVSH (per Bashkine Durres)	20.000	19.709	99%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Permiresimi i kushteve te banimit per komunitetin Rom	30.000	29.330	98%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Rikonstruksion I banesave te komunitetit Rom, nderhyrje ne infrastrukture Komuna Otlak	20.362	20.213	99%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Restaurimi i nderteses ku u mbajt Kongresi i Lushnjes	8.000	8.000	100%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Nderhyrje emergjente ne banesat e Komunitetit Egjyptian, Permet	4.800	4.788	100%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Kosto Lokale	105.000	96.824	92%	Ka perfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	TVSH dhe Takse Doganore	162.252	157.726	97%	Ka perfunduar
Zhvillimi I Turizmit	Blerje pajisje zyre dhe elektronike	420	406	97%	Ka perfunduar
Zhvillimi I Turizmit	Blerje pajisje zyre per Zyren e Sherbimit Turistik	734	734	100%	Ka perfunduar
Zhvillimi I Turizmit	Blerje pajisje elektronike	462	462	100%	Ka perfunduar
Zhvillimi I Turizmit	Blerje pajisje te tjera zyre	236	133	56%	Ka perfunduar
Zhvillimi I Turizmit	Blerje kondicionere	400	390	98%	Ka perfunduar
TOTAL		821.001	635.415	77%	


Paraqitja grafike si më poshtë :

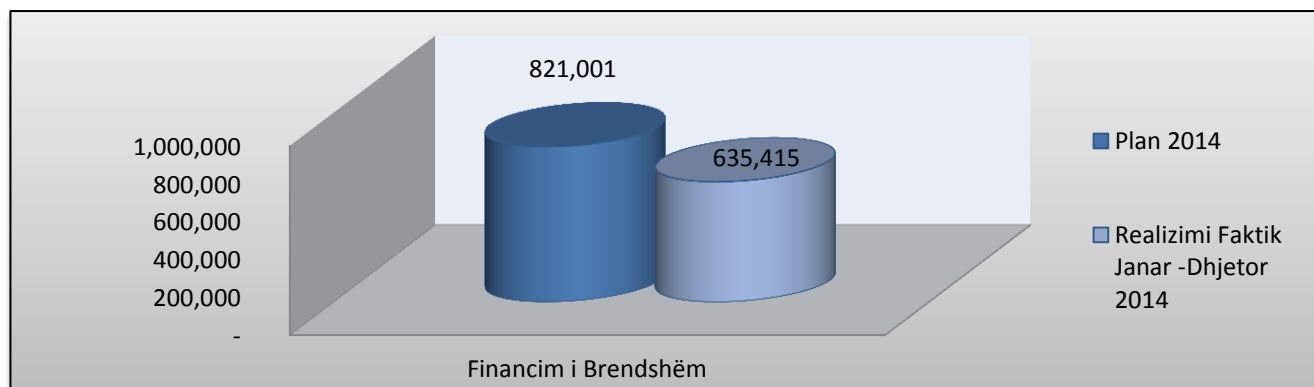

Më poshtë mund të gjeni tabelën e përbledhur të investimeve me financim të Huaj për Ministrinë e Zhvillimit Urmab dhe Turizmit dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN DHE TURIZIMIT					
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Manaxhimi i Integruar dhe pastrimi i zonës bregdetare	120.000	139.887	116.57%	Grant - Ka përfunduar
Planifikimi Urban dhe Strehimi	Manaxhimi i Integruar dhe pastrimi i zonës bregdetare	600.000	452.273	75,38%	Kredi - Ka përfunduar
TOTAL		720.000	894.160	124%	

Paraqitja grafike si më poshtë :

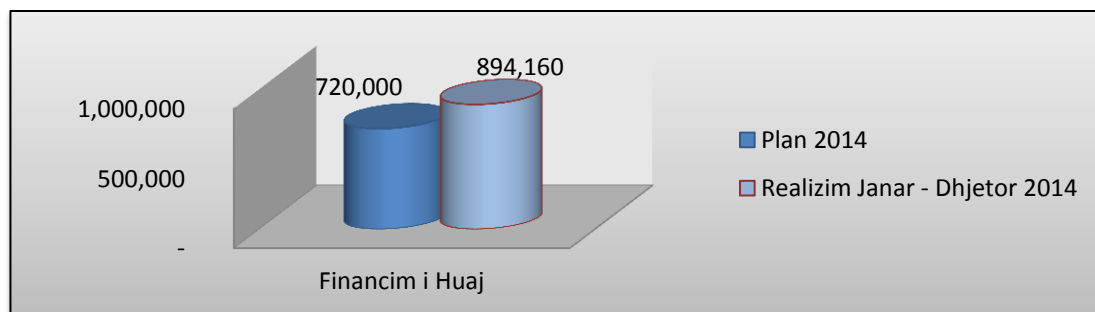

MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Brendshëm për Ministrinë e Shëndetësisë dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E SHËNDETËSISË				
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Blerje pajisje kompiuterike per aparatin	1.323	1.323	100%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	F.V kondicioner per godinen e Ministrise se Shendetesise (kati II deri kati IV) shteses se Re	220	220	100%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Projekt preventiv zbatimi per realizimin e detajeve ndertimore per pershtatshmerine e tyre per Personat me aftesi te kufizuar(P.A.K.) ne godinen e MSH	79	46	58%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Blerje pajisje zyre per disa ambiente te MSH	398	217	55%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Blerje pajisje mobilimi per disa ambiente te MSH	480	384	80%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Kosto Lokale per PIU-n (njesia e zbatimit te projekteve te huaja)	1.000	1.000	100%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Projekt-preventiv zbatimi per rikonstruksonin e catise dhe nyjeve h/sanitare te godines se DSHP Bulqize	600	594	99%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Projekt-preventiv zbatimi per rikonstruksonin e QSH ne komunen Kala e Dodes DSHP Diber	720	708	98%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Projekt-preventiv zbatimi per rikonstruksonin e QSH ne komunen Maqellare DSHP Diber	530	510	96%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Rishikimi projekt-preventivit te zbatimit per Rikonstruksonin e Godines se DSHP dhe klinikes dentare DSHP Durres	480	474	99%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Projekt-preventiv zbatimi per shtese kati te godines se DSHP Durres	480	474	99%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Projekt-preventiv zbatimi per rikonstrukson dhe shtese ambientesh per qendren shendetesore Spitalle DSHP Durres	480	479	100%

Sherbimet e Kujdesit Paresor	Projekt preventiv zbatimi per rikonstruksionin e godines qe do te shnderrohet ne shtepi te mbrojtura (shtepia Mimoza1) per personat me aftesi te kufizuar	430	430	100%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Projekt preventiv zbatimi per rikonstruksionin e godines qe do te shnderrohet ne shtepi te mbrojtura (shtepia Mimoza 2) per personat me aftesi te kufizuar	480	474	99%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Projekt-preventiv zbatimi per rikonstruksionin e god DSHP Permet	400	288	72%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Projekt-preventiv zbatimi per rikonstruksionin e ambientit te Poliklinikes nr.2 Tirane, per instalimin e Grafi-Skopise- furnizuar nga kredia e qev.italiane	480	474	99%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Projekt-preventiv zbatimi per rikonstruksionin e ambientit te Poliklinikes nr.3-(ish qendrorja)Tirane, per instalimin e Grafi-Skopise- furnizuar nga kredia e qev.italiane	480	474	99%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Rikonstruksion i ambientit te Poliklinikes nr.2 Tirane, ku do te instalohet Grafi-Skopija -furnizuar nga kredia e qev.italiane	4.066	4.066	100%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Superv+kolaudim per rikonstruksionin e ambientit te Poliklinikes nr.2 Tirane, ku do te instalohet Grafi-Skopija -furnizuar nga kredia e qev.italiane	147	147	100%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Rikonstruksion i ambientit te Poliklinikes nr.3-ish qendrore Tirane, ku do te instalohet Grafi-Skopija - furnizuar nga kredia e qev.italiane	4.247	4.247	100%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Superv+kolaudim per rikonstruksionin e ambientit te Poliklinikes nr.3 ish qendrore Tirane, ku do te instalohet Grafi-Skopija -furnizuar nga kredia e qev.italiane	150	150	100%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Rikonstruksioni dhe shtese kati per polikliniken e specialiteteve nr.1 Tirane	8.102	7.997	99%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Superv+kolaudim per rikons+shtese kati per polikliniken e specialiteteve nr.1 Tirane	500	0	0%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Pagese per lejen e ndertimit per rikonstruksionin dhe shtesen e katit per Polikliniken e specialiteteve nr 1 Tirane	4.288	1.735	40%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Projekt-preventiv zbatimi per rikonstruksionin e	500	474	95%

QKSHM nr.1 ASHR Tirane(rrezik shembjeje)				
Sherbimet e Kujdesit Paresor	FV llampe per aparatin e skopise se Dispancerise (ASHR)	2.088	2.088	100%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Projekt -preventiv zbatimi per shtesen e re te godines se Poliklinikes nr.1(Irانية), si rezultat i saktesimit te dokumentit hipotekor te pronesise dhe azhornimit faktik te kufijve te miratuar nga Drejtoria Urbanistikes ne Bashkine Tirane.	600	600	100%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Projekt preventivat e zbatimit per 3 objekte qe jane ne varesi te A.SH.R. lidhur me realizimin e detajeve ndertimore per pershtatshmerine e tyre per Personat me aftesi te kufizuar(P.A.K.)	280	258	92%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Ngritja e sistemit E-PRESCRIPTION(receta elektronike) per sherbimin shendetesor	35.367	35.367	100%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	FONDI I ZHVILLIMIT TE RAJONEVE- alokuar bashkive dhe komunave -divjaka	1.050	0	0%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	TVSH& Det . Dog. Per ndertimin e QSh & amb. (Gjysme hena e kuqe)	3.800	3.787	100%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	TVSH& Det . Dog. Per ndertimin e QSh & amb. (MIREZIA)	339	0	0%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	TVSH per projektin HIV AIDS (Global Fund)	1.361	825	61%
Sherbimet e Kujdesit Dytesor	Projekt-preventiv zbatimi per rikonstruksionin e shesheve, rrugeve, ndricimi i sp.Bulqize	700	684	98%
Sherbimet e Kujdesit Dytesor	Projekt-preventiv zbatimi per pediatrie e sp.rajonal Durres-nga viti 2012	1.955	0	0%
Sherbimet e Kujdesit Dytesor	F.V llampe per aparaturen e CT Scannerit te sp.Durres	11.760	11.760	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytesor	Projekt-preventiv zbatimi per rikonstruksionin e godines se ish-kirurgjise sp.Elbasan	1.766	1.766	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytesor	F.V pajisje per sistemin e kaldajes sp.psikiatrik Elbasan	5.900	0	0%
Sherbimet e Kujdesit Dytesor	Superv+kolaudim per f.v pajisje per sistemin e kaldajes sp.psikiatrik Elbasan	200	0	0%
Sherbimet e Kujdesit Dytesor	Projekt-preventiv zbatimi per f.v sistem kondicionim-ajrimet sp.psikiatrik Elbasan	620	450	73%
Sherbimet e Kujdesit Dytesor	Projekt-preventiv per ndertimin e spitalit te ri Fier	38.736	38.736	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytesor	F.V gjenerator per aparaturen e CT Scannerit sp.Korce	3.000	3.000	100%

Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Rikonstruksion i ambientit të Poliklinikës së spitalit Korce, ku do të instalohet Grafi-Skopija -furnizuar nga kredia e qev.italiane	1.950	1.950	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Superv+kolaudim për rikonstruksionin e ambientit të Poliklinikës së spitalit Korce, ku do të instalohet Grafi-Skopija -furnizuar nga kredia e qev.italiane	100	16	16%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Rikonstruksion i ambienteve të kimioterapise në sp.Korce	272	228	84%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V pajisje mobilimi dhe elektronike për ambientet e kimioterapise në sp.Korce	165	155	94%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V pajisje KAP-a për ambientet e Kimioterapise sp Korce	560	534	95%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Rikonstruksioni i nyjeve h/sanitare dhe të disa ambienteve të sp.Kukes	1.900	1.892	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Superv+kolaudim për rikonstruksionin e nyjeve h/sanitare dhe të disa ambienteve të sp.Kukes	80	38	48%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Projekt-preventiv zbatimi për rikonstruksionin e urgjencës dhe kirurgjisë sp.Librazhd	800	774	97%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Projekt-preventiv zbatimi për rikonstruksionin e god 2 kateshë të Maternitetit sp.Burrel	1.200	1.182	99%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Projekt-preventiv zbatimi për rikonstruksionin e poliklinikës sp.Pogradec	700	696	99%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Rikonstruksion i ambienteve të kimioterapise në sp.Vlore	272	270	99%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V pajisje mobilimi dhe elektronike për ambientet e kimioterapise në sp.Vlore	165	138	84%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V pajisje KAP-a për ambientet e Kimioterapise sp Vlore	560	534	95%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Ndërtimi i spitalit të ri Psikiatrik Vlore	144.137	143.883	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Superv+kolaudim për ndërtimin e spitalit të ri Psikiatrik Vlore	1.147	1.023	89%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V llampe për aparatit e Grafi-Scopise sp.Sarandë	1.956	1.950	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Rikonstruksion i ambienteve të kimioterapise në sp.Shkoder	272	216	79%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V pajisje mobilimi dhe elektronike për ambientet e kimioterapise në sp.Shkoder	165	163	99%


Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V pajisje KAP-a per ambientet e Kimioterapise sp.Shkoder	560	534	95%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V aparat Koronarografie(Angiograf) për sp.Rajonal Shkoder	58.560	58.560	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Rikonstruksion i depos se bombulave te oksigjenit sp.Tropoje	1.200	1.199	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Superv+kolaudim per rikonstruksionin e depos se bombulave te oksigjenit sp.Tropoje	50	47	94%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Rikonstruksion i sistemit te ngrohjes(kaldaja) per sp.Tropoje	1.000	996	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Rikonstruksion i sistemit te oksigjenit ne sp.Tropoje	480	450	94%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Superv+kolaudim per rikonstruksionin e sistemit te oksigjenit dhe te ngrohjes per sp.Tropoje	70	64	91%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Projekt preventiv zbatimi per pershtatjen ndertimore per P.A.K ne Maternitetin 1 Tirane	140	140	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	'Rikonstruksion i ambienteve ne katin e trete ne godinen 6 kateshe(pathollogjia e barres) Mat 2 nga viti 2013	35.242	33.057	94%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Superv+kolaudim per rikonstruksion i ambienteve ne katin e trete ne godinen 6 kateshe(pathollogjia e barres) Mat 2	365	317	87%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V pajisje inkubatore per sherbimin e Neonatologjise per Maternitetet e Tiranes	8.147	8.146	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Projekt - Preventiv zbatimi per 'Riorganizimin dhe rikonstruksionin e ambienteve te katit perdhe ne godinen 5 kate'	480	480	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Projekt - Preventiv zbatimi per 'Rikonstruksion te ambienteve te Katit te gjashte (Lehonia 2)'.	480	465	97%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Projekt - Preventiv zbatimi per 'Shtese kati per Repartin e Gjinekologjise'.	480	477	99%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Projekt - Preventiv zbatimi per 'Ndertimin e rrjetit te mbrojtjes kunder shkarkimeve atmosferike, ndertimi i shkalleve te emergjences, rrjeti i mbrojtjes kunder zjarrit'.	480	474	99%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V aparatura mjekesore per fekondimin e asistuar ne SUOGJ "Koco Gliozheni" Tirane- Projekti IPA	21.999	21.153	96%

	Adriatica			
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	TVSH per F.V aparatura mjekësore per fekondimin e asistuar ne SUOGJ "Koco Gliozheni" Tirane- Projekti IPA ADRIATICA	4.239	4.239	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Ndertimi i bunkerit per instalimin e akseleratorit linear ne spitalin e Neurokirurgjise dhe Rikonstruksion i Neurologjise ne QSU Tirane dhe shtese kontrate per te dy objektet	64.212	64.212	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Superv+kolaudim per ndertimin e bunkerit per instalimin e akseleratorit linear ne spitalin e Neurokirurgjise dhe Rikonstruksionit te Neurologjise ne QSU Tirane dhe shtese kontrate per te dy objektet.	1.000	636	64%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Projekt preventiv per Ndertimin e Bunkerit per instalimin e dy aksesoreve linear ne SP Onkologjik te QSUT	2.400	2.386	99%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Ndertimin e Bunkerit per instalimin e dy aksesoreve linear ne SP Onkologjik te QSUT	5.000	5.000	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Supervizion per Ndertimin e Bunkerit per instalimin e dy aksesoreve linear ne SP Onkologjik te QSUT	200	0	0%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Blerje aparat lazeri per sherbimin e ORL ne QSUT	3.540	3.540	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V aparat Mamografie portabe (2 cope)per sherbimin onkologjik ne QSUT	42.989	42.988	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V aparatura mjekësore per sherbimin e kardiokirurgjise ne QSUT	40.560	40.560	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Furnizim vendosje pajisje hotelerie per Sherbimin e neurologjise ne QSUT	25.000	24.742	99%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Projekt-preventiv zbatimi per rikonstruksionin e ndertesës se ish-laboratoreve per pershtatje per qendren e konsultave ne Q.S.U.Tirane	1.600	1.596	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V aparat Koronarografie(Angiograf) për QSUT	59.700	59.700	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V i disa pajisjeve per funksionimin e rezonances magnetike ne sherbimin e Neurokirurgjise dhe Neurologjise ne QSUT	10.584	0	0%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V i disa pajisjeve per funksionimin e CT Scannerit ne sherbimin e Urgjences se Semundjeve te Brendshme ne QSUT	1.430	0	0%

Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Ndertimi i godines se administrates dhe QFR sp. SU "Shefqet Ndroqi"	59.172	59.172	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Superv+kolaud per dy godinat e reja SU."Shefqet Ndroqi"	1.490	1.166	78%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Blerje pajisje mjekesore per reanimacionin e kardiologjise ne SU "Shefqet Ndroqi"	5.525	5.524	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Ndertimi i godines se administrates dhe QFR sp. SU "Shefqet Ndroqi"-shtese kontrate	47.971	47.971	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Superv+kolaud per dy godinat e reja SU."Shefqet Ndroqi"-shtese kontrate	170	170	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Rikonstruksion i ambienteve te kimioterapise ne sp.S.U "Shefqet Ndroqi"	272	272	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V pajisje mobilimi dhe elektronike per ambientet e kimioterapise ne sp. S.U "Shefqet Ndroqi"	165	155	94%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V pajisje KAP-a per ambientet e Kimioterapise ne SU "Shefqet Ndroqi"	560	534	95%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V Aparat CT Skaner per SP Traumes Tirane	29.988	29.988	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V aparate ventilatore (respiratore) 5cope per Spitalin e Traumes Tirane	10.400	10.374	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Projekt-preventiv zbatimi per rikonstruksionin e ambienteve ku do te instalohet aparatura e CT Scannerit ne Sp. Traumes	480	462	96%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Rikonstruksion i ambienteve ku do te instalohet aparatura e CT Scannerit ne Sp. Traumes	5.000	5.000	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Superv+kolaudim per rikonstruksionin e ambienteve ku do te instalohet aparatura e CT Scannerit ne Sp. Traumes	180	0	0%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V te nje ashensori mekanik per SU.Traumes	3.600	3.600	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Superv+kolaudim per f.v te nje ashensori mekanik per SU.Traumes	170	24	14%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Rikonstruksion i ambientit brenda sp.Traumes, te percaktuar per vendosjen e sherbimit te Telemjekesise	2.000	1.745	87%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	Superv+kolaudim per rikonstruksionin e ambientit brenda sp.Traumes, te percaktuar per vendosjen e sherbimit te Telemjekesise	90	7	8%
Sherbimet e Kujdesit Dytësor	F.V Aparat Rezonance magnetike (MRI)	87.120	87.120	100%

Sherbimet e Kujdesit Dytesor	Ndihme financiare per Maternitetin e Presheves Komuna Presheve(percaktuar me VKM te qev shqiptare)	7.200	7.060	98%
Sherbimet e Kujdesit Dytesor	Ngritja e sistemit te menaxhimit te stafit dhe aseteve mjekesore per sistemin shendetesor.	9.976	9.976	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytesor	Sistemi i informacionit te regjistrimit dhe kontrollit te barnave QKKB Tirane	24.000	23.511	98%
Sherbimet e Kujdesit Dytesor	F.V pajisje per inaktivizimin viral te komponenteve te gjakut ne Q.K.T.Gjakut Tirane	21.000	20.686	99%
Sherbimet e Kujdesit Dytesor	TVSH per pajisje mjekesore komplese per spitalet rajonale (detyrim viti 2012)	13.000	12.944	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytesor	Blerje e nje helikopteri EC-135 per sektorin shendetesor	670.000	669.900	100%
Sherbimet e Kujdesit Dytesor	Blerje autoambulanca per sistemin shendetesor (25 cope)	150.000	149.640	100%
Sherbimet e Shendetit Publik	Projekt-preventiv zbatimi per rikonstruksionin e godines se D.H.E Durres	480	475	99%
Sherbimet e Shendetit Publik	Projekt-preventiv zbatimi per shtese kati te godines se D.H.E Durres	480	475	99%
Sherbimet e Shendetit Publik	Blerje paisje aparatura, instrumenta dhe mobilim teknik per Laboratorin e Kimise analitike dhe te ujit prane ISHP	27.040	26.395	98%
Sherbimet e Shendetit Publik	Blerje pajisje kompiuterike per ISHP	2.000	1.500	75%
Sherbimet e Shendetit Publik	Blerje pajisjesh mjekesore te vecanta per gatishmerine dhe perballimin e rrezikut nga Virusi Ebola-ISHP Tirane	51.063	0	0%
TOTAL		1.919.762	1.834.352	96%


Paraqitja grafike si më poshtë Paraqitja grafike si më poshtë :

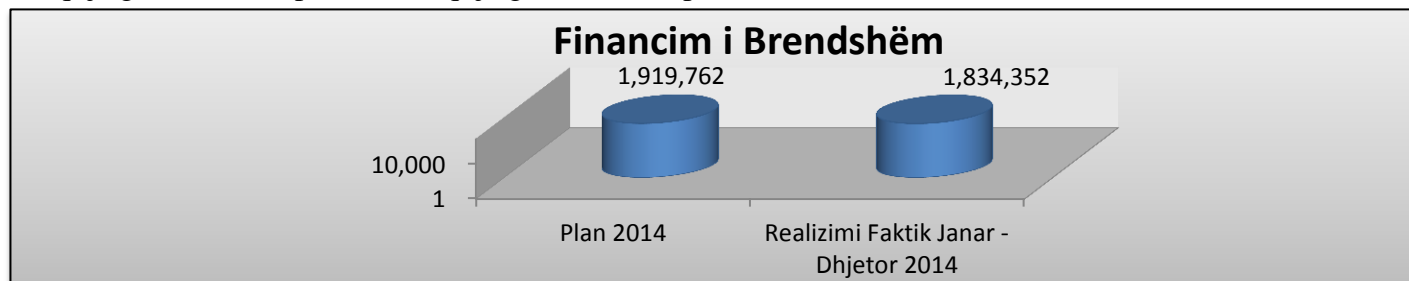

Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmbledhur të investimeve me financim të Huaj për Ministrinë e Shëndetësisë dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E SHËNDETËSISË				
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Ndertimi i qendres shendetsore & ambulancave-Gjysem Hena e Kuqe	20.000	17.300	87%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Ndertimi i QSH& ambulancave - Fondacioni Miresia	4.000	0	0%
Sherbimet e Kujdesit Paresor	Fuqizimi i pergjigjes kombetare ndaj HIV/AIDS (Global Fund)	9.720	16.050	165%
Sherbimet e Kujdesit Dytesor	Kredia austriake per furnizimin me pajisje mjekesore komplekse per sp. Onkologjik	48.326	42.033	87%
Sherbimet e Kujdesit Dytesor	Projekti i informatizimit te sistemit shendetesor E-HEALTH-kredi Austriake	293.895	293.895	100%
TOTAL		375.941	369.278	98%

Paraqitja grafike si më poshtë :

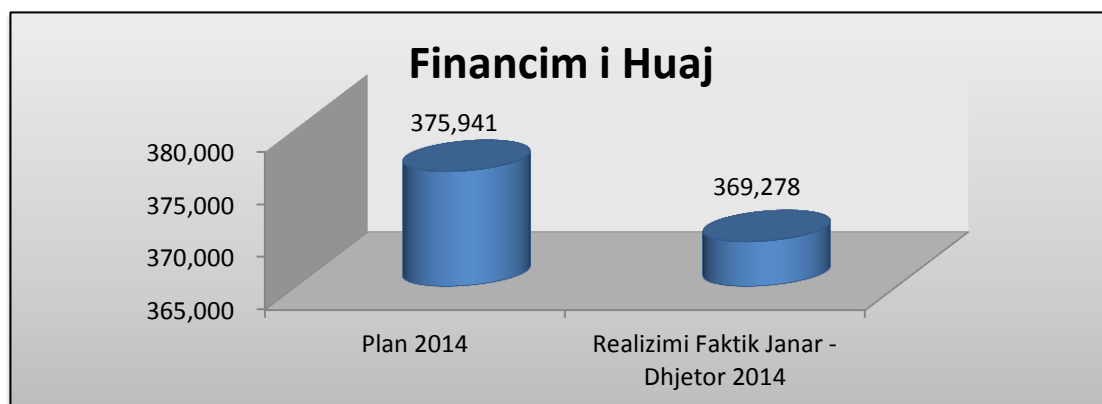

MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS

Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmblodhur të investimeve me financim të Brendshëm për Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS					
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI
Planifikim, Menazhim	Blerje paisje elektronike per perdorim zyre	1.270	783	62%	Nuk ka problematika
Planifikim, Menazhim	Blerje kondicioneri	100	98	98%	Nuk ka problematika
Planifikim, Menazhim	Sistem kamera per ambientet e brendshme te MTI	200	154	77%	Nuk ka problematika
Planifikim, Menazhim	Blerje paisje audiovizuale (diktofon)	16	16	100%	Nuk ka problematika
Planifikim, Menazhim	Blerje skaner	70	53	76%	Nuk ka problematika
Planifikim, Menazhim	TVSH e detyrim doganor projekti IPA Adriatic "Modeli Intermodal per zhvillimin e zones bregdetare te Adriatikut INTERMODAL"	1.190	847	71%	Nuk ka problematika
Planifikim, Menazhim	TVSH projekti IPA CBC "Forcimi i kapaciteteve per te ndaluar rrezikun ndaj ndotjes nga nafta dhe substancave e tjera te rrezikshme ne detin Adriatik HAZADR	1.040	0	0%	
Planifikim, Menazhim	Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te ministrise	480	336	70%	Nuk ka problematika
Planifikim, Menazhim	Sistemim i tarraces se godines se ministrise	480	474	99%	Nuk ka problematika
Planifikim, Menazhim	Blerje mobilje zyrash	154	144	94%	Nuk ka problematika
Mbetjet Urbane	Studim projektim per mbylljen e venddepozitave ekzistuese te mbetjeve te ngurta Durres	3.000	0	0%	Procedurat u anuluan nga mungesa e afateve

Mbetjet Urbane	Studim projektim per mbylljen e venddepozitave ekzistuese te mbetjeve te ngurta Sarande	2.000	0	0%	kohore për përfundimin e tyre brenda datës 31.12.2014.
Mbetjet Urbane	Studim projektim per mbylljen e venddepozitave ekzistuese te mbetjeve te ngurta Vlore	3.000	0	0%	
Mbetjet Urbane	TVSH dhe takse doganore per projektin Administrimi i mbetjeve te ngurta ne juglindje te Shqiperise (Faza e I)	1.736	1.536	88%	Ka përfunduar disbursimi për kontratat ekzistuese.
Mbetjet Urbane	TVSH per projektin "Administrimi i mbetjeve te ngurta ne Juglindje te Shqiperise" (faza e dyte)	30.000	0	0%	Eshte marre leja e ndertimit, por nuk ka filluar procedura e tenderimit per punimet e ndertimit pasi duhet te perfundoj shpronosimi i tokave.
Mbetjet Urbane	Kosto lokale per projektin "Administrimi i mbetjeve te ngurta ne Juglindje te Shqiperise" (faza e dyte)	66.200	28.775	43%	Eshte realizuar 80% e shpronositimit te tokave pasi kishte vonesa ne plotesimin e dokumentacionit
Mbetjet Urbane	TVSH per studimin e fizibilitetit per ndertimin e landfillit rajonal Vlore	3.247	0	0%	Nuk eshte percaktuar n.q.s do kete tvsh projekti
Mbetjet Urbane	Rehabilitimi I venddepozitimit ekzistues te qytetit Çorovodë	10.800	9.519	88%	
Transporti Ajror	Ruajtja e Aeroportit te Kukesit	760	759	100%	Ky projekt ne zbatim te Udhezimit te Perbashket mes MF dhe MTI, u hoq nga plani I ketij programi. Shpenzimet do

					perballohen nga AAC
Transporti Ajror	Riparim rrjeti elektrik dhe hidraulik	700	0	0%	nuk u realizuan procedurat e prokurimit brenda vitit
Transporti Ajror	Sistem kondicionimi	300	155	52%	u realizua
Transporti Ajror	Rikonstruksion i godines	1.500	0	0%	nuk u realizuan procedurat e prokurimit brenda vitit
Transporti Hekurudhor	Blerje traversa hekurudhore druri te reja	28.452	28.451	100%	Ecuri normale
Transporti Hekurudhor	Blerje cakulli per ballast	2.291	2.291	100%	Ecuri normale
Transporti Hekurudhor	Riaftesim i trasese hekurudhore Milot - Lezhe	6.234	6.234	100%	Ecuri normale
Transporti Hekurudhor	Blerje aksesore per linjen hekurudhore	1.631	1.631	100%	Ecuri normale
Transporti Hekurudhor	Rikonstruksioni i godines se DPH	3.701	3.677	99%	Ecuri normale
Transporti Hekurudhor	"Riaktivizimi i Stacionit Kashar", faza e trete	18.845	18.845	100%	Ecuri normale
Transporti Hekurudhor	Punime te kryera nga vete hekurudha per "Riaktivizimi i Stacionit Hekurudhor Kashar"	5.000	5.000	100%	Ecuri normale
Transporti Hekurudhor	Sherbime rinovimi agregatesh per lokomotiva hekurudhore	10.560	10.560	100%	Ecuri normale
Transporti Hekurudhor	Blerje pajisje kembimi per lokomotiva dhe vagona	7.208	7.208	100%	Ecuri normale
Transporti Hekurudhor	Rikonstruksion i stacionit Vidhas	3.300	2.230	68%	Ecuri normale
Transporti Hekurudhor	Rikonstruksion i stacionit hekurudhor Bajze	5.200	3.244	62%	Ecuri normale
Transporti Hekurudhor	Ndertimi i ripartit te riparimit te vagoneve	5.512	3.643	66%	Ecuri normale
Transporti Hekurudhor	Blerje te baterive shprese te inventarit te lokomotivave te transportit te mallrave	3.300	3.182	96%	Ecuri normale
Transporti Hekurudhor	Blerje pajisje kompjutera	1.000	961	96%	Ecuri normale

Transporti Rrugor	Ndertim rruga Kukës-Morinë Loti1 (V.Arta te mëdha) dublimi	451.085	451.085	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndërtim rruga Kukës-Morinë Loti2 (dy viadukte) dublimi	150.000	150.000	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndërtim rruga Milot - F. Kruje (dublimi i superstradës)Loti4	57.253	57.253	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje-RrogozhinëLoti4	281.856	281.856	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje-RrogozhinëLoti5	197.699	197.699	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje-RrogozhinëLoti6	166.350	166.350	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje-RrogozhinëLoti7	87.768	86.256	98%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje-RrogozhinëLoti8	163.940	158.439	97%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje-RrogozhinëLoti9	113.294	113.294	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje-RrogozhinëLoti10	293.962	293.962	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje-RrogozhinëLoti11	236.620	221.034	93%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndërtim rruga Kanali i Cukës-Butrint Loti 1,	137.289	137.289	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Kanali i Cukes-ButrintLoti 2	162.311	162.311	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Unaza e re Tiranes (segmenti Komuna e Parisit - rruga e re Tirane - Elbasan)	1.271.889	1.271.889	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Unaza e Re e Tiranes (segmenti Komuna e Parisit - rruga e Kavajes)	271.671	271.671	100%	Punohet,Probleme me shpronësimet
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Unaza e re Tiranes , Komuna e Parisit - Shkolla Teknologjike ,pjesa e mbetur km0.00-km0.640)	85.000	84.345	99%	Punohet, ndryshime ne projekt

Transporti Rrugor	Rikonstruksion dhe zgjerim I rruges se Elbasanit, Segmenti Fakulteti Filologjik - Unaza e Madhe Tirane.	242.028	242.028	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Rikonstruksion dhe zgjerim I rruges se Elbasanit, Segmenti Fakulteti Filologjik - Unaza e Madhe Tirane(Shtese Punimesh)	108.509	108.509	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Lushnje - Berat Loti 1	75.647	75.647	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Lushnje - Berat Loti 1 (Shtese Punimesh)	3.723	3.723	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Lushnje - Berat Loti 2	728.000	728.000	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Lushnje - Berat Loti 2 (shtese punimesh)	40.688	40.688	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Lushnje - Berat Loti 3	655.000	655.000	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Lushnje - Berat Loti 3(shtese punimesh)	84.993	84.993	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Plotesimi I segmentit Dragobi - Valbone	250.000	250.000	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndertim i rrugeve sekondare Vidhas-Kombinati Metalurgjik (shtese)	6.800	1.465	22%	Nuk punohet
Transporti Rrugor	Ndertim rruga e Porto Romanos, Durres Loti 1,	127.415	127.415	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Ndertim Unaza veriore Korce segmenti dritat e verdha k/ rruga Korce Kapshtice	18.550	18.550	100%	
Transporti Rrugor	Ndertim I rruges se Arberit (Dalja e ures se Vashes Bulqize) Loti 3	1.023.715	1.023.715	100%	Ne proces , munges financimi
Transporti Rrugor	Ndertim I rruges se Arberit (Dalja e ures se Vashes Bulqize) Loti 3 (shtese punimesh)	500	0	0%	
Transporti Rrugor	Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine Loti 2	57.604	57.604	100%	Nuk punohet ,munges financimi
Transporti Rrugor	Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine Loti 3	50.061	50.061	100%	Nuk punohet ,munges financimi

Transporti Rrugor	Rikonstruksion segmenti rrugor Koder-Kamez-Tapiz	21.710	21.710	100%	
Transporti Rrugor	Ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 1	246.507	246.507	100%	
Transporti Rrugor	Ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 2	40.412	40.412	100%	
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Mbingritja e Viroit dhe hyrje e qytetit Gjirokaster (vazhdimi)	1.000	0	0%	
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Qukes Qaf Plloce Loti 1	177.274	177.274	100%	Nuk punohet, mungese financimi
Transporti Rrugor	Ndertim rruget paralele superstrada Tirane-Vore krahu i Majte (vazhdimi) shtese kontrate	26.271	26.271	100%	
Transporti Rrugor	Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine Loti 1	3.079	3.079	100%	
Transporti Rrugor	Ndertim I rruges se Arbrit (Dalja Ure e Vashes Bulqize - Hyrje Tunelit Q. Murrize) Loti 1	146.687	146.687	100%	
Transporti Rrugor	Ndertim I rruges se Arberit (Dalja e ures se Vashes Bulqize) Loti 2	215.653	215.653	100%	Ne proces , munges financimi
Transporti Rrugor	Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 1	218.686	218.686	100%	
Transporti Rrugor	Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 2	39.227	39.227	100%	Ne proces , munges financimi
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Qukes Qaf Plloce Loti 1 (shtese kontrate)	45.178	45.178	100%	
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Kukes-Morine Loti5 (dublimi dhe plotesimi) (shtese kontrate) financim	4.622	4.622	100%	
Transporti Rrugor	Ndertim I rruges se Arberit (seg.ura e Brarit - Hyrje tuneli Qafe Murrize)(Loti 1)	429.888	429.888	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Ndertim I rruges se Arberit (Dalja e ures se Vashes Bulqize) Loti 1	266.310	266.310	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Milot - F. Kruje	16.091	16.091	100%	Kolauduar

	(dublimi i superstrades)Loti1				
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Milot - F. Kruje (dublimi i superstrades)Loti1 (shtese punimesh)	51.171	51.171	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Milot - F. Kruje (dublimi i superstrades)Loti2	8.407	0	0%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Milot - F. Kruje (dublimi i superstrades)Loti5	7.955	7.955	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Milot - F. Kruje (dublimi i superstrades)Loti9	75.109	75.109	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Milot - F. Kruje (dublimi i superstrades)Loti10	139.498	139.498	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje- Rrogozhine Loti1	10.374	10.374	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje- Rrogozhine Loti1 (shtese kontrate)	40.985	41.014	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje- RrogozhineLoti2	13.512	13.512	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Unaza e re Tirane - Mullet, Loti 1	918.493	918.465	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Masa Inxhinierike ne aksin Rubik- Rreshen-Gjegjan	21.335	21.335	100%	
Transporti Rrugor	Rikonstruksion rruga Aleksander Goga (Shkolle - Ish Ndermarrje kimike)	22.993	22.993	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Rikonstruksion rruges Institut Bulcesh Kamez	68.481	68.481	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Rikonstruksion I Unazes se Qytetit Durrës	13.289	13.289	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Rikonstruksion I rruges dhe zgjerimi I tunelit ne zonen e Ujit te ftohte Vlore	26.528	26.528	100%	
Transporti Rrugor	Ndertim Unaza Veriore Korce (segmenti Varreza-K/Erseke)	628	628	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Ndertim Unaza Fushe Arrez	329	0	0%	
Transporti Rrugor	Ndertim rruga Qeparo-Sarande, Loti 3	357	357	100%	
Transporti Rrugor	Ndertim Rruga K/Rruga Nacionale- Plazh Patog (vazhdimi)	957	957	100%	

Transporti Rrugor	Riveshje dhe Sistemim Asfaltim Milot - Lezhe	168.914	168.914	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim Rruget lidhese me bregdetin (Llogara-Sarande)Loti 1	32.142	32.142	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim Rruget lidhese me bregdetin (Llogara-Sarande)Loti 1(shtese punimesh)	40.000	40.000	100%	
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim Rruga Qafe Thane-Lin-Pogradec Loti 2	703.630	703.630	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim Rruga Qafe Thane-Lin-Pogradec Loti 2 (shtese kontrate)	77.129	77.129	100%	
Transporti Rrugor	Sistemim asfaltim rruga 3 urat Leskovik	80.270	80.270	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim Rruga Kukes-Krume Loti 1	131.336	131.336	100%	Nuk punohet, mungese financimi
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim Rruga Kukes-KrumeLoti 2	232.339	232.339	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim Rruga Kukes-KrumeLoti 2 (shtese punimehs)	149.877	149.877	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltimi Rruga Buzuq - Corovode	42.930	42.930	100%	Punohet
Transporti Rrugor	Sistemim asfaltim Rruga e Gjinarit Elbasan	13.573	13.573	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Sistemim asfaltim Rruga e Gjinarit Elbasan (shtese kontrate)	57.421	57.421	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim Rruga Korce-Erseke Loti 1	250.000	250.000	100%	
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim Rruga e Shishtavecit, Kukes	5.204	5.204	100%	
Transporti Rrugor	Riveshje dhe Sistemim Asfaltim Mat-Muhurr	8.808	8.808	100%	
Transporti Rrugor	Riveshje dhe sistemim asfaltim ne aksin rrugor Berat-Buzuq, Loti 1	1.000	0	0%	
Transporti Rrugor	Riveshje dhe sistemim asfaltim ne aksin rrugor Berat-Buzuq, Loti 2	1.000	0	0%	
Transporti Rrugor	Riveshje dhe sistemim asfaltim ne	1.000	0	0%	

	aksin rrugor Berat-Buzuq, Loti 3				
Transporti Rrugor	Rikonstruksion i rruges Shkoder(mbikalimi i trenit)- Mes	10.000	0	0%	
Transporti Rrugor	Sistemim asfaltim Rruga Librazhd-Qafe Stude Loti 3	490.997	490.997	100%	Nuk punohet, mungese financimi
Transporti Rrugor	Sistemim asfaltim rruga Zemblak - kryqezim Liqenas Loti 1	601.466	601.466	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim rruga Ura e Cerencit_ Peshkopi(Maqellare - Peshkopi) (Loti 2)	189.718	189.718	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim rruga Kucove - Belsh - Cerrik	180.000	180.000	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim rruga Pajove-Sheze-Pekisht-Belsh	48.341	48.341	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim Rruget lidhese me bregdetin (Llogara-Sarande)Loti 2	76.049	76.049	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Rikonstruksion I rruges shoqates Petania ne Bubq	22.710	22.689	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim Unaza Erseke	1.248	1.248	100%	Nuk punohet, mungese financimi
Transporti Rrugor	Sistemim asfaltim rruga e Peshkepi - Ura e Drashovices	22.537	0	0%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim rruga Pajove-Sheze-Pekisht-Belsh (shtese punimesh)	41.658	41.658	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Riveshje dhe Sistemim Asfaltim rruga Ura Skuraj - Burrel	25.758	23.385	91%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim Rruga Pushimi I Shoferit (Lushnje) -DivjakeLoti 2	81.391	81.391	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim Rruga F.Kruje-Kruje-Sarisalltik	101.345	101.345	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Sistemim asfaltim Rruga e Dardhes Korce	216	216	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Sistemim asfaltim Rruga e Voskopojes Korce	97.814	97.814	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Sistemim Asfaltim Rruga Qafe Thane-Lin-Pogradec Loti 1	190.478	190.478	100%	Kolauduar

Transporti Rrugor	Sistemim asfaltim rruga Tepelene-Gusmar	23.109	23.108	100%	Kolauduar
Transporti Rrugor	Sistemim asfaltim rruga hyrese Sarande	267	0	0%	
Transporti Rrugor	Masa inxhinierike dhe plotesimi i rruges Elbasan Gjinar	100	0	0%	
Transporti Rrugor	Masa inxhinierike ne segmentin rrugor Buzuq-Corovode	10.000	0	0%	
Transporti Rrugor	Masa inxhinierike ne segmentin rrugorOrikum-Llogara(zona Dukat)	100	0	0%	
Transporti Rrugor	Ndertim Ura e Matit (Burrel)	44.791	44.791	100%	Punohet, probleme me shpronasimet
Transporti Rrugor	Ndertim Ura e Pjegzes	1.544	0	0%	
Transporti Rrugor	<i>Vendime gjygesore ne proces</i>	220.000	219.766	100%	
Transporti Rrugor	<i>Shpronasime</i>	1.481.443	1.470.825	99%	
Transporti Rrugor	VKM 1258 shpronasime per ndryshim 1222 segmenti rrugor Bulqizë-Ura e Cerencit	81	51	63%	
Transporti Rrugor	VKM 1349 shpronasime segmenti rrugor Korçë-Qafë Plloçë	1.205	222	18%	
Transporti Rrugor	VKM 1392 shpronasime segmenti rrugor Virua-Gjirokastrë	1.000	0	0%	
Transporti Rrugor	VKM 1506 shpronasime segmenti rrugor LEVAN-TEPELENË (7.9 Km e para)	3.075	1.076	35%	
Transporti Rrugor	VKM 1680shpronasime segmenti rrugor Levan-Tepelenë	20.050	10.978	55%	
Transporti Rrugor	VKM 407 shpronasime segmenti rrugor Bulqizë-Ura e Cerencit	80	0	0%	
Transporti Rrugor	VKM 273 shpronasime segmenti Shkodër-Hani i Hotit	39.809	20.551	52%	
Transporti Rrugor	VKM 408 shpronasime segmenti rrugor Unaza e Madhe Tiranë	5.000	0	0%	
Transporti Rrugor	VKM 718shpronasime segmenti rrugor Unaza e Madhe Tiranë	1.441	441	31%	
Transporti Rrugor	VKM 846 shpronasime segmenti rrugor Vora By Pass	30	0	0%	

Transporti Rrugor	VKM 845shpronesime segmenti rrugor SHPRONESIME Kuçovë-Belsh-Cërrik	1.000	0	0%
Transporti Rrugor	VKM 876 shpronesime segmenti rrugor Dalje ura e Vashës-Bulqizë	2.857	2.857	100%
Transporti Rrugor	VKM 228shpronesime segmenti rrugor Tiranë-Elbasan	46.621	8.559	18%
Transporti Rrugor	VKM 545 shpronesime segmenti rrugor Tiranë-Elbasan	8.032	7.763	97%
Transporti Rrugor	VKM 756 shpronesime segmenti rrugor Laç-Patok	84	44	52%
Transporti Rrugor	Rrugët paralele Tiranë - Vorë, në superstradën Tiranë-Durrës	10.000	0	0%
Transporti Rrugor	Sarandë-Kranë-Konispol (Toka)	1.000	0	0%
Transporti Rrugor	Ndertimi i segmentit rrugor "Kardhiq - Delvine"	500	0	0%
Transporti Rrugor	Ndertimi i segmentit rrugor "Tirane - Elbasan" Loti 1	10.000	0	0%
Transporti Rrugor	Zgjerimi I segmentit Fushë Krujë-Milot dhe i rrugëve dytësore të tij	500	0	0%
Transporti Rrugor	Tiranë-Elbasan (Loti I + loti III)	3.000	1.197	40%
Transporti Rrugor	By Pass Shkozet - Durrës	60.000	43.719	73%
Transporti Rrugor	Levan-Tepelenë	20.000	7.323	37%
Transporti Rrugor	Unaza Lindore Shkoder	1.304	1.003	77%
Transporti Rrugor	Plepa-Kavajë-Rrogozhinë (Loti 10, rrugët dytësore)	5.000	429	9%
Transporti Rrugor	BY-PASS Plepa-Kavajë-Rrogozhinë (Loti 7, rrugët dytësore)	120.000	119.203	99%
Transporti Rrugor	Qukës - Qafthanë	1.134	722	64%
Transporti Rrugor	Pronë private (Kultura bujqësore dhe drurë frutorë), që preken nga ndërtimi I seg rrugor Levan-Tepelenë	1.000	0	0%
Transporti Rrugor	Ndryshim I VKM 1196 date 3.12.2009 per ndertimin e segmentit rrugor "Shkoder- Hani I Hotit"	3.929	3.929	100%
Transporti Rrugor	"Qafe-Thane - Lin - Pogradec" Loti 1	218	218	100%

Transporti Rrugor	Ndryshim I VKM 1507 date 19.11.2008 per ndertimin e segmentit rrugor "Rruga hyrese Shkoder"	3.098	3.098	100%
Transporti Rrugor	Ndryshim I VKM 228 date 29.02.2012 per ndertimin e segmentit rrugor "Tirane Elbasan"	10.000	9.996	100%
Transporti Rrugor	"Shkoder- Hani I Hotit" (Objektet)	9.163	0	0%
Transporti Rrugor	"Unaza Veriore Korce" (Dritat e verdha - kryqezimi, Rruga Korce Kapshtice) (Shtesat)	7.913	6.905	87%
Transporti Rrugor	"Librazhd - Qafe Stude" (Loti 2)	1.500	1.499	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim nyja lidhese e rruges Milot - Lezhe - Rreshen, Thumane	852	852	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim rruga Kukes -Morine Loti1 (vepra arti te medha) dublimi	4.777	4.777	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim rruga Kukes -Morine Loti2 (dy viaduktet) dublimi	1.410	1.400	99%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim Rruga Milot-F.Kruje-Dublimi I Superstrades Loti 3	369	369	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim Rruga Milot-F.Kruje-Dublimi I Superstrades Loti 4	725	725	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim I by Pass Plepa -Kavaje- Rrogozhine Loti 4	2.840	2.840	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim I by Pass Plepa -Kavaje- Rrogozhine Loti 5	1.349	1.285	95%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim I by Pass Plepa -Kavaje- Rrogozhine Loti 6	1.296	1.296	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim I by Pass Plepa -Kavaje- Rrogozhine Loti 7	1.200	803	67%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim I by Pass Plepa -Kavaje- Rrogozhine Loti 8	3.100	3.100	100%

Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim I by Pass Plepa -Kavaje- Rrogozhine Loti 9	1.657	1.657	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim I by Pass Plepa -Kavaje- Rrogozhine Loti 10	1.010	1.010	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim I by Pass Plepa -Kavaje- Rrogozhine Loti 11	668	668	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim rruga Kanali i Cukes-ButrintLoti 1	352	352	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim rruga Kanali i Cukes-ButrintLoti2	479	479	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim rruga Unaza e Re e Tiranes (segmenti Komuna e Parisit - rruga e re Tirane - Elbasan)	2.747	2.747	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim Unaza e Madhe Tirane(segmenti Komuna e Parisit - Rruga e Kavajes)	2.600	323	12%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim rruga Unaza e Re Tirane,Komuna e Parisit-Shkolla teknologjike,pjesa e mbetur Km 0.00-0.640.	270	270	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Rikonstruksion dhe zgjerim I rruges se Elbasanit, segmenti Fakulteti Filologjik - Unaza e Madhe Tirane	10.282	10.282	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh ndertim rruga Lushnje - Berat Loti 1	1.750	1.292	74%
Transporti Rrugor	Supervizion Ndertim rruga Lu-Br Loti 2	2.050	1.350	66%
Transporti Rrugor	Supervizion Ndertim rruga Lu-Br Loti 3	2.283	2.283	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Plotesimi I segmentit Dragobi - Valbone	3.725	3.725	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimeshNdertim rruga	410	410	100%

	Porto Romano , Durres Loti 1			
Transporti Rrugor	Supervizion per Sistemim Asfaltim Rruga Milot - Lezhe	1.440	1.440	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Sistemim Asfaltim Rruget lidhese me bregdetin (Llogara-Sarande)Loti1	339	339	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimeshSistemim Asfaltim Rruga Qafe Thane-Lin-Pogradec Loti 2	11.200	11.200	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Sistemnim Asfaltim rruga tre Urat Leskovik	645	645	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Sistemim Asfaltim Rruga Kukës-Krume Loti2	8.085	8.085	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Sistemim Asfaltim Rruga Buzuq - Corovede	330	330	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh riveshje sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje	40	0	0%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Sistemim asfaltim rruga e Gjinarit, Elbasan	696	596	86%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Sistemim asfaltim rruga e Gjinarit, Elbasan shtese kontrate	454	454	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim Ura e Matit (Burrel)	877	557	64%
Transporti Rrugor	Supervizion Furnizimi dhe vendosje me Guard rail ne aksin Kalimash - Morine	20	20	100%
Transporti Rrugor	Supervizion dhe auditim për verifikimin e cilësisë së punimeve të objekteve rrugore.	32.200	28.725	89%
Transporti Rrugor	Supervizion Punimesh - Permiresimi i sigurise dhe sinjalistikes rrugore ne superstraden Tirane-Durres dhe segmenti rrugor Kashar-Rinas	100	0	0%
Transporti Rrugor	Supervizion - Plotesim-rifreskim i sinjalistikes vertikale/horizontale ne	100	0	0%

	akset kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore			
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh te tjera	100	0	0%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh ndertim rruga Kukës Morine loti 1 (vepra arti te medha) dublimi shtese kontrate	865	865	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh sistemim asfaltim rruga Librazhd Q.Stude Loti 3	14.883	14.883	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim rruga e Arberit (dalja e Ures se Vashes - Bulqize) Loti 1	81	81	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh ndertim rruga e Arberit(dalja e Ures se Vashes - Bulqize) loti 3	6.000	6.000	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim rruga Kardhiq - Delvine, Loti 1 shtese punimesh	167	167	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim rruga Kardhiq - Delvine, Loti 2	500	500	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim rruga Kardhiq - Delvine, Loti 3	500	500	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 1	700	699	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 2	196	196	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Rikonstruksion segmenti rrugor Koder-Kamez Tapize	730	729	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Sistemim Asfaltim Rruga Korce- Erseke Loti 1	800	800	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Sistemim Asfaltim Rruga Kukës-Krume Loti1	444	444	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim rruga	545	545	100%

	Qukes-Q.Ploce Loti I			
Transporti Rrugor	Supervizion Punimesh Masa inxhinierike dhe plotësimi i rrugës Elbasan-Gjinar.	10	0	0%
Transporti Rrugor	Supervizion Punimesh Masa inxhinierike në segmentin rrugor Buzuq-Çorovodë.	10	0	0%
Transporti Rrugor	Supervizion Punimesh Masa inxhinierike në segmentin rrugor Oriku-Llogara (Zona Dukat).	10	0	0%
Transporti Rrugor	Supervizion Punimesh Riveshjete dhe sistemim asfaltim ne aksin rrugor Berat-Buzuq	10	0	0%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Rikonstruksion I rruges Shkoder (mbikalimi i trenit)-Mes.	10	0	0%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim unaza e Kavajes	329	329	100%
Transporti Rrugor	Supervizion punimesh Ndertim rruga Qeparo - Sarande, Loti 4 shtese punimesh	170	170	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim Oponence teknike (K.lidhur)	3.066	3.066	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim masa inxhinierike ne rrugen nacionale Buzuq-Çorovodë	7.000	7.000	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim i Plotesimit te sinjalistikes e sigurise rrugore dhe eleminimi i pikave te zeza ne akset Nacionale	10.000	0	0%
Transporti Rrugor	Studim fizibiliteti dhe projektim te rrugeve te zones Thumane-Fushe Kruje-Vore-Kashar	5.000	0	0%
Transporti Rrugor	Studim Projektim i Rikonstruksionit te rruges se Parkut Arkeologjik Bylis-rruga e re Levan-Tepelene	100	0	0%
Transporti Rrugor	Studim Projektim Riveshje Sistemim	100	0	0%

	asfaltim rruga Elbasan-Banje			
Transporti Rrugor	Studim projektim rruga Koman-Fierze	10.000	10.000	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim masa inxhinierike aksi Ura Skuraj- Burrel-Bulqize-Peshkopi	100	0	0%
Transporti Rrugor	Studim Projektim masa inxhinierike aksi Q.Mali Fierze dhe mbrojtja e Ures se Drinit	100	0	0%
Transporti Rrugor	Studim Projektim dublimi I rruges kashar - Rinas	100	0	0%
Transporti Rrugor	Studim Projektim Unaza Korce - Voskop	100	0	0%
Transporti Rrugor	Studim Projektim rruga Hidrocentrali I Banjes - Gramsh	8.000	8.000	100%
Transporti Rrugor	Konsulence per procedurat e akreditimit te laboratorit	5.000	4.980	100%
Transporti Rrugor	Studim fizibiliteti i aksit Skrapar (Gramsh, Permet - Korce)	400	0	0%
Transporti Rrugor	Studim projektim zgjerimi I Superstrades Tirane - Durres	100	0	0%
Transporti Rrugor	Studim projektim masa inxhinjerike ne aksin Vlore - Sarande dhe Fier - Ballsh - Tepelene	400	0	0%
Transporti Rrugor	Studim Projektim Sistemim Asfaltim rruga Boge -Theth	7.930	7.930	100%
Transporti Rrugor	Studim fizibiliteti, projektide,projekt zbatim Ndertim rruga Theth- Valbone	1.109	1.109	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim Projekt rruga e Porto Romanos - Durres	7.912	7.912	100%
Transporti Rrugor	Projektzbatimi I rruges Kardhiq - Delvine	15.679	15.677	100%
Transporti Rrugor	St.Proj. projekt zbatimi rruga Ura e Brarit-Hyrje tuneli Qafe Murrize	14.000	14.000	100%
Transporti Rrugor	St.Proj. projekt zbatimi rruga hyrje tuneli Qafe Murrize-Dalje Ura e Vashes	35.000	35.000	100%

Transporti Rrugor	Studim Projektim Sistemim Asfaltim rruga Hani Hotit - Vermosh (Loti 1)	11.505	11.505	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim rruga Shengjin - Kune	1.198	1.198	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim rruga F.Stude - Ura Cerenecit (Peshkopi) Loti 1	7.981	7.981	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim Sistemim Asfaltim rruga Erseke -Leskovik -Loti 1	11.785	11.785	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim Sistemim Asfaltim rruga Erseke -Leskovik - Loti 2	9.456	9.456	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim rruga Tepelene - Vlore (Loti 1)	19.525	19.525	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim Sistemim Asfaltim K/Patos - Roskovec - Ura Vajgurore	6.461	6.461	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim dhe projekt zbatimi aksi Ura e Leklit - Permet -Carshove	28.000	28.000	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim Projekt Zbatimi rruga Rreshen - Urake (Loti 1)	6.746	6.746	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim Projekt Zbatimi rruga Urake - Ura e Shoshajt (Loti 2)	7.782	7.782	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim fizibilitet dhe projekt zbatim rruga Tirane -Ndroq -Plepa	10.810	10.810	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim Ndertim Ura e Drinit ne aksin Kalimash - Kukes	10.925	10.925	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim nyja lidhese e rruges rruges Milot -Lezhe , Milot-Rreshen, Milot-Thumane	1.628	1.628	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim aksi Korce - ErsekeLoti 1	13.527	13.527	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim aksi Korce - ErsekeLoti 2	14.221	13.845	97%
Transporti Rrugor	Studim projektim rruga Qukes-Pogradec-Q.Plloce	43.000	43.000	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim rruga nga ajo nacionale drejt parkut arkeologjik Bylis	1.571	1.571	100%
Transporti Rrugor	Studim Projektim Sistemim Asfaltim	2.854	2.854	100%

	rruga K/Qerret - Plazh				
Transporti Rrugor	Studim Projektim Ndertim I rruges se Unazes se Jashtme te Tiranes , vazhdimi qe kalon nga kthesa e Saukut - pjesa lindore , Verilindore, Veriore e Tiranes -deri ne afersi te ktheses se Kamzes (Zyrat e AMC)	32.000	32.000	100%	
Transporti Rrugor	Studim Projektim ura e Matit (Burrel)	27	0	0%	
Transporti Rrugor	Studim Projektim Sistemim Asfaltim rruga Q.Muzine -Delvine	3.719	3.719	100%	
Transporti Rrugor	Studim Projektim rruga e Bregut te Lumit- Kthesa Kamez	33.811	33.811	100%	
Transporti Rrugor	Studim Projektim rruga Teqes Berat	4.308	4.308	100%	
Transporti Rrugor	Studim Projektim permiresim i nyjes ne Kashar	2.597	2.597	100%	
Transporti Rrugor	Studim Projektim rruga Elbasan-Berat	8.368	8.368	100%	
Transporti Rrugor	Studim Projektim zgjerimi i rruges Sukth- Hamallaj ,	5.579	5.579	100%	
Transporti Rrugor	Studim Projektim rruga Dragobi - Cerem	10.455	10.455	100%	
Transporti Rrugor	Studim Projektim Sistemim Asfaltim rruga Kukes-Krume	8.639	8.639	100%	
Transporti Rrugor	Studim Projektim rruga Bajram Curri - Cernice dhe mbrojtja e Ures se Bujanit	3.166	3.166	100%	
Transporti Rrugor	Studim Projektim Sistemim Asfaltim rruga Kam - Qafe Prush	5.030	5.030	100%	
Transporti Rrugor	Studim Projektim Sistemim Asfaltim rruga Hani Hotit - Vermosh (Loti 2)	12.206	12.206	100%	
Transporti Rrugor	Studim Projektim rruga, (Laknas - Kamez Superstrade)	2.120	2.120	100%	
Transporti Rrugor	Ndërtim rruga Milot - F. Kruje (dublimi i superstradës)Loti 3 (sinjalistikë rrugore)	35.408	35.408	100%	Nuk punohet,ndryshime ne projekt
Transporti Rrugor	Detailed Design and Preparation of Work Dokuments for Thirre - Kolsh	14.303	14.303	100%	E mbyllur

	and Rreshen - Rejs				
Transporti Rrugor	Menaxhimi e Mirembajtja dhe operimi I tunelit te Krrabes	61.100	51.772	85%	
Transporti Rrugor	Menaxhimi e Mirembajtja dhe operimi I tunelit te Krrabes(emergjenca)	39.370	39.342	100%	
Transporti Rrugor	Permiresimi i sigurise dhe sinjalistikes rrugore ne superstraden Tirane-Durres dhe segmenti rrugor Kashar-Rinas Loti 1	230.000	229.989	100%	
Transporti Rrugor	Permiresimi i sigurise dhe sinjalistikes rrugore ne superstraden Tirane-Durres dhe segmenti rrugor Kashar-Rinas Loti 2(Rrethrotullimi I Doganes-Mbikalimi I Kasharit)	20.000	0	0%	
Transporti Rrugor	Menaxhimi e Mirembajtja e pajisjeve dhe operimi i tunelit te Thirres-Rreshen- Kalimash (Kontrata e re)	86.808	86.808	100%	
Transporti Rrugor	Menaxhimi e Mirembajtja e pajisjeve dhe operimi i tunelit te Thirres-Rreshen- Kalimash (Shtese kontrate 2014)	23.192	23.132	100%	
Transporti Rrugor	Plotesim-rifreskim i sinjalistikes vertikale/horizontale ne akset kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore	426.291	383.607	90%	
Transporti Rrugor	Plotesim-rifreskim i sinjalistikes vertikale/horizontale ne akset kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore(shtese kontrate)	83.768	79.578	95%	
Transporti Rrugor	Furnizimi dhe vendosje me Guard rail ne aksin Kalimash-Morine	22.953	22.953	100%	Nuk punohet
Transporti Rrugor	Menaxhimi funksionimi e Mirembajtja e pajisjeve dhe operimi i tunelit te Thirres te autostrades Reshen-Kalimash (Kontrate e Re 2013)	81.294	81.294	100%	
Transporti Rrugor	Kosto Lokale Supervizion ndertim	7.048	7.048	100%	

	segmenti Fier - Vlore, (Levan-Vlore)			
Transporti Rrugor	Kosto Lokale Supervizion ndertim segmenti Fier (Levan-Tepelene)	135.777	135.777	100%
Transporti Rrugor	Kosto Lokale Ndertim Segmenti Fier (Levan-Tepelene)	1.265.565	1.265.565	100%
Transporti Rrugor	Kosto Lokale Projekti i Transportit Mirembajtje Tirana -Kukesi	46.602	23.301	50%
Transporti Rrugor	Kosto Lokale Projekti i Transportit Konsulence	4.148	0	0%
Transporti Rrugor	Kosto Lokale ndertim Rruga Sarande - Konispol	20.387	17.728	87%
Transporti Rrugor	Kosto Lokale Ndertim nyja e Vores dhe rruget paralele	40.425	28.467	70%
Transporti Rrugor	Kosto Lokale ndertim tuneli Rruga Tirane - Elbasan	2.300	1.348	59%
Transporti Rrugor	Kosto Lokale Ndertim rruga Bypas Shkozet, Durres	72.928	43.824	60%
Transporti Rrugor	Kosto Lokale Asistence Teknike per ARRSH	8.050	720	9%
Transporti Rrugor	Kosto Lokale Asistence Teknike nga IPA-Acrosse	1.642	383	23%
Transporti Rrugor	Kosto Lokale Asistence Teknike Siguria Rrugore - IPA	6.350	0	0%
Transporti Rrugor	Kosto Lokale pagesa per Koorporaten Nderkombetare Financiare (IFC) per zbatimin dhe pjesmarrjen e sektorit privat ne autostraden Milot - Morine.	6.800	6.741	99%
Transporti Rrugor	Kosto Lokale Ndertim aksi rrugor Shkoder - Hani I Hotit	535.820	486.445	91%
Transporti Rrugor	Kosto Lokale Supervizion i rruges Shkoder - Hani I Hotit	22.138	12.151	55%
Transporti Rrugor	TVSH e T.D. Supervizion Ndertim Rruga Fier (Levan) - Tepelene	29.729	29.678	100%
Transporti Rrugor	T.V.SH.e T.D. Projekti i Transportit Mirembajtje Tirane -Kukes	330	330	100%
Transporti Rrugor	TVSH e T.D. Ndertim Rruga Fier	245.888	245.630	100%

	(Levan) - Tepelene			
Transporti Rrugor	TVSH e T.D. Ndertim Rruga Sarande - Konispol	4.979	4.269	86%
Transporti Rrugor	TVSH e T.D. Ndertim Segmenti Rrugor Shkoder Hani I Hotit	81.540	68.353	84%
Transporti Rrugor	T.V.SH. e T.D. Ndertim nyja e Vores dhe rruget paralele	36.614	18.653	51%
Transporti Rrugor	T.V.SH. e T.D. Ndertim rruga Bypas Shkozet, Durres	93.658	25.777	28%
Transporti Rrugor	T.V.SH. e T.D. Ndertim rruga Bypas Durres	115.780	115.780	100%
Transporti Rrugor	TVSH e T.D. Ndertim tuneli Aksi Tirane - Elbasan	14.399	13.072	91%
Transporti Rrugor	TVSH e T.D. Projekti I Mirembajtjes (Banka Boterore)	12.520	9.551	76%
Transporti Rrugor	TVSH e T.D. By Pass I Fierit	288.560	288.560	100%
Transporti Rrugor	TVSH e T.D. Asistence Teknike per DPRr	1.457	1.457	100%
Transporti Rrugor	TVSH e T.D. Asistence Teknike nga IPA-Acrosse	648	0	0%
Transporti Rrugor	TVSH e T.D. Asistence Teknike Siguria Rrugore - IPA	2.693	0	0%
Transporti Rrugor	TVSH e T.D. Ndertim segmenti 1, aksi Tirane - Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli I Krrabes km 13)	308.772	140.243	45%
Transporti Rrugor	TVSH e T.D. Supervizion dhe Rishikim I projektit te detajuar segmenti 1, aksi Tirane - Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli I Krrabes km 13)	23.873	23.178	97%
Transporti Rrugor	TVSH e T.D. Ndertim segmenti 3, aksi Tirane - Elbasan (Dalje tuneli I Krrabes km 15.20 - Elbasan km 27)	192.826	114.340	59%
Transporti Rrugor	TVSH e T.D. Supervizion dhe Rishikim I projektit te detajuar segmenti 3, aksi Tirane - Elbasan (Dalje tuneli I Krrabes km 15.20 -	23.358	21.057	90%

	Elbasan km 27)			
Transporti Rrugor	TVSH e T.D. Supervizion per punimet Ndertim tuneli Aksi Tirane - Elbasan	6.302	4.564	72%
Transporti Rrugor	TVSH e T.D. Kostor operative te Njesise se Re te Menaxhimit te Projektit.	116	59	51%
Transporti Rrugor	TVSH Audit Projekti i rruges "Tirane - Elbasan "	640	173	27%
Transporti Rrugor	TVSH e takse doganore Supervizion i segmentit rrugor Shkoder - Hani I Hotit	4.934	2.430	49%
Transporti Rrugor	TVSH e T.D.Ndertim segmenti "Qukes-Qafe Plloce"	35.780	0	0%
Transporti Rrugor	TVSH e T.D. Ndertim By Pass i Rrogozhines	39.468	26.349	67%
Transporti Rrugor	TVSH e T.D.Rruga e Arberit	2.316	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Furnizimi me uje I plazheve Durres - Kavaje nga pusshpimet e Çermes, Loti I: <i>Dublimi i pusshpimeve ekzistuese, rikonstruksioni i Stacionit Qendror dhe ndertimi i rezervuarit 1000 m3, linjat e ujesjellesit pusshpime - Stacion Qendror, linja e ujesjellesit Stacion Qendror Çërme deri tek ura e Rrogozhines Piketa 426, rikonstruksioni i linjave elektrike</i>	1.000	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin: Furnizimi me uje I plazheve Durres - Kavaje nga pusshpimet e Çermes, Loti I: <i>Dublimi i pusshpimeve ekzistuese, rikonstruksioni i Stacionit Qendror dhe ndertimi i rezervuarit 1000 m3, linjat e ujesjellesit pusshpime - Stacion Qendror, linja e ujesjellesit Stacion Qendror Çërme deri tek ura e Rrogozhines Piketa 426,</i>	88	0	0%

<i>rikonstruksioni i linjave elektrike</i>				
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes, Loti III: <i>Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres</i>	100.000	96.370	96%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin: Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes, Loti III: <i>Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres</i>	1.500	1.500	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Furnizimi me uje i qytetit Kukës dhe te 14 fshatrave rreth saj	1.000	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Furnizimi me uje i qytetit Puke, rrjeti i jashtem dhe i brendshem	9.651	9.651	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Furnizim me uje me pus c'pime i plazhit Divjake dhe zgjerim i rrjetit Divjake	51.750	49.335	95%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim ujesjellsi rajonal Novosej-Shishtavec-Mborje, komuna Shishtavec Kukës	5.396	5.395	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per ndertimin e ujesjellesi rajonal Novosej-Shishtavec-Borje, Kom. Shishtavec, Kukës	116	116	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Furnizim me uje i zonave rurale Rreshen, rrjeti shperndares, faza e dyte.	130.000	129.999	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh I objektit "Furnizimi me uje I zonave rurale Rreshen, rrjeti shperndares, faza e dyte.	2.000	2.000	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Furnizim me uje I zonave rurale Rreshen, rrjeti shperndares, faza e dyte. (Shtese kontrate)	40.000	39.999	100%

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh I objektit "Furnizimi me uje I zonave rurale Rreshen, rrjeti shperdares, faza e dyte. (Shtese kontrate)	700	576	82%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per ndertimi i Kolektorit kryesor te ujrave te zeza Sarande, Derdhja ne IPUZ	135	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Trajtimi i vepres H/C Banje	10.000	8.224	82%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Perfundimi i rrjetit te Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne zonen e Perroi i Agait - Qerret, LOTI I (Fshati Golem, linjat KUZ Stacioni i Pompave Nr.2 deri tek Stacioni i Pompave Nr.4)	139.200	139.184	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per perfundimin e rrjetit te Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne zonen e Perroi I Agait - Qerret, Loti I (Fshati Golem, Linjat KUZ Stacioni pompave Nr.2 deri tek Stacioni I pompave Nr.4	1.500	1.383	92%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim ujesjellesi i fshatit Shenavlash, Komuna Rrashbull, Qarku Durres	38.168	38.168	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin "Ndertim ujesjellesi I fshatit Shenavlash, Komuna Rrashbull, Qarku Durres"	200	200	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertimi i pusshpimeve te rinj dhe rehabilitimi i ujesjellesit te fshatrave Suke 1 dhe pjeserisht Suke 2	14.564	10.303	71%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion Punimesh per objektin "Ndertimi i pusshpimeve te rinj dhe rehabilitimi I ujesjellesit te fshatrave Suke 1 dhe pjeserisht Suke 2"	268	240	90%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim KUZ I fshatit Armen, Qarku Vlore	20.000	19.972	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion Punimesh per objektin	300	290	97%

Kanalizime	Ndertim KUZ I fshatit Armen, Qarku Vlore			
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim ujesjellesi Kurjan	62.581	62.579	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin: "Ndertim ujesjellesi Kurjan"	400	400	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikonstruksion I Ujesjellesit te fshatit Greshice, Komuuna Greshice, Mallakaster	30.000	30.000	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin: "Rikonstruksion I Ujesjellesit te fshatit Greshice, Komuuna Greshice, Mallakaster"	406	406	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Sistemimi I Kanalizimeve te Ujrave te Zeza per fshatin Deshiran, Komuna Grekan, Elbasan	27.988	27.987	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion Punimesh per objektin: "Sistemimi I Kanalizimeve te Ujrave te Zeza per fshatin Deshiran, Komuna Grekan, Elbasan"	471	405	86%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim Ujesjellesi depo Lapulec - depo Lofkend, rrjeti shperndares Lofkend - Granice (Faza II), Komuna Qender Mallakaster	35.935	35.935	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin: "Ndertim Ujesjellesi depo Lapulec - depo Lofkend, rrjeti shperndares Lofkend - Granice (Faza II), Komuna Qender Mallakaster"	200	200	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim depo uji V = 1000 m3 per qytetin Ballsh, SHA Ujesjelles Ballsh	50.362	49.540	98%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin: "Ndertim depo uji V = 1000 m3 per qytetin Ballsh, SHA Ujesjelles Ballsh"	400	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Furnizimi me uje I qytetit Peqin (Shtese Kontrate)	7.000	7.000	100%

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin: "Furnizimi me uje I qytetit Peqin (Shtese Kontrate)"	510	297	58%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Kanalizimet e Ujrave te Zeza ne fshatin Vishocice, Komuna Qender Bilisht	10.000	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin: "Kanalizimet e Ujrave te Zeza ne fshatin Vishocice, Komuna Qender Bilisht"	10	10	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ujesjellesi I fshatit Mançurisht, Komuna Proger, Devoll	17.052	17.051	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin: "Ujesjellesi I fshatit Mançurisht, Komuna Proger, Devoll"	150	24	16%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim I kolektorit kryesor te ujrave te zeza Sarande, derdhja ne IPUZ(shtese kontrate)	7.520	7.520	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin "Ndertimi I kolektorit kryesor te ujrave te zeza Sarande,derdhja me IPUZ.(shtese kontrate)	145	135	93%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	KUZ rrjeti sekondardhe tercial ne qytetin e vlores(Shtese kontrate)	10.000	9.944	99%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikonstruksion I ambjenteve te tualeteve dhe zyrave te DPUK.	3.000	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Shpronesime per objektet buxhetore	2.000	197	10%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rehabilitimi I ujesjellesit zona D, linja kryesore+depo uji, qyteti Bulqize	17.750	16.998	96%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin "Rehabilitimi i ujësjellësit zona D, linja kryesore+depo uji, qyteti Bulqizë"	250	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikonstruksion ujësjellësi Bulqizë, rrjeti shpërndarës, Faza II (linja shpërndarëse dhe linjat sekondare)	17.750	17.750	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin	250	242	97%

Kanalizime	"Rikonstruksion ujësjellësi Bulqizë, rrjeti shpërndarës, Faza II (linja shpërndarëse dhe linjat sekondare)			
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndërtim ujesjellesi i 5 fshatrave te Komunes Fratar, Mallakaster	16.000	16.000	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin ndertim ujesjellesi i 5 fshatrave te Komunes Fratar Mallakaster	200	200	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ujesjellesi i fshatit Shalës,lagjet Blate "Kurtalli" dhe Blate " Xhikallare" Komuna Shales, Elbasan	14.600	14.540	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin Ujesjellesi i fshatit Shalës,lagjet Blate "Kurtalli" dhe Blate " Xhikallare" Komuna Shales, Elbasan	175	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndërtim ujësjellësi rajonal të Komunës Bradashesh për fshatrat, Bradashesh, Fikas, Shijon Balez, Kusardh,Karakullak, Katund i ri (shtese kontrate), Komuna Bradashesh	9.950	9.950	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin ndërtim ujësjellësi rajonal të Komunës Bradashesh për fshatrat, Bradashesh, Fikas, Shijon Balez, Kusardh,Karakullak, Katund i ri (shtese kontrate), Komuna Bradashesh	138	138	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Sistemim asfaltim rruga Kuçovë-Perondi, likujdim i vleres se garancise se punimeve	1.207	1.206	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikonstruksion i linjës kryesore Cukas - Fiershegan dhe Fiershegan - Barbullinjë	6.900	6.897	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh për rikonstruksion e linjës kryesore Cukas - Fiershegan dhe Fiershegan - Barbullinjë	100	100	100%

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikonstruksion i ujësjellësit të fshatit Koshtan (linja e dërgimit nga burimi në depon 50m3) Komuna Qesarat, Tepelenë	5.200	5.198	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh për rikonstruksionin e ujësjellësit të fshatit Koshtan (linja e dërgimit nga burimi në depon 50m3) Komuna Qesarat, Tepelenë	100	100	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Furnizimi me ujë i fshatit Jorgucat me pus cpimi	11.350	11.349	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh për objektin furnizimi me ujë i fshatit Jorgucat me pus cpimi	150	150	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Sistemim i ujrave të zeza lagjia 11 Janari (poshtë shtëpisë së pritjes)	3.640	3.640	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh për objektin sistemim i ujrave të zeza lagjia 11 janari (poshtë shtëpisë së pritjes)	60	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Kanalizime të ujrave të zeza, fshati Maliq	2.800	1.973	70%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin kanalizime te ujrave te zeza, fshati Maliq	60	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Kanalizime e ujrave të zeza të fshatrave Balaj, Mucine, Celebi, Komuna Trebisht	7.400	7.400	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh për objektin kanalizime të ujrave të zeza të fshatrave Balaj, Mucine, Celebi, Komuna Trebisht	100	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndërtim i ujësjellësit Markat - Ninat dhe rrjeti i brëndshëm Loti I, Komuna Markat	6.400	6.400	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh për objektin ndërtim i ujësjellësit Markat - Ninat dhe rrjeti i brëndshëm Loti I, Komuna	100	100	100%

	Markat			
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ujësjetllësi Maja e Lugut - Kraste (faza e dyte perfundimtare)	7.400	7.399	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh për objektin:Ujësjetllësi Maja e Lugut - Kraste (faza e dyte perfundimtare)	100	100	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	"Ndërtim kolektori i ujrave të zeza, fshati Drashovicë".	10.300	10.299	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh për objektin:"Ndërtim kolektori i ujrave të zeza, fshati Drashovicë".	200	160	80%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	"Zevendesim i tubacionit DN 500 mm Çelik me tubacion DN 250 mm me gize sferiodale"	3.300	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin:"Zevendesim i tubacionit DN 500 mm Çelik me tubacion DN 250 mm me gize sferiodale"	100	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	"Ndertim ujesjetllësi i fshatit Salari" Komuna Qender Tepelene	6.500	6.500	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin:"Ndertim ujesjetllësi I fshatit Salari" Komuna Qender Tepelene	100	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	"Rikonstruksion magjistrali ujësjetllësit të qytetit Patos"	7.300	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizioni i punimeve për objektin: "Rikonstruksion magjistrali ujësjetllësit të qytetit Patos"	100	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	"Rikonstruksion i ujësjetllësit fshatit Melgushë" faza e II Komuna Bushat	13.200	13.200	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizioni i punimeve për objektin"Rikonstruksion i ujësjetllësit fshatit Melgushë" faza e II Komuna Bushat	100	100	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	"Ndërtim i ujësjetllësit me vetrrjedhje	7.000	7.000	100%

Kanalizime	Bënçë - Veliqot " Komuna Qëndër Tepelenë			
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizioni i punimeve për objektin:"Ndërtim i ujësjellësit me vetrjedhje Bënçë - Veliqot " Komuna Qëndër Tepelenë	100	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	"Rikonstruksion i ujësjellesit Karbunar (Nga Vaini në depon 200 m3 Balaj) Komuna Karbunar	4.000	4.000	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizioni i punimeve për objektin:"Rikonstruksion i ujësjellesit Karbunar (Nga Vaini në depon 200 m3 Balaj) Komuna Karbunar	100	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	"Rrjeti i jashtëm i ujësjellësit me vetrjedhje i fshatit Palasë dhe i komplekseve turistike" Bashkia Himarë.	6.000	6.000	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizioni i punimeve për objektin: "Rrjeti i jashtëm i ujësjellësit me vetrjedhje i fshatit Palasë dhe i komplekseve turistike" Bashkia Himarë.	100	100	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	"Rehabilitimi i rezervuarit 4000 m3 Gryemire"	12.950	12.950	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizioni i punimeve për objektin:"Rehabilitimi i rezervuarit 4000 m3 Gryemire"	150	150	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	"Ndërtim i linjës së jashtme të ujësjellësit Ballsh"	4.350		0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh per objektin:"Ndërtim i linjës së jashtme të ujësjellësit Ballsh"	150	150	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh për objektin: "Ndërtim ujësjellësi Shirokë (faza e fundit) lidhja e matësave me konsumatorët"	50	50	100%

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	"Ndërtim ujësjellësi të fshatit Romës" Komuna Hekal	15.750	15.750	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh për objektin:"Ndërtim ujësjellësi të fshatit Romës" Komuna Hekal	175	175	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	"Ndërtim depo uji tip kulle për ujësjellësin Thumanë" Komuna Thumanë	2.750	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh për objektin:"Ndërtim depo uji tip kulle për ujësjellësin Thumanë" Komuna Thumanë	50	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	"Ndërtim i linjës për furnizimin me ujë nga depo Tepelenë për qytetin e Memaliajt"	7.000	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh për objektin:"Ndërtim i linjës për furnizimin me ujë nga depo Tepelenë për qytetin e Memaliajt"	210	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	"Ndërtim i rrjetit të K.U.Z për fshatit Kashisht" Komuna Frakull	7.000	7.000	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh për objektin:"Ndërtim i rrjetit të K.U.Z për fshatit Kashisht" Komuna Frakull	100	100	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	"Ndërtim i rrjetit të K.U.Z të fshatit Vajkan" Komuna Mbrostar.	18.000	18.000	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh për objektin:"Ndërtim i rrjetit të K.U.Z të fshatit Vajkan" Komuna Mbrostar.	200	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	"Rikonstruksion ujësjellësi i qytetit Librazhd"	10.000	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh për objektin: "Rikonstruksion ujësjellësi i qytetit Librazhd"	300	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndërtim i linjës së ujësjellësit nga rezervuari i Baksit deri në rezervuarin e	5.618	0	0%

	Reçit,punime mbrojtëse në linjën e tubit DN 560 mm në fshatin Baks,automatizimi i stacionit të Trushit, linja elektrike			
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Supervizion punimesh për objektin"Ndërtim i linjës së ujësjellësit nga rezervuari i Baksit deri në rezervuarin e Reçit,punime mbrojtëse në linjën e tubit DN 560 mm në fshatin Baks,automatizimi i stacionit të Trushit, linja elektrike"	170	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rrjeti i brendshem i ujesjellesit ne Lagjen 4 Baba Rexhepi, dhe Lugu i Dardhes	22.531	15.105	67%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim Ujesjellesi Dhermi	8.012	7.926	99%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim i Ujesjellesit Fresko Dhermi	5.047	4.986	99%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim i Ujesjellesit Ksamil (vazhdim)	6.168	6.125	99%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Projekti i ujesjellesit te fshatit Manastir (vazhdim)	14.186	1.457	10%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim I ujesjellesit te fshatit Muriqan	18.915	18.915	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim I ujesjellesit Shengjin	5.692	5.692	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim KUZ, fshati Bulcar	4.881	4.881	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim I ujesjellesit te fshatit Sutaj dhe lagjes Qender te fshatit Rrajce	6.077	6.077	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim KUZ Lagjia Veriore (me 13 485 000 L dhe lagjia jugore 2 722 000 L (shitesa)	8.108	8.108	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ujesjellesi i fshatit Kolonje	156	156	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikonstruksion ujesjellesi Qilarisht	7.594	7.594	100%

Kanalizime				
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikonstruksion i ujesjelleit i Fshatit Pavar	299	299	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Kanalizime te ujrave te zeza Dhemblan	3.817	3.817	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ujesjellesi i fshatit Baban	8.470	8.470	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rrjeti i jashtem i ujesjellesit Verlen	7.674	7.674	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Projektim pus shpimi per furnizimin me uje te fshatit Symiz	110	110	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikonstruksion i rrjetit te brendshem te ujesjellesit te fshatit Kalivac.	186	186	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim I ujesjellesit te Tobit(Metaliaj) dhe Tyreganit(Kapice, Branog)	2.231	2.231	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ujesjellesi per lagje Ali Vataj	148	148	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ujesjellesi I fshatit Kokez-Dushaj	4.172	4.172	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim ujesjellesi Gjorm I Poshtem	922	922	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikonstruksion ujesjellesi Kryezi (faza II)	158	158	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikonstruksion I ujesjellesit egzistues, fshati Palluce	179	179	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ujesjellesi ne fshatin Kullaj-Rrethina, faza e III	11.450	11.450	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim I rrjetit te KUZ per fshatrat Bushat 2, Rranxa 2, Fshati I Ri 2, Barbullush 2, Faza I	22.608	22.608	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim ujesjellesi fshati Yrshek	23.427	23.427	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikonstruksion I ujesjellesit Qender Zall Bastar	7.580	7.580	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim ujesjellesi Mushqeta	216	216	100%

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Kanalizimi I ujrave te zeza, Petrele	3.655	3.655	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ujesjellesi I fshatit Skuterre	672	672	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim ujesjellesi fshati Fushe -Verri	3.250	3.250	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Kuz I fshatrave Llakatund dhe Shushice	18.403	18.403	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikonstrukcion I rrjetit te brendshem te ujesjellesit Selenice	1.190	1.190	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim KUZ ne fshatin Pellumbas	12.192	10.031	82%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ujesjellesi Paftal - Galine	480	480	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim KUZ I fshatit Magjate	7.289	7.289	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ujesjellesi Rreth Tapi	327	327	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	KUZ, fshati Therepel	5.265	5.265	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ujesjellesi I fshatit Prishte	106	106	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Furnizimi me uje I disa fshatrave te Komunes Shupenze	31.549	31.549	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ujesjellesi I fshatit Shoshaj	12.866	12.866	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ujesjelesi I fshatit German(Rrjeti shperndares I fshatit Muzhake)	15.689	15.580	99%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikonstrukcion I kaptazheve te ujesjellesit te fshatit Macukull	170	148	87%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim I KUZ, fshati Hardhishte, Lagjia e Greceve	10.151	10.151	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Furnizimi me uje te pijshem I fshatit Shenavlash9Linja Autostrade-Fshati Shenavlash)	180	180	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Sistemimi I ujrave te ndotura, Lagjia	402	402	100%


Kanalizime	nr.14 Shkozet			
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Shtrim linje te re ujesjellesi Rashbull, zona prane shkolles Shkallnur	5.301	4.891	92%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Permiresimi I furnizimit me uje, zona Spitalle Porto-Romano	4.830	4.830	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ujesjellesi I fshatit Trojas-Zekth(linja e dergimit, shperndarejes dhe depo b/a 100m3	324	24	7%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikonstrukcion ujesjellesi I fshatit Banje e Re-Trunc	154	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim ujesjellesi I fshatit Mirake, lagje Gjovaç	252	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Furnizimi me uje I fshatrave Suke 1 dhe Arapaj	18.733	18.079	97%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Furnizimi me uje I qytetit te Roskovecit	9.307	8.700	93%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ujesjellesi I fshatit Kolonje	26.726	26.726	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertimi I ujesjellesit per furnizimin e fshatrave Lapulec, Lofkend nga depo e Kashit dhe linja e shperndarjes per Lapulec	29.145	29.145	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikonstrukcion I ujesjellesit te qytetit Milot	57.143	53.895	94%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ujesjellesi I fshatit Rashtan	1.065	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	KUZ fshati Letaj(lagjet Qunaj, Bardhosh-Kamber)	4.882	4.470	92%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	KUZ, fshati Velmish	41.022	40.812	99%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Fondi per Zhvillimin e Rajoneve	645	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rehabilitimi dhe kthimi ne gjendjen fillestare te rrugeve ku ndertohej rrjeti I kanalizimeve te ujerave te zeza te perdoura ne kuader te projektit	150.377	80.000	53%

	kanalizimi te ujerave te perdorura Korca IV-IPA 2010			
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Shpronisim per interes publik te pronave te pasurive te paluajtshme, prone private qe preken nga ndertimi I segmentit rrugor,Skele-Uji I Ftohte, Bashkai Vlore	225.235	70.800	31%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikostruksioni ujesjellesit fshati Petrele (DP)	4.378	4.378	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	KUZ Dushk	711	711	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim I ujesjellesit Toblit-Tregtanit(Kapica-Branoge),Komuna Fajze Has	14.856	14.856	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertim I ujesjellesit Fishte	90	90	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikostruksion I ujesjellesit Agimi Libofsh	911	911	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rikostruksion I ujesjellesit 4 fshatrat Shushice,drithas,Grabian,Mekat	11.777	11.683	99%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Prone private qe preken nga ndertimi impiantit te trajtimit te ujrave te perdorura ne qytetin e Korces	12.025	12.025	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Studim projektim per furnizimin me uje te zonave te plazhit Durres - Kavaje nga pusshpimet e Rrogozhines (Shtese kontrate per lidhjen me stacionin e pompave te Çermes)	1.435	1.435	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Studim projektim per furnizimin me uje te zones se Dumrese, Elbasan	5.345	5.344	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Oponence teknike	500	499	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Studim projektim I sistemitte KUZ,ne zonen turistike te Spillese.	82	782	954%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	TVSH Projekti i menaxhimit te integruar te ujrave dhe ekosistemit	17.500	17.499	100%

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	TVSH Mbeshtetje per Rrjetin Hidrik te Tiranes (AT fin.per NUK , Per nderhyrjet e metejshme ne rrjetin ujesjelles kanalizime 20.3 + 32.9 mid IT)	3.887	2.187	56%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	TVSH Furnizimi me uje i zones se Vlores (Orikum, Dukat, Tragjas, Radhime)	63.000	63.000	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	TVSH Ujesjellesi dhe ujrat e perdorura Shkoder	53.500	53.499	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	TVSH Linja e dergimit te KUZ per qytetet e Lezhes dhe Shengjinit ne ITUP, Lot 3, IPA 2007	5.307	4.676	88%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	TVSH Ndertimi i sistemit te ri te KUZ ne zonen turistike Golem, IPA 2007	19.389	19.288	99%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	TVSH Ndertimi i sistemit te ri te KUZ ne zonen turistike Durres, IPA 2007	32.778	32.740	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	TVSH Projekti i kanalizimeve te Tiranes se madhe	511.562	511.276	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	TVSH Projekti i Ujesjellesit te Bilishtit	80.000	79.999	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	TVSH Mbrojtja Mjedisore e liqenit te Ohrit, Kanalizimet e Ujrave te Zeza, Pogradec (Faza III)	115.449	115.448	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	TVSH Programi i Infrastruktures Komunale I per qytetet Fier, Gjirokaster, Sarande dhe Lezhe	14.854	14.853	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	TVSH Menaxhimi i mbetjeve Urbane te Tiranes (faza e dyte) impianti i pastrimit te ujrave te ndotura	410	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	TVSH Kanalizime Korce IV IPA 2010	39.016	37.099	95%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	TVSh ndertimi I sistemit te KUZ ne zonen e Velipojes dhe Shkodres IPA 2007	36.735	36.734	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	TVSH ndertimi I sistemit te KUZ per	81.721	81.114	99%

Kanalizime	zonen e per 4 qytetet Vlore,Ksamil,Kavaje,Shengjin IPA 2009			
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	TVSH programi i Infrastruktures Komunale II per qytet Kames, Lushje, Berat, Kucove, Fier, Sarande..	27.371	27.371	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndertimi I sistemit te kUZ dhe impianti i trajtimit te ujrave te zeza ne Velipoje, IPA 2010	25.828	25.827	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	TVSH përfundimi i sistemit të KUZ dhe ITUP në zonën e Velipojës, Faza III, IPA 2011	71.073	68.723	97%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	T.V.SH per objektin "Furnizimi me uje Peshkopi" financim i qeverise Austriake	23.000	22.828	99%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Perfundimi I sistemit te KUZ dhe ITUP ne zonen e Veliojes IPA 2011	1.119	1.118	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Kosto Lokale projekt I ri I furnizimit me uje qytetin e Durresit	3.026	3.025	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Kosto Lokale projekti i kanalizimeve te Tiranes se madhe (shpronesime)	4.000	100	3%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Kosto Lokale Projekti i menaxhimit te integruar te ujrave dhe ekosistemit	49.000	43.007	88%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Kosto lokale Mbrojtja e liqenit te Ohrit, komponenti i ujit te pijshem dhe kanalizimet,faza e III	20.797	20.477	98%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Kosto Lokale Furnizimi me uje i zones se Vlores (Orikum, Dukat, Tragjas, Radhime)	74.900	74.774	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Kosto Lokale Perfundimi i sistemit KUZ ne zonen e Velipojes, IPA 2010	2.869	2.868	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Kosto lokale ndertim sitemit te KUZ per zonen e velipojes dh te shkodres(punime 2&3)IPA 2007	127	126	99%
TOTAL		26.544.203	25.125.573	94,7%

Paraqitja grafike si më poshtë :

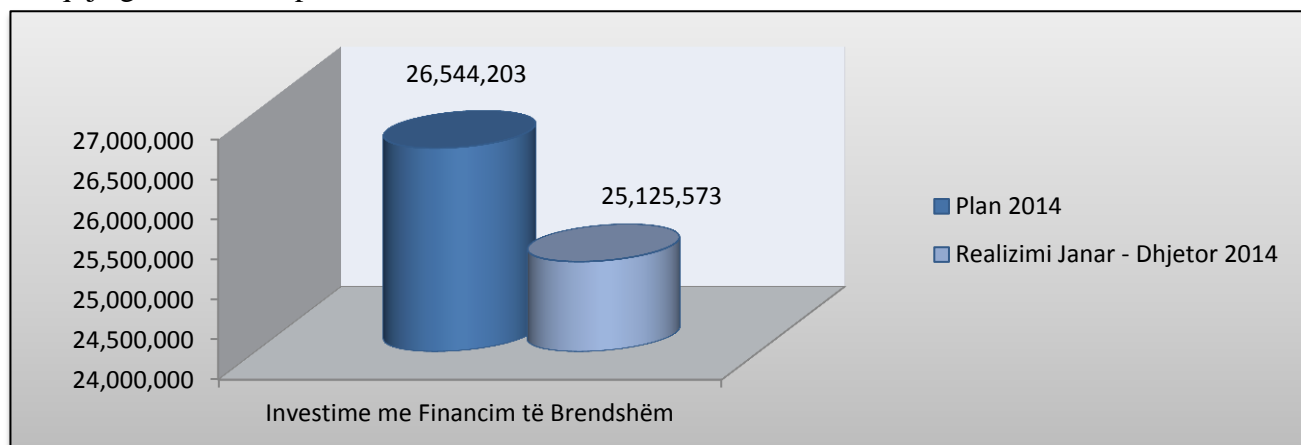

Më poshtë mund të gjeni tabelën e përmblodhur të investimeve me financim të Huaj për Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës dhe realizimin faktin të shpenzimeve kapitale për periudhë Janar – Dhjetor 2014.

MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS						
PROGRAMI	PROJEKTI	PLANI 000/lekë	REALIZIMI 000/lekë	REALIZIMI %	STATUSI	
Planifikim, Menazhim	Asistence teknike per sektoret e transportit (IPA)	50.000	39.494	79%	Ecuri normale e projektit	
Planifikim, Menazhim	Modeli Intermodal per zhvillimin e zones bregdetare te Adriatikut - INTERMODAL	14.000	2.452	18%	Ne proces implementimi te kontratava te lidhura	
Planifikim, Menazhim	Forcimi i kapaciteteve per te ndaluar rrezikun ndaj ndotjes nga nafta dhe substancat e tjera te rrezkshme ne detin Adriatik - HAZADR	15.000	4.523	30%	Ne proces implementimi te kontratava te lidhura	
MBETJET URBANE	Administrimi I mbetjeve te ngurta ne Juglindje te Shqiperise (Faza I)	54.000	7.700	14%	Kontratat ekzistuese janë mbyllur.	
MBETJET URBANE	Administrimi I mbetjeve te ngurta ne Juglindje te Shqiperise (Faza II)	55.800	31.360	56%	Eshte marre leja e ndertimit, por nuk ka filluar procedura e tenderimit per punimet e ndertimit pasi duhet te	

					perfundoj shpronësimi i tokave.
MBETJET URBANE	Administrimi I mbetjeve të ngurta në Juglindje të Shqipërisë (Faza II)	100.000	41.160	41%	Pritet të përcaktohet varianti më optimal për sistemin e menaxhimit të integruar të mbetjeve
MBETJET URBANE	Studim fizibiliteti për ndërtimin e landfillit rajonal Vlorë	130.200	23.390	18%	
Transporti Rrugor	Projekti i Mirembajtjes Banka Botërore	73.500	61.353	83%	Kontrata me konsulentin është lidhur më 18.04.2014. Stafit i ARrsh-se që monitoron këtë kontratë konsulente, kërkon shpjegime për përmirësimin / saktësimin e të dhënave të sjella prej Konsulentit në draft raportet periudore të tij. Është aprovuar data e përfundimit të kësaj kontrate në 28 Shkurt 2015 pa shtesë në kosto. Realizimi fizik 94 %
Transporti Rrugor	Asistencë teknike për ARrSH	30.000	0	0%	Marrëveshja e Grantit është negociuar me BERZH-in dhe është përgatitur drafti final, i cili u çertifikua në gjuhën shqipe. Ka ekzistuar një vonësë në rakordimin e Relacionit të përbashkët që bashkëfirmoset me Ministrinë e Financave Asistencë teknike për Mbështetjen e Zbatimit të Projektit në Shqipëri. Aktualisht është në proces përgatitja e paketës projektvendim+ relacion për në Këshillin e Ministrave.
Transporti Rrugor	Ndërtim By Pass i Vlores	346.000	0	0%	Ka përfunduar procedura e

					parakualifikimit për përzgjedhjen e Kontraktorit. Në dt.17/07/2014 janë hapur ofertat për fazën e dytë të tenderit, në të cilën u paraqitën 9 firma, nga 17 që ishin parakualifikuar. Raporti Përfundimtar i Vlerësimit tashmë ka përfunduar dhe i është dërguar bankave BERZh/BEI për “no objection”.
Transporti Rrugor	Ndertim By Pass i Rrogozhines	300.000	0	0%	Me IPA 2012 po kryhet ndërtimi i segmentit rrugor të by pasit të Rrogozhinës. Punimet për këtë segment kanë filluar në Korrik 2014 dhe po ecin me ritme të kënaqshme.
Transporti Rrugor	Ndertim By Pass i Fierit	1.259.630	2.143.407	170%	Here pas here punimet bllokohen nga banorët, si protestë për çmimin e kompensimit të tokës. ARRSH ka miratuar me Vendim të Këshillit Teknik, Nr. 11, datë 02/04/2014, ndryshimet e propozuara nga Kontraktori dhe të miratuara nga Supervizioni.
Transporti Rrugor	Ndertimi Tuneli Tirane - Elbasan	41.348	39.758	96%	
Transporti Rrugor	Ndertim Segmenti 1, Aksi "Tirane-Elbasan" (Sauk km 0-Hyrje tuneli i Krrabes km 13)	2.208.364	1.147.439	52%	Zgjatje e afatit të efektivitetit të “Marrëveshjes ISTISNA’A ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Islamike për Zhvillim (IDB) për financimin e projektit të

rrugës Tiranë–Elbasan. Zgjatje e afatit të Kontratave respektive (Kompanisë Kontraktore, Kompanisë Supervizore, Stafit të NjMP). Dhënia nga ana e Kompanisë Kontraktore e zgjidhjeve teknike përfundimtare të qëndrueshme për punimet e ndërtimit në zonën e Mulletit (gërmim) dhe në zonën e Ibës (mbushje), si dhe për fenomenin e rrëshqitjes në Km. 13+150. Të tre këto zona shfaqin probleme gjeoteknike, dhe nga ana e Kompanisë Kontraktore mbahen nën monitorim të vazhdueshëm deri në dhënien e zgjidhjeve. Përgatitja e Raporteve të Vlerësimit nga ana e Kompanisë Kontraktore dhe asaj Supervizore mbi fenomenin të rrëshqitjes të ndodhur pranë fshatit Ibë, në km. 10+950 deri në km. 11+300. Vendimarrje për tharjen e Rezervuarit të fshatit Mushqeta, prania e të cilit rrezikon stabilitetin e rrugës së re, pranë zonës në rrëshqitje km. 14+150. Paraqitja nga ana e Kompanisë Kontraktore e Projektit të detajuar për disa seksione të rrugës, kryesisht në fillim të saj. Përshpejtimi i procesit të shpronësimeve

					shtesë, të ardhura kryesisht nga ndryshimet në Projekt të propozuara nga Kompania Kontraktore. Paraqitja nga ana e Kompanisë Kontraktore i "Urdhërave të Ndryshimit" të mbetur.
Transporti Rrugor	Ndertim Segmenti 3, Aksi "Tirane - Elbasan" (dalje tuneli i Krrabes km 15.20 - Elbasan km 27.00)	958.034	914.912	95%	Punimet e ndërtimit në këtë seksion rrugor kanë përfunduar në datën 8 Gusht 2014 dhe rruga është vënë plotësisht në shërbim të trafikut. Në përputhje me kontratën, Supervizori ka lëshuar Certifikatën e marrjes në dorëzim dhe që nga data 8 Gusht 2014 projekti ka hyrë në Periudhën e Garancisë së Difekteve.
Transporti Rrugor	Supervizion dhe Rishikimi i Projektit te Detajuar Segmenti Nr.1, Aksi "Tirane - Elbasan" (Sauk km 0- Hyrje tuneli I Krrabes km 13)	43.600	64.617	148%	
Transporti Rrugor	Supervizion i Tunelit te Elbasanit	5.000	7.623	152%	
Transporti Rrugor	Supervizion dhe Rishikimi I Projektit te Detajuar Segmenti Nr 3 Aksi "Tirane - Elbasan" (dalje tuneli i Krrabes km 15.20 - Elbasan km 27.00)	15.000	53.005	353%	
Transporti Rrugor	Njesia e Menaxhimit te Projektit "Tirane Elbasan"	10.500	11.470	109%	
Transporti Rrugor	Audit per Segmentin "Tirane - Elbasan"	1.900	2.515	132%	
Transporti Rrugor	Ndertim Nyja e Vorës (Rruget paralele Vore)	86.928	106.433	122%	Kanë përfunduar punimet për ndërtimin e mbikalimit dhe rampave të tij, si dhe rrethrotullimeve në hyrje-dalje në autostradën Tiranë-Durrës, si dhe është montuar


					sinjalistika vertikale dhe horizontale (vijëzim dhe tabela) në pjesën e autostradës. Gjatë këtij muaji është punuar për rehabilitimin e rrugës së vjetër Vorë-Fushë Krujë, me gjatësi rreth 1 km, e cila ka përfunduar, ndërsa në rrugën paralele punimet kanë përfunduar në 95% të gjatësisë. Problem ngelet pjesa lidhëse me gjatësi 150 ml, midis rrethrotullimit të mbikalimit hekurudhor të Vorës dhe rrugëve paralele. Në këtë pjesë nuk ka përfunduar procesi i shpronësimit dhe nuk lejohet kryerja e punimeve nga pronarët e tokës. Ky projekt është marrë në dorëzim paraprak nga ARRSH.
Transporti Rrugor	Ndertim By Passi i Shkozetit	240.600	155.985	65%	Ky projekt është marrë në dorëzim paraprak nga ARRSH. Realizimi fizik 98%
Transporti Rrugor	Ndertim By Passi i Durrësit	666.473	387.002	58%	Punohet sipas grafikut të punimeve, ka dalë VKM për shpronësimet (toka dhe godina banimi) dhe po bëhen pagesa financiare, kanë përfunduar shpronësimet. Projekti drejt përfundimit të punimeve (realizimi fizik 92%).
Transporti Rrugor	Ndertim Segmenti "Qukes - Qafe Plloce"	50.000	0	0%	Është dhënë ok nga Banka Islamike për Zhvillim për tenderimin e punimeve civile, ndërkohë që është në rrugën e zgjidhjes problematike e

					shpronësimeve si kusht për bërjen efektive të marrëveshjes. Lidhur me shpronësimet: Për lotin Qukës-Pogradec-Qafë Ploçë ka dalë VKM nr.657, 8.10.2014, ndërsa për lotin Qukës-Qafë Ploçë po përgatitet VKM-ja. Aktualisht në fazën e tenderimit të punimeve civile për lotin 1 dhe 2. Pritet që kredia të bëhet efektive, duke qenë se nuk ekziston asnjë kusht tjetër i Bankës Islamike pa u plotësuar.
Transporti Rrugor	Ndertimi i segmentit Sarande - Konispol	254.800	0	0%	Eshte kontrate e cila eshte mbyllur (terminated) nga Kontraktori pavarësisht se nuk kishin mbaruar punimet
Transporti Rrugor	Asistence teknike per Acrosse	9.520	0	0%	Projekti parashikohet për t'u përfunduar në fund të muajit Qershor 2015, duke përfshirë pjesën e 4 km të segmentit që parashikohej të përmytej nga ndërtimi i Hidrocentralit të Kalivacit (nga Tetori që ishte parashikimi i mëparshëm).
Transporti Rrugor	Asistence teknike Siguria Rrugore	30.000	0	0%	
Transporti Rrugor	Ndertim rruga e Arbrit	10.000	0	0%	
Transporti Rrugor	Supervizion Fier-Levan	0	33.631		Supervizion Fier-Levan
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Menaxhimi i mbetjeve Urbane të Tiranës (faza e dytë, impianti i pastrimit të ujërave të ndotura)	50.000	0	0%	
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Menaxhimi i mbetjeve Urbane të Tiranës (faza e pare)	0	7.013		
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Projekti i menaxhimit të integruar të	0	0		

Kanalizime	ujrave dhe ekosistemit			
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Kanalizime Korce KFW		6.842	
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Projekti I Kanalizimeve Korça III dhe IV IPA 2010	150.000	102.158	68%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Mbrojtja mjedisore e liqenit të Ohrit, Kanalizimet e Ujrave të Zeza Pogradec (faza III)	700.000	649.301	93%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Mbështetje për Rrjetin Hidrik të Tiranës (AT fin. për NUK , 20.3 + 32.9 mid IT)	65.928	65.930	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Projekti i kanalizimeve të Tiranës së madhe	1.608.163	2.501.011	156%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Furnizimi me ujë dhe sanitetit në Orikum	550.000	289.613	53%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Furnizimi me ujë dhe mbrojtja mjedisore e liqenit të Shkodrës	639.520	639.520	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndërtimi i sistemit të ri të KUZ në zonën turistike Golem, Kavajë. IPA 2007 (Lot 1)	120.773	96.888	80%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Rrjeti KUZ - së për Plazhin (<i>Përroi I Agait- Ura e Dajlanit</i>)dhe linja e dërgimit për në ITUP Durrës. IPA 2007 (Lot 2)	306.229	153.684	50%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Linja e Dërgimit të KUZ - së për qytetet e Lezhës dhe Shëngjinit në I.T.U.P Lezhë. IPA 2007, (Loti 3).	52.220	54.570	104%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndërtimi i sistemit të KUZ dhe impianti i trajtimit të ujrave të zeza në Velipojë, IPA 2007(Lot 4).	56.000	123.885	221%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Ndërtimi I KUZ - së për zonën industriale të qytetit të Shkodrës. IPA 2007, (Loti 5).	10.000	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Mbështetje teknike për sektorin e Ujësjetës- Kanalizime	100.000	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Projekti i Ujësjetës të Bilishtit	0	0	#DIV/0!

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Projekti i administrimit dhe menaxhimit të tokës, komponenti D. Ndërhyrje emergjente në zonën Shkodër Lezhë	195.339	195.339	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Impianti I trajtimit të ujrave të ndotura faza II Kavajë, ndërtimi i sistemit të kanalizimeve për zonën e Golemit. IPA 2009 Kanalizime të ujrave të ndotura në Lezhë dhe Shëngjin. IPA 2009. Ndërtimi irrijetit të kanalizimeve sekondar dhe tercial në Vlorë. IPA 2009. Kanalizime të ujrave të ndotura dhe impiant trajtimi i ujrave të zeza Ksamil, IPA 2009.	510.000	508.241	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Përfundimi i sistemit të KUZ në zonën e Velipojës IPA 2010	60.000	59.999	100%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Programi I infrastrukturës komunale I për qytetet Fier, Gjirokaster, Sarandë, dhe Lezhë	900.000	419.216	47%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Programi I infrastrukturës komunale II për qytetet Kamez, Lushnje, Berat, Kucove, Fier dhe Sarandë.	903.633	109.167	12%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Projekti i ri I furnizimit me uje për qytetin Durrës	700.000	861.875	123%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Furnizimi me ujë Peshkopi	240.000	114.744	48%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Perfundimi I sistemit te KUZ dhe ITUP në zonën e Velipojës Faza e III - të IPA 2011	200.000	392.758	196%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Perfundimi I sistemit te KUZ dhe ITUP në Vlorë, IPA 2012	200.000	0	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	Kanalizimet e ujrave të perdorura në qytetin e Bilishtit	40.000	0	0%
TOTAL		16.168.002	12.835.320	79,4%

Paraqitja grafike si më poshtë :

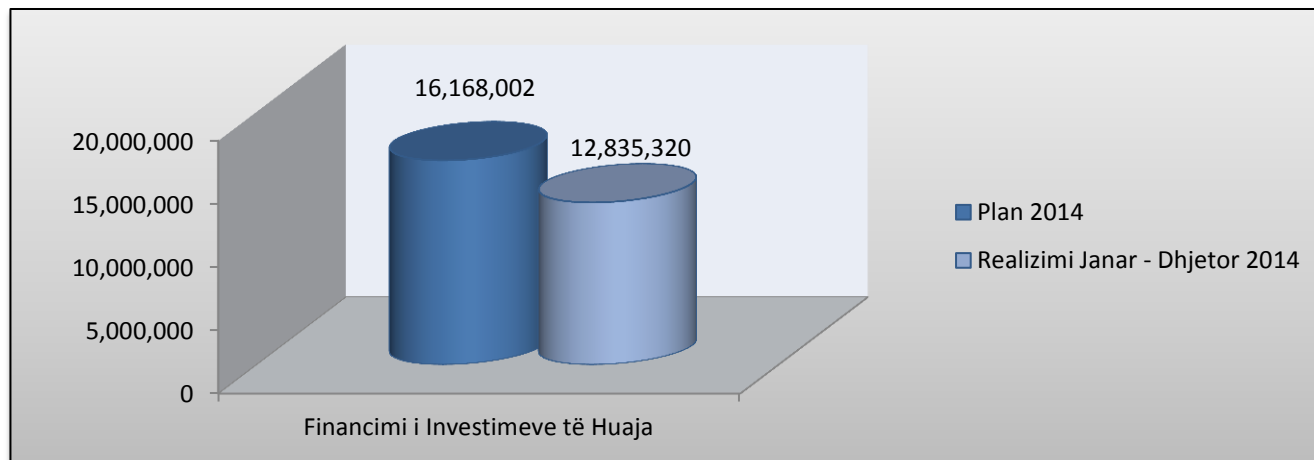

Institucionet Buxhetore

Me poshtë realizimi faktik i Institucioneve Buxhetore per shpenzimet kapitale me financim te huaj dhe te brendshëm për periudhën Janar – Dhjetor 2014 :

Insitucioni	Shpenzime Kapitale		
	Plani 000/lekë	Fakt 000/lekë	% e Realizimit
Presidenca	5.000	4.382	88%
Kuvendi	48.393	276	1%
Kryeministria	60.000	-	0%
Shërbimi Informativ Shtetëror	45.555	40.227	88%
Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave	4.567	2.213	48%
Akademia e Shkencës	11.000	416	4%
Kontrolli i Lartë i Shtetit	50.000	8.235	16%
Prokuroria e Përgjithshme	148.000	142.512	96%
Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor	152.212	149.087	98%
Gjykata Kushtetuese	3.287	3.287	100%
Agjencia Telegrafike Shqiptare	2.500	-	0%
Instituti I Statistikes*	77.000	77.000	100%
Shkolla e Magjistraturës	1.000	980	98%
Fondi Shqiptar i Zhvillimit	10.084.266	10.016.650	99%
Qendra Kombëtare e Kinematografisë	2.000	458	23%
Këshilli i Lartë i Drejtësisë	2.000	1.897	95%
Avokati i Popullit	40.400	20.541	51%
Komisioni i Shërbimit Civil	1.500	44	3%
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve	3.000	448	15%
Inspektoriat i Lartë i Kontrollit të Deklarimit të Pasurive	10.200	10.000	98%
Autoriteti I Konkurrences	1.000	953	95%
Institucione të tjera Qeveritare	492.272	31.966	6%
Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile	746	746	100%
Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale	1.000	997	100%
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi	1.000	870	87%

Institui i Studimeve të Krimeve të Komunizmit	1.000	59	6%
TOTAL	11.248.898	10.514.244	93%

Paraqitja grafike si më poshtë :

